# 佐布里池耐震補強工事 定期報告

令和2年3月

独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所

## 佐布里池耐震補強工事について

### 【工事概要】

1. 工 事 名 佐布里池堤体耐震補強工事

2. 工事場所 愛知県知多市佐布里字広茂地内外

3. 工 期 自:平成30年12月28日

至:令和 3年 3月25日(819日間)

4. 工事内容 本工事は、佐布里池堤体に係る耐震補強工事を実施するものです。

南海トラフ地震等の大規模地震を対象とした耐震診断の結果、貯水機能は維持されますが、液状化による堤体の沈下や変形が生じる可能性が示唆されたことから、これを抑制するため、堤体上流側(貯水池側)に約7万㎡の補強盛土(押さえ盛土)を実施します。

神田盆工(神でん盆工)を美心しより。

1)掘削工 1式 2)基礎工 1式 3)補強盛立工 1式

4) 天端工 1式 5) 仮設工 1式

5. 発注者 独立行政法人 水資源機構 愛知用水総合管理所

6. 施工者 鹿島建設株式会社 中部支店

※ 佐布里池は、愛知県企業庁が昭和40年に建設した工業用水専用の調整池であり、耐震補強 工事は水資源機構が愛知県企業庁より受託して実施します。

#### 【耐震化工法概要】


#### ①補強盛土


耐震補強は、堤体貯水池側に砕石にて押さえ盛土を行う。


これにより堤体の沈下量を修復容易な範囲に留める。

#### ②地盤改良

補強盛土下面にある、基礎地盤の強度増加を図るため、地盤改良を行う。





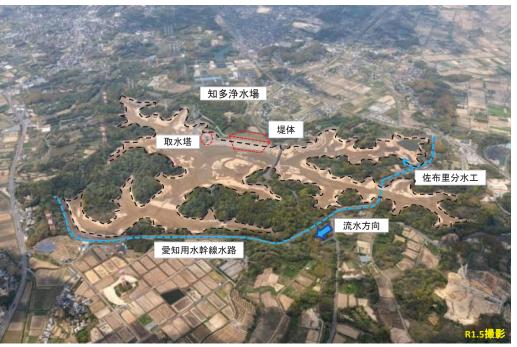

#### ●工程表

工種·種別等	単位	하므	201	8年	2019年													2020年										2021年			
		双里	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備工事	式	1			準備工(仮囲い他)				l	ボーリン	ボーリング調査																	ĺ	片	1	
工事用道路 (教務地盤対策含む)	式	1					•		工事用道路(仮締切)		77堤)造成	ž .														工事用	道路撤去				
						$\vdash$					_			1			$\vdash$				$\vdash$				<u> </u>						L
ストックヤード	式	1								_	7	トックヤー	- ド造成	⊢	l	ļ		ļ			埋戻しお	材搬出									
														砕石搬力																	
				_				_	_	$\vdash$	_	_	H.	性主受入		<u></u>		梅ま	) (10		-			_							⊢
発生土受入地	式	1											,	ETITA	E299'3	2.															
				+	-	+				排水	· 濁水設i	1000			$\vdash$	H	-	$\vdash$			Н	$\vdash$	$\vdash$	Н	-		濁水処理	<b>哈德樂夫</b>			$\vdash$
排水・濁水設備	式	1								IN O	- AND THE R		····	·····		····									····	····	APTODE				
		1											堤体基础	計照例(35,500m3)他								+	$\top$			T					$\vdash$
掘削工 基礎工	式											-				ンボドレー	l シ														
圣妮工																	1														
補強盛立工		1															堤体盛立	ž													
	式																	梅ま	)IJ						IJ	ップラップ	I				
天蝎工	式	1																									堰	頂部整備			
								l	l		1			1							l			l							

※ 今年度、堤体の耐震補強と併せて、取水塔の耐震補強工事に着手する予定(別途工事)
※ 耐震補強工事期間中は、佐布里池を落水して施工することから、佐布里池の貯水量を勘案しない運用となります。

る 間波 世界上 学 初 目 一は、 監視等の 強化を 図り、 幹線水路の 状況により 東郷調整 池からの 放流量を 適時操作変更する等、 利水に影響のないよう、 配水運用をしていきます。

①工事名:佐布里池堤体耐震補強工事

1) 工事場所:愛知県知多市佐布里字広茂地内外

2) 工 期:自:平成30(2018)年12月28日 ~ 至:令和03(2021)年3月25日(819日間)


3) 工事概要:(1) 掘削工 1 式 (2) 基礎工 1 式 (3) 補強盛立工1 式

(4)天端工 1 式 (5)仮設工 1 式

4) 受注金額: 952,560,000円


5) 受 注 者: 鹿島建設株式会社 中部支店

●工程表 (令和2年2月末現在)

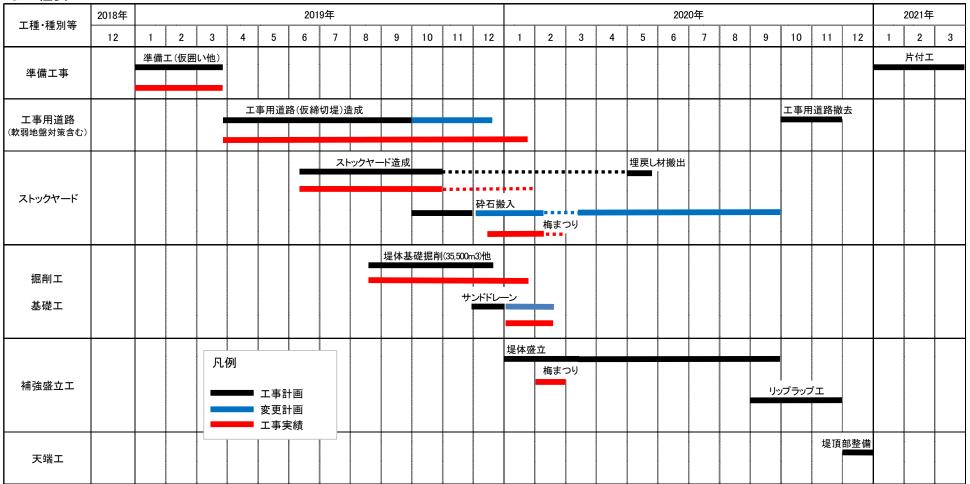

# 佐布里池堤体耐震補強工事 平面図

令和2年2月25日時点撮影

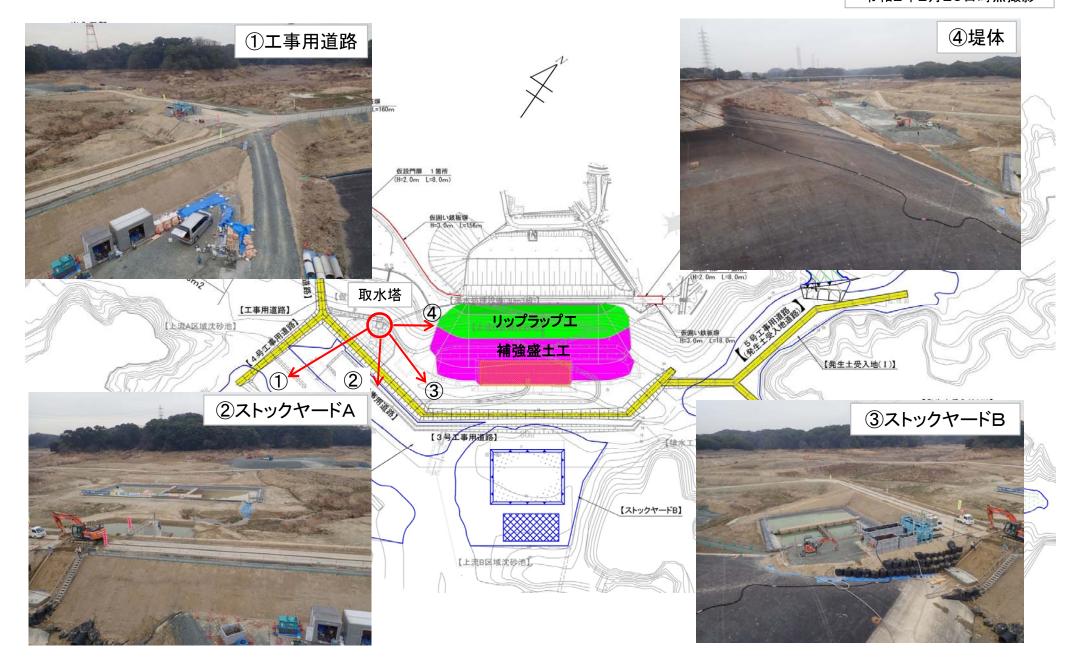

## 基礎工(サンドドレーン)



サンドドレーン施工状況



サンドドレーン施工状況



サンドドレーン施工状況

## 補強盛立



砕石敷ならし状況



砕石締固め状況



砕石締固め状況

