

# 思川開発事業監理協議会資料

平成29年11月8日

独立行政法人 水資源機構

# 1. 事業進捗状況(平成29年10月末時点)

○ 平成29年度予算額 25.4億円(累計 約912億円※ 進捗率約49%)

累計額は、平成27年度までは精算額、平成28年度は予算額。

補償基準他	H13.12 損失補償基準妥結・協定書調印				
用地取得(南摩ダム) (372ha)	99%(371ha)				
用地取得(導水路) (3.159ha) 区分地上権設定含む	100%(3.159ha)				
家屋移転(80世帯)	100%(80世帯)				
代替地造成	100%(31世帯)				
県道改良(約13.2km)	99%(13.1km)				100% (13.2km)
付替県道(約6.4km)	67%(4.3km)			72%(4.6km)	
付替林道(約24.4km)	7%(1.6km)				
ダム本体及び関連工事	仮排水路トンネル (H23.3完成)	基礎掘削	ダム本体工	管理設備	試験湛水
導水路、送水路 及び関連工事	黒川取水・放流工 大芦川取水・放流工	黒川導水路 大芦川導水路	南摩注水工	送水路	南摩機場

完成
契約
----
完成
契約
----
 付替県道

完成
契約
----
 県道改良

完成：工事が完成した道路延長比（未供用を含む。舗装、付帯設備の未施工を含む）  
 契約：工事を契約した道路延長比

## 2. 工事实施状況

④ 付替県道5号橋工事（施工中）



③ 付替県道6号橋工事（H23.10竣工）




②付替県道4号トンネル工事（H28.3竣工）



①付替県道7号橋工事（H25.8竣工）




⑤付替県道2号トンネル工事（施工中）

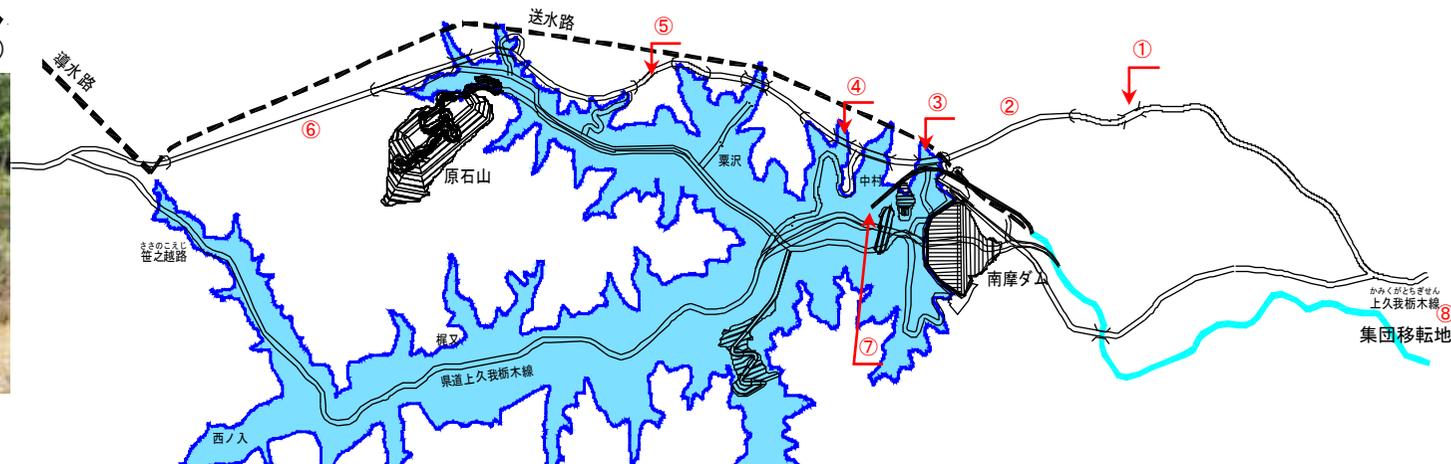

⑥付替県道1号トンネル工事（H24.8竣工）




⑦仮排水・放流管敷設トンネル呑口（上流側坑口）（H23.3 竣工）

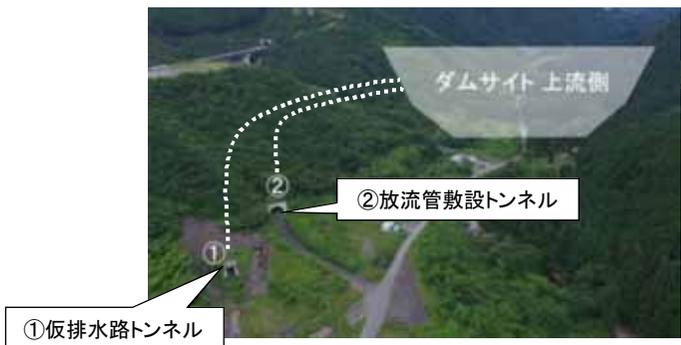

⑧ 集団移転地




### 3. ダム本体の実施状況

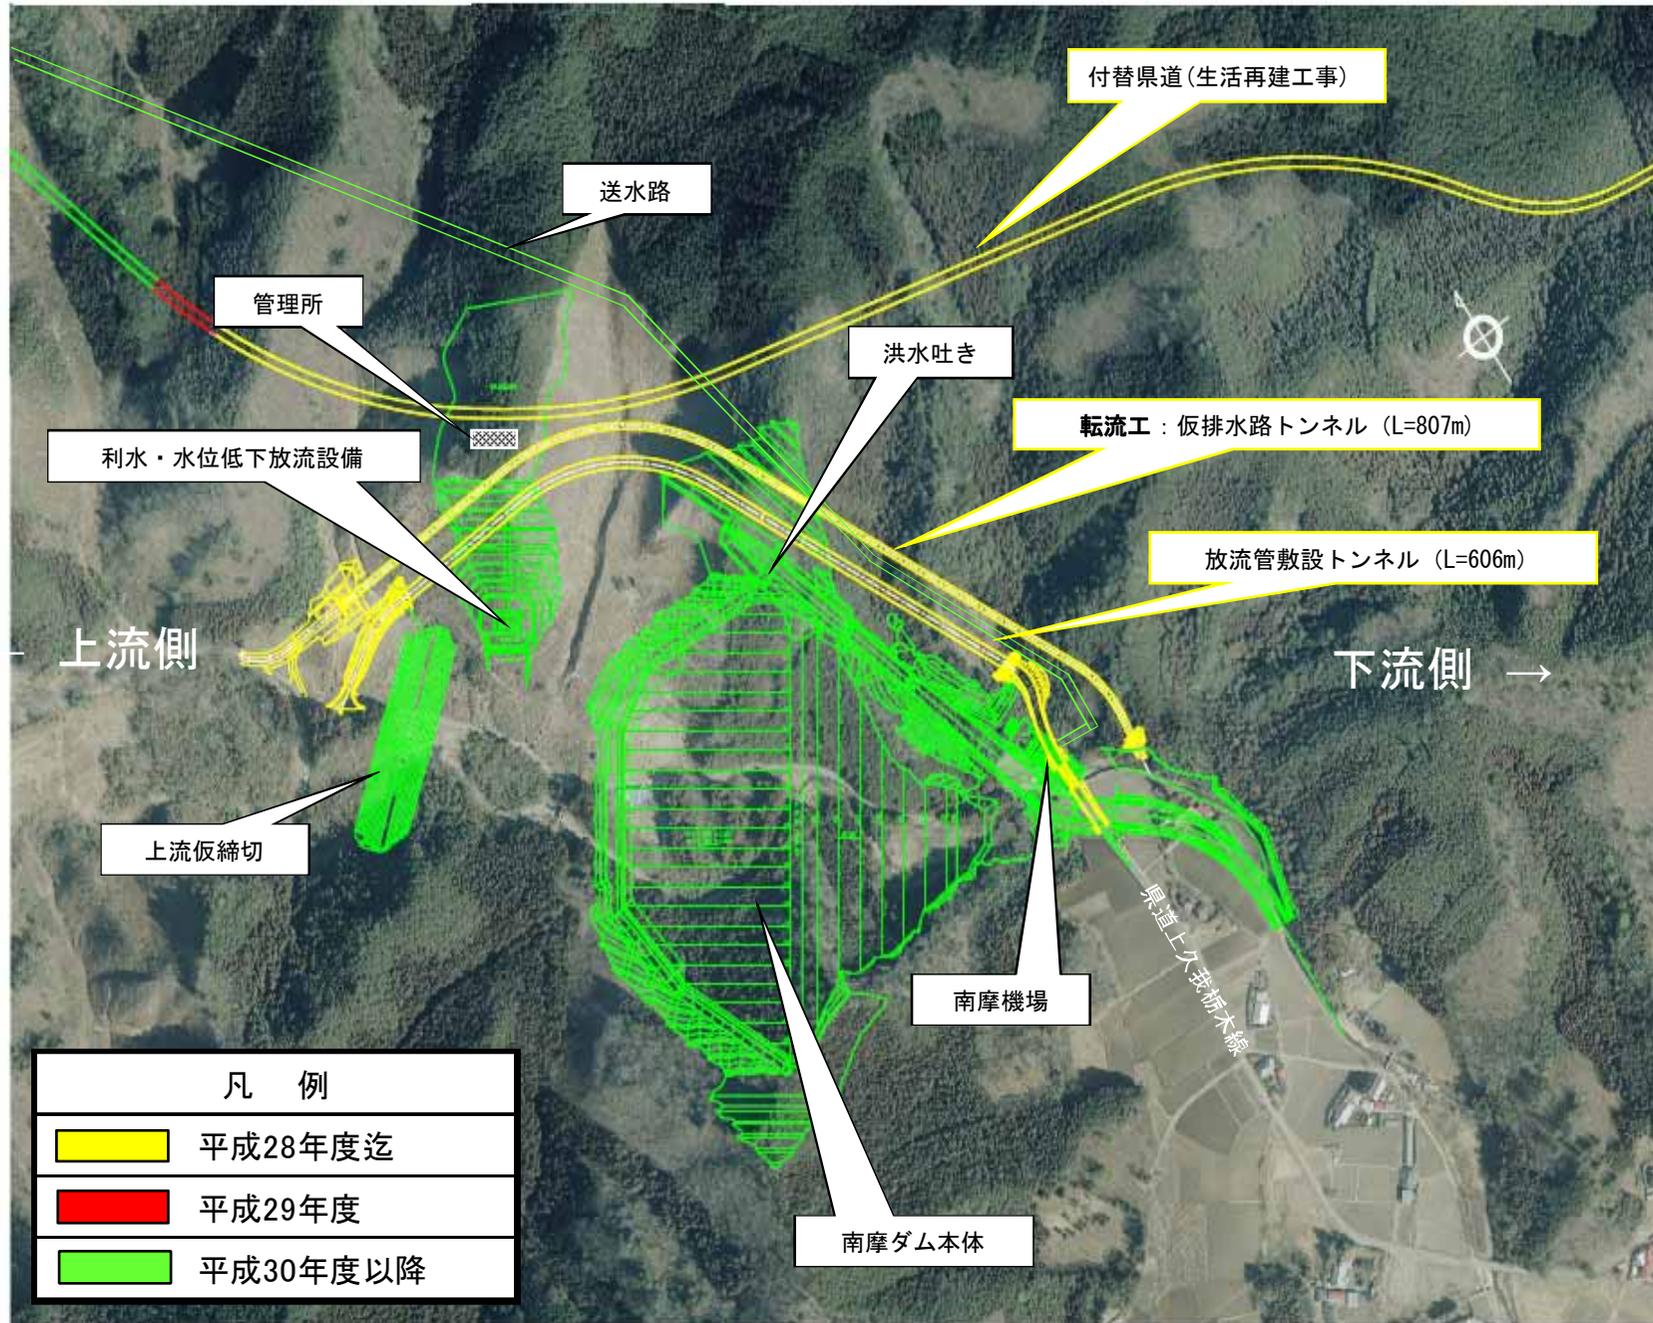

# 4. H29年度工事実施状況図

## 平成29年度 思川開発事業 工事実施状況図

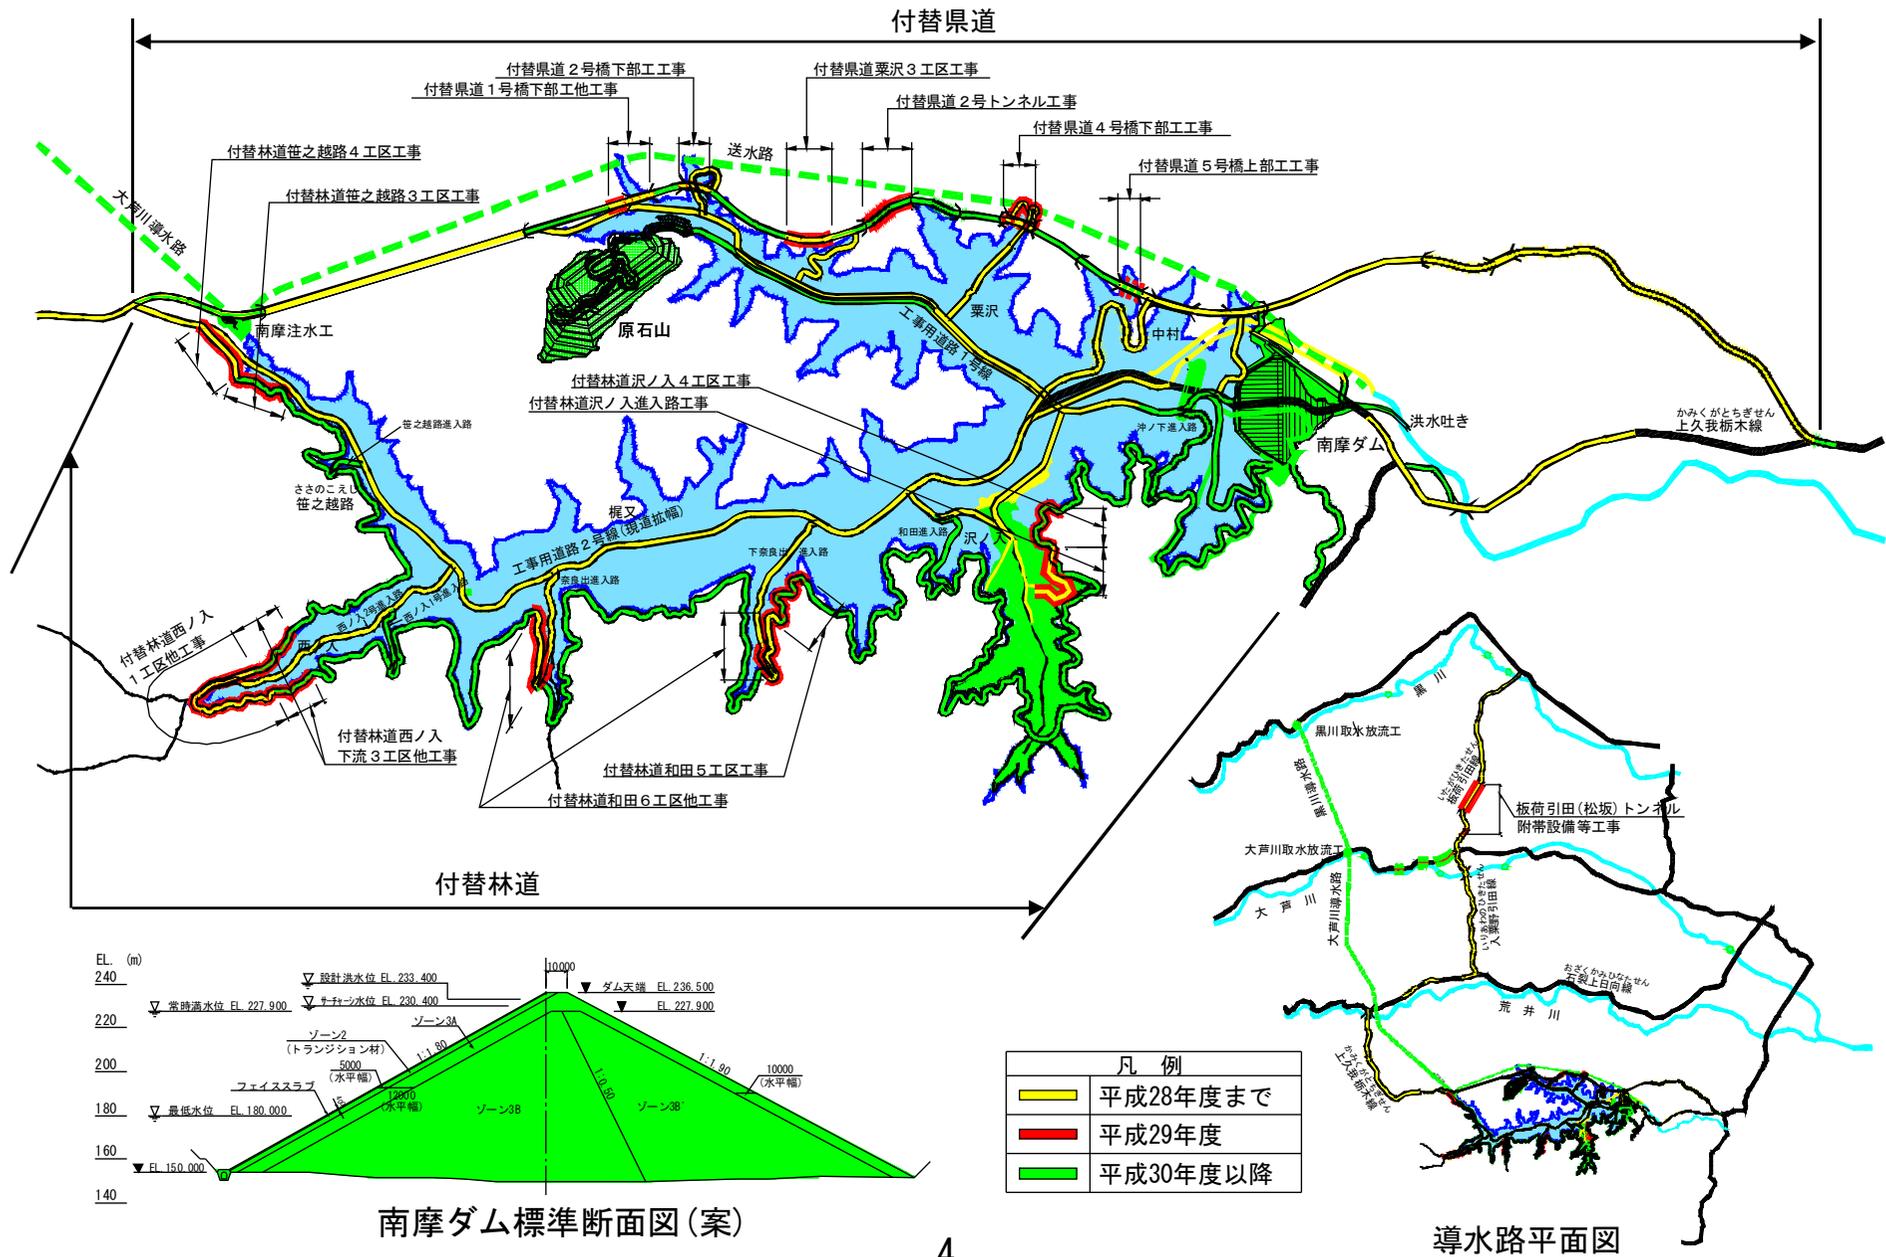

## ＜平成29年度実施概要＞

項目	主な内容
工 事	板荷引田(松坂)トンネル付帯設備等工事(栃木県委託)
	付替県道工事 5号橋上部工工事、2号トンネル工事、粟沢7工区その2工事 等
	付替林道工事 和田6工区他工事、西ノ入1工区他工事、笹之越路4工区他工事 等
業務等	地質調査、水理水文調査、環境調査、用地補償 等

### (1) 工 事

#### 1) 板荷引田(松坂)トンネル付帯設備等工事 (栃木県委託)




完成(板荷側)  
(平成29年11月1日)



完成(引田側)  
(平成29年11月1日)

## 2) 付替県道工事

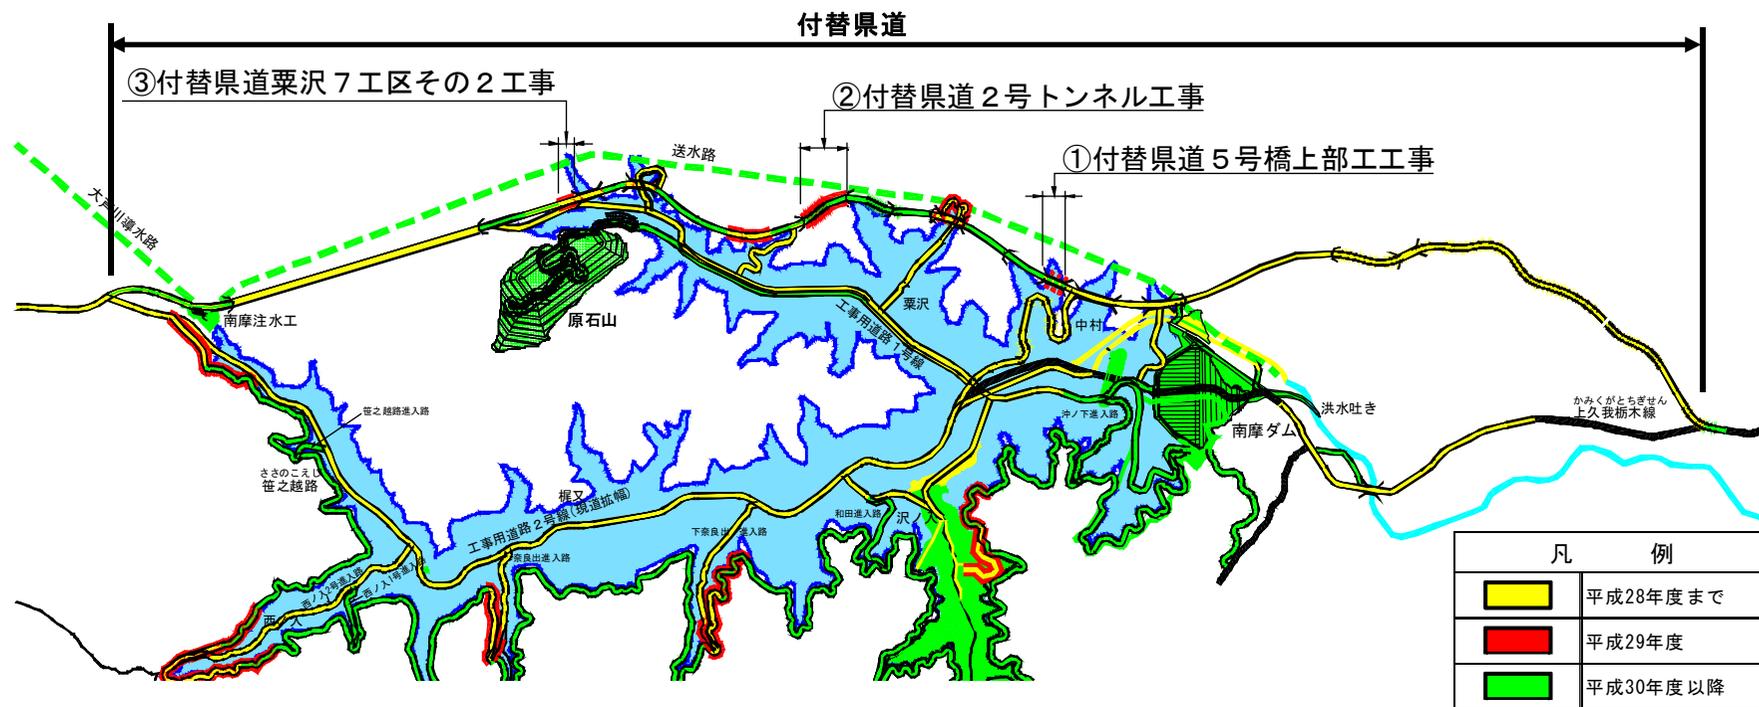

③「付替粟沢7工区その2工事」



概成状況  
(平成29年11月1日)

②「付替県道2号トンネル工事」




トンネル坑内 施工中  
(平成29年11月1日)

①「付替県道5号橋上部工工事」



橋梁付属物 施工中  
(平成29年11月1日)

### 3) 付替林道工事

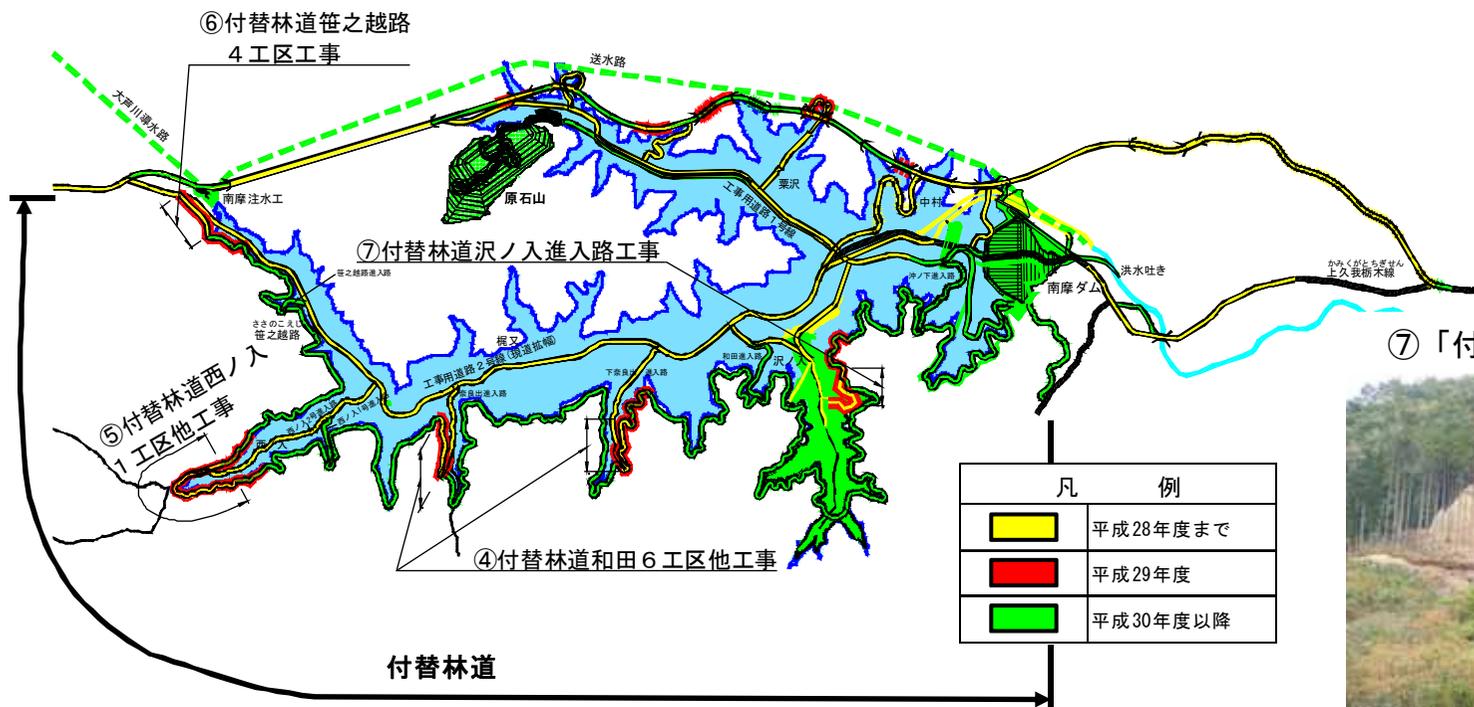

⑦「付替林道沢ノ入進入路工事」



道路土工及び法面工 施工中  
(平成29年11月1日)

⑥「付替林道笹之越路 4工区工事」



道路土工及び法面工 施工中  
(平成29年11月1日)

⑤「付替林道西ノ入 1工区他工事」



道路土工及び法面工 施工中  
(平成29年11月1日)

④「付替林道和田6工区他工事」



道路土工・擁壁工 施工中  
(平成29年11月1日)

## (2) 業務等



貯水池周辺試錘調査  
(地質ボーリング状況)



流量観測  
(河川流量観測状況)



貯水池周辺試錘調査  
(地質ボーリング状況)



自然環境調査  
(希少猛禽類調査状況)
