
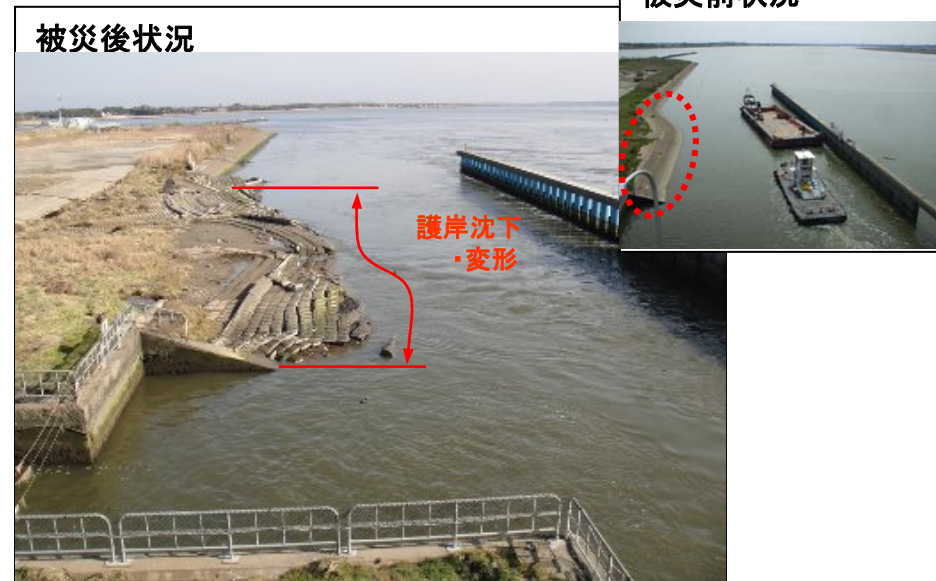


# 東日本大震災 利根川河口堰管理所 応急工事実施状況(速報)

被害箇所:① 河口堰下流左岸護岸  
地名;茨城県神栖市太田地先

平成23年5月16日現在

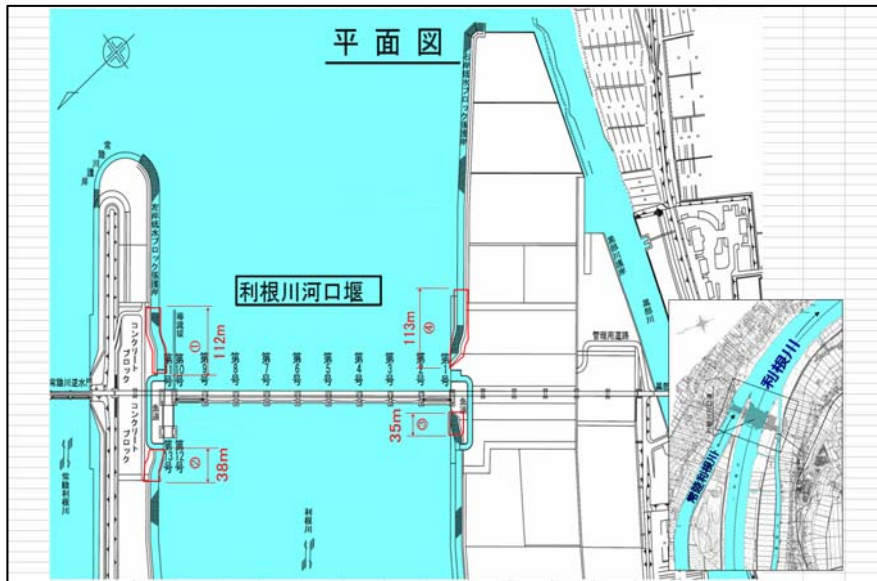

- ・被災状況;低水ブロック護岸崩壊(L=112m)
- ・復旧工法;  
吸い出し防止材、袋詰石による洗掘防止対策工
- ・着手日;4月6日
- ・工事期間;5月30日頃完了予定
- ・現在の状況;  
進入路造成及び整地作業、製作ヤード造成(5/10~5/12)  
袋詰玉石製作(5/11~5/12)




# 東日本大震災 利根川河口堰管理所 応急工事実施状況(速報)

被害箇所;② 河口堰上流左岸護岸

平成23年5月16日現在

地名;茨城県神栖市太田地先

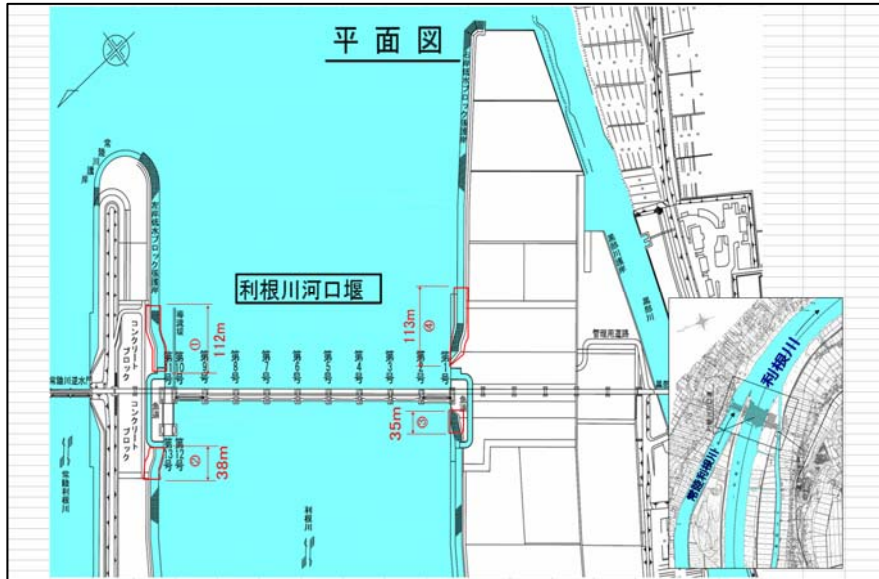

- ・被災状況;低水ブロック護岸崩壊(L=38m)
- ・復旧工法;  
吸い出し防止材、袋詰石による洗掘防止対策工
- ・着手日;4月6日
- ・工事期間;5月30日頃完了予定
- ・現在の状況;  
進入路造成及び整地作業、製作ヤード造成(5/10~5/12)  
袋詰玉石工製作(5/11~5/12)

被災前状況



被災後状況



応急工事状況(5/16現在)




# 東日本大震災 利根川河口堰管理所 応急工事実施状況(速報)


被害箇所;③ 河口堰上流右岸護岸

平成23年5月16日現在

地名;茨城県香取郡東庄町新宿地先

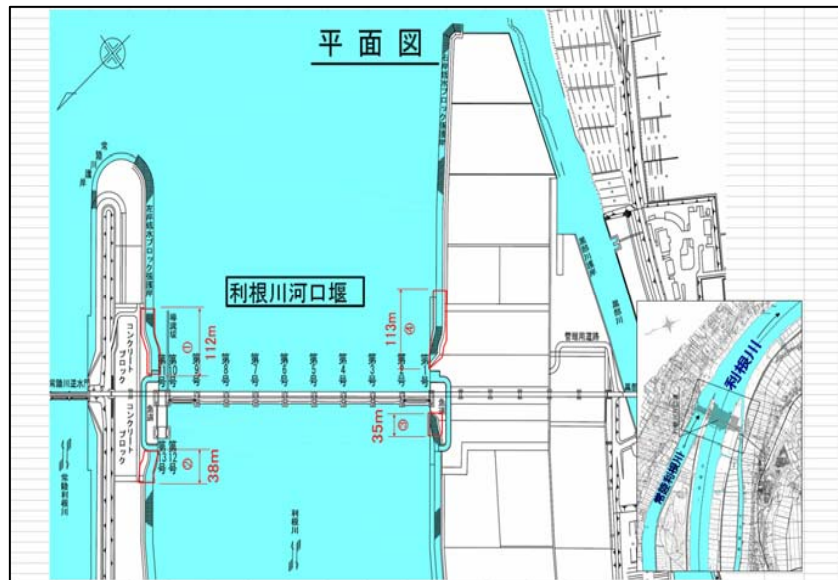

- ・被災状況;低水ブロック護岸崩壊(L=35m)
- ・復旧工法;  
吸い出し防止材、袋詰石による洗掘防止対策工
- ・着手日;4月6日
- ・工事期間;5月30日頃完了予定
- ・現在の状況;  
袋詰玉石工製作(5/11~5/12)  
作業台船のえい航、台船作業準備(5/13)  
袋詰玉石運搬(作業台船への積み込み)(5/14)  
袋詰玉石据付(右岸上・下流)(5/16)

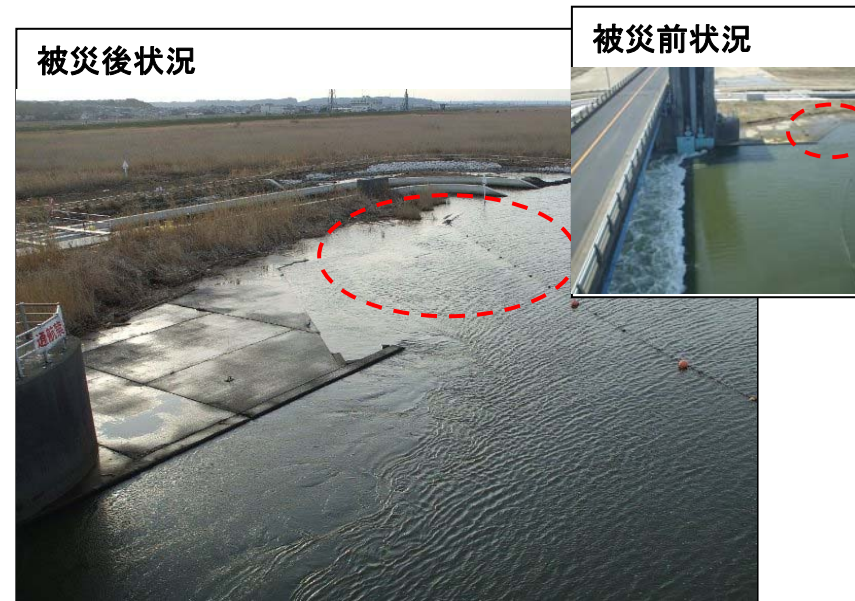

# 東日本大震災 利根川河口堰管理所 応急工事実施状況(速報)

被害箇所;④ 河口堰下流右岸護岸

平成23年5月16日現在

地名;茨城県香取郡東庄町新宿地先



- ・被災状況;低水ブロック護岸崩壊(L=113m)
- ・復旧工法;  
吸い出し防止材、袋詰石による洗掘防止対策工
- ・着手日;4月6日
- ・工事期間;5月30日頃完了予定
- ・現在の状況;  
袋詰玉石工製作(5/11~5/12)  
作業台船のえい航、台船作業準備(5/13)  
袋詰玉石運搬(作業台船への積み込み)(5/14)  
袋詰玉石据付(右岸上・下流)(5/16)

