

佐布里池耐震補強工事

定期報告

令和元年10月

独立行政法人水資源機構
愛知用水総合管理所

①工事名:佐布里池堤体耐震補強工事

1) 工事場所:愛知県知多市佐布里字広茂地内外

2) 工期:自:平成30(2018)年12月28日 ~ 至:令和03(2021)年3月25日(819日間)

3) 工事概要:(1)掘削工 1式 (2)基礎工 1式 (3)補強盛立工 1式
(4)天端工 1式 (5)仮設工 1式

4) 受注金額:952,560,000円

5) 受注者:鹿島建設株式会社 中部支店

●工程表

(令和元年9月末現在)

工種・種別等	2018年	2019年												2020年												2021年											
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
準備工事		準備工(仮囲い他)																												片付工							
工事中道路 (軟弱地盤対策含む)					工事中道路(仮締切堤)造成																														工事中道路撤去		
ストックヤード					ストックヤード造成												埋戻し材搬出																				
					砕石搬入												梅まつり																				
掘削工 基礎工					堤体基礎掘削(35,500m ³)他												サンドドレーン																				
補強盛立工					堤体盛立												梅まつり												リップラップ工								
天端工																													堤頂部整備								


凡例

———— 工事計画

———— 工事実績

佐布里池堤体耐震補強工事 平面図

令和元年9月30日時点撮影



沈砂池(造成)



現況



掘削状況



沈砂池完成

2号工事用道路(造成)




盛土材積込状況



盛土材敷ならし状況



盛土材転圧状況

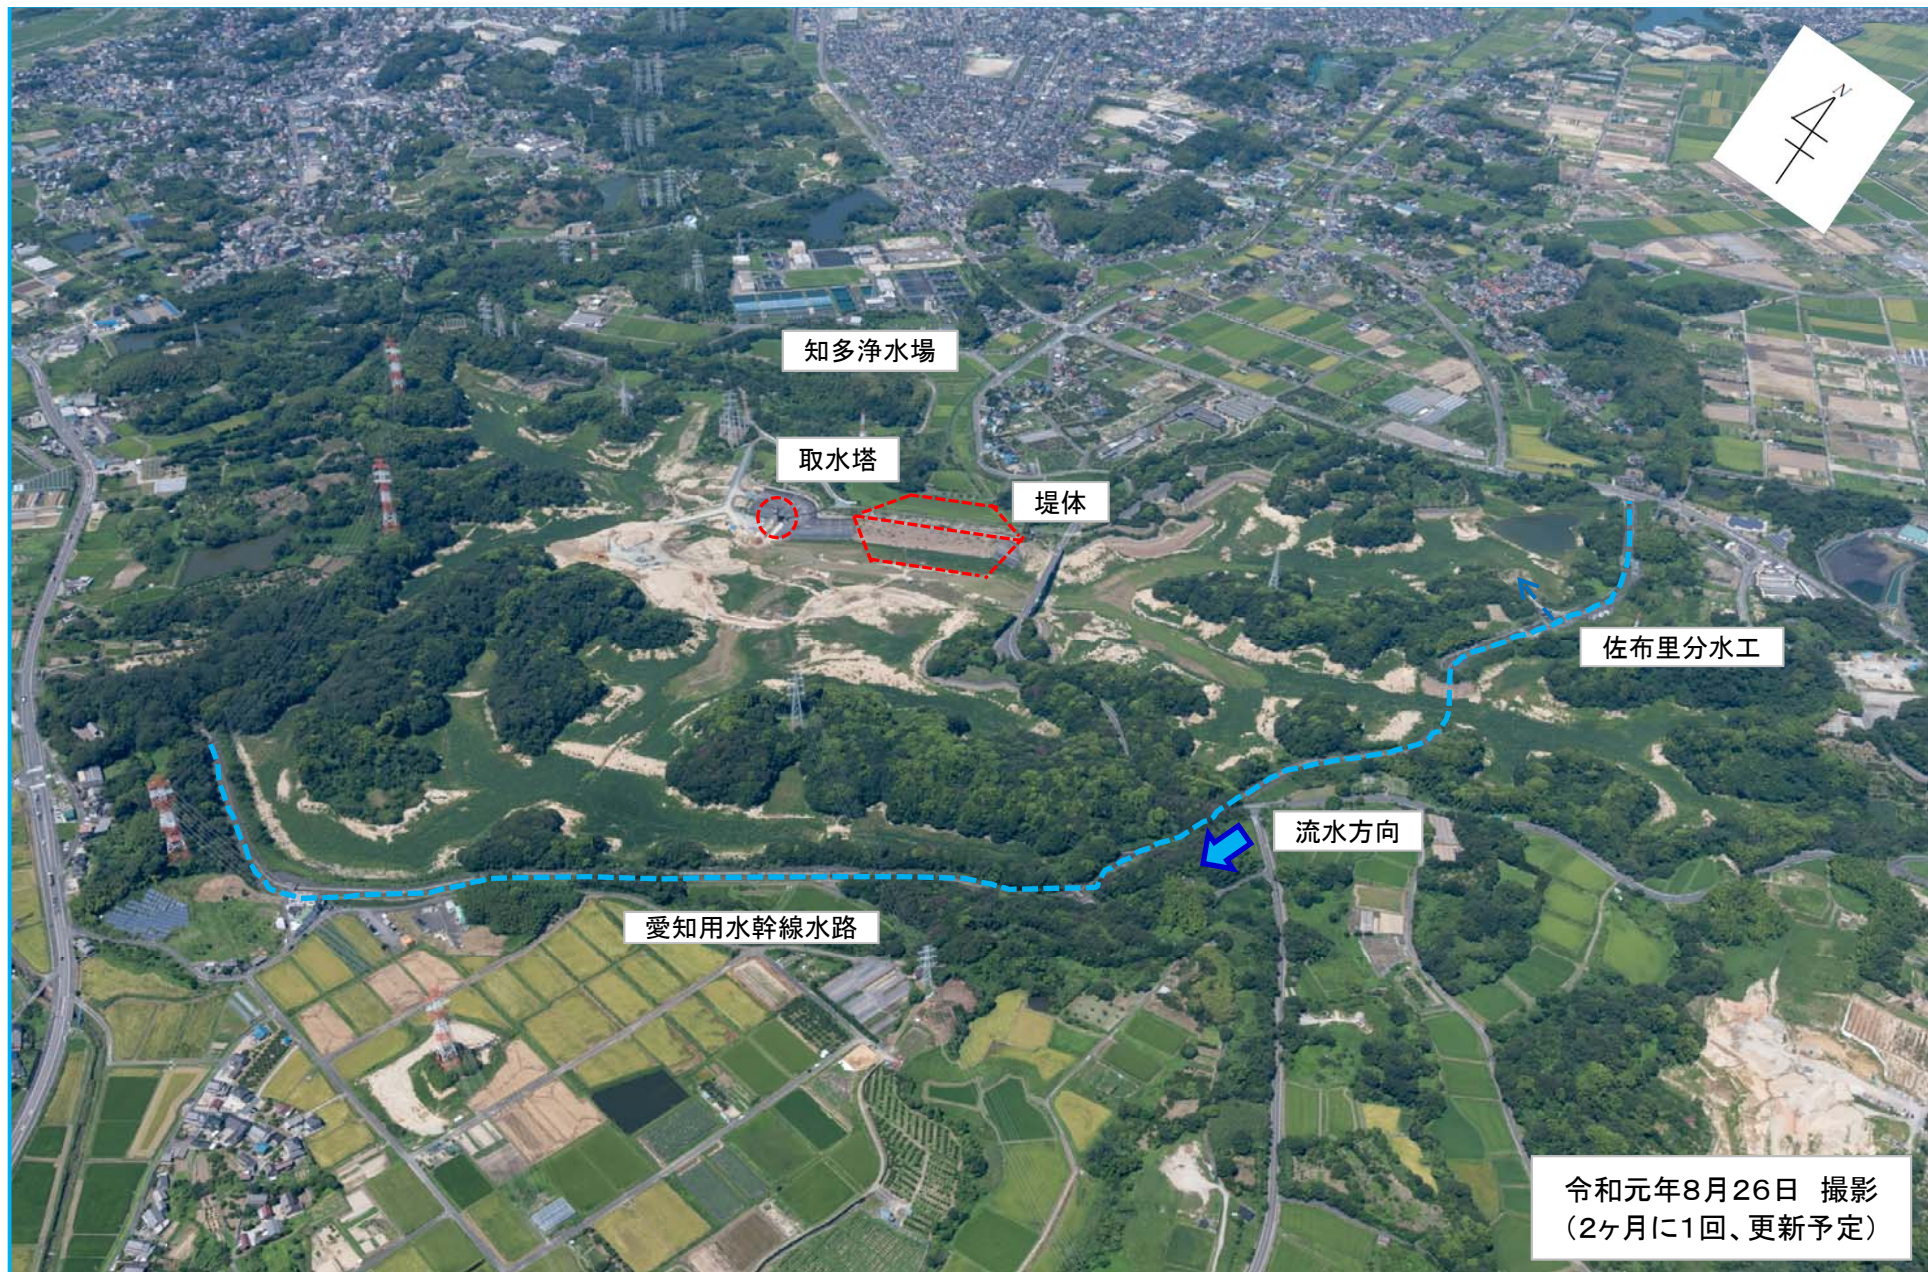

知多浄水場

取水塔

堤体

佐布里分水工

流水方向

愛知用水幹線水路

令和元年8月26日 撮影
(2ヶ月に1回、更新予定)
