

佐布里池耐震補強工事

定期報告

令和2年2月

独立行政法人水資源機構
愛知用水総合管理所

①工事名:佐布里池堤体耐震補強工事

1) 工事場所:愛知県知多市佐布里字広茂地内外

2) 工期:自:平成30(2018)年12月28日 ~ 至:令和03(2021)年3月25日(819日間)


3) 工事概要:(1)掘削工 1式 (2)基礎工 1式 (3)補強盛立工 1式
(4)天端工 1式 (5)仮設工 1式

4) 受注金額:952,560,000円

5) 受注者:鹿島建設株式会社 中部支店




●工程表

(令和2年1月末現在)

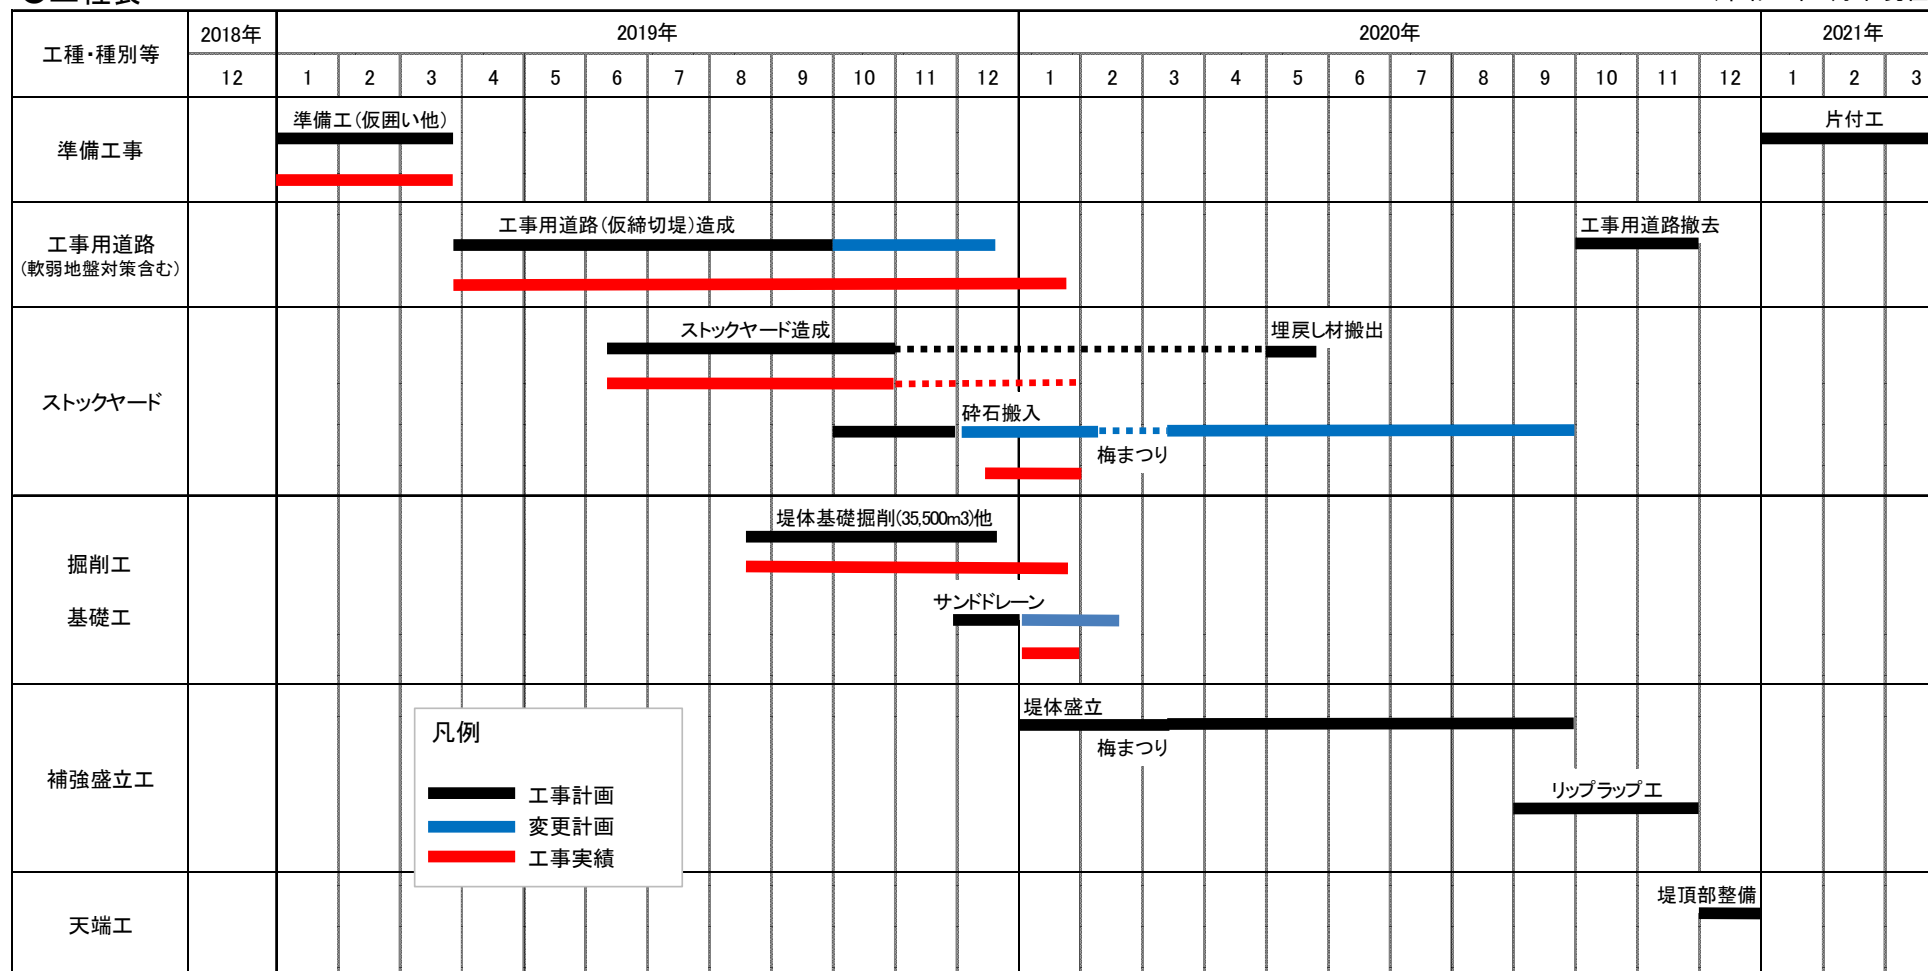

佐布里池堤体耐震補強工事 平面図

令和2年1月27日時点撮影

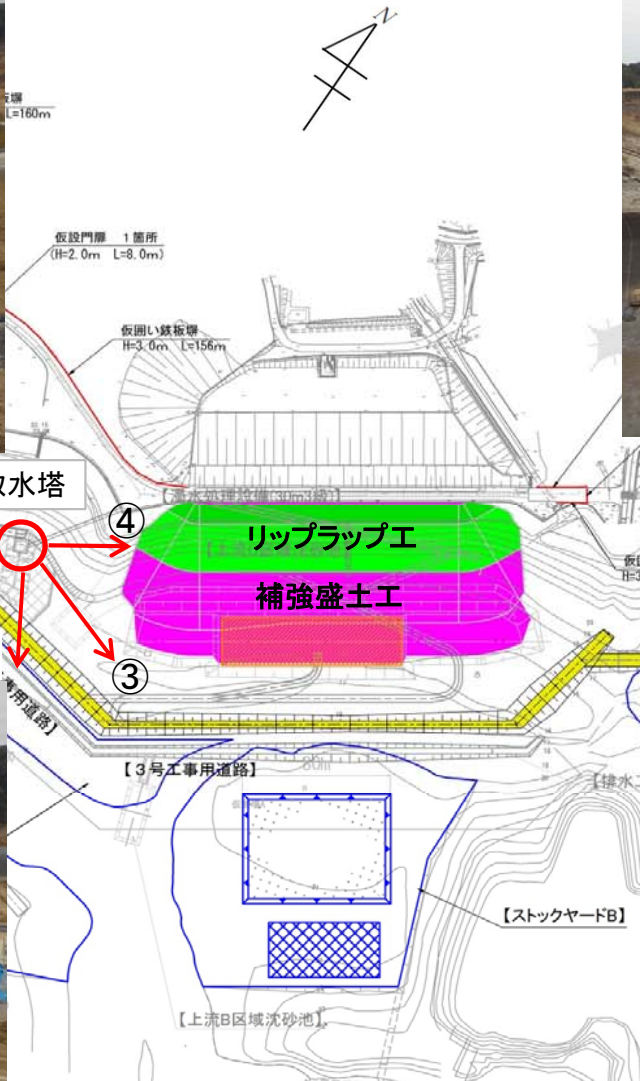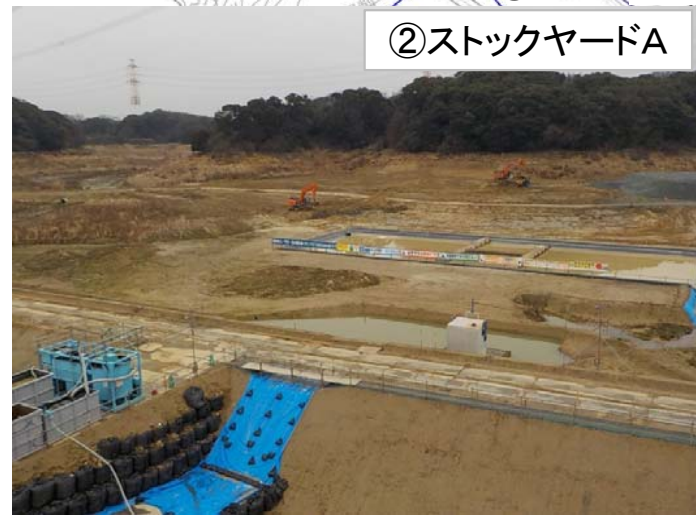

基礎工(サンドドレーン)



サンドドレーン施工状況



サンドドレーン施工状況



サンドドレーン施工状況

砕石搬入(ストック)



砕石ストック状況



砕石搬入状況



砕石搬入状況



知多浄水場

取水塔

堤体

佐布里分水工

流水方向

愛知用水幹線水路

令和元年12月20日 撮影
(2ヶ月に1回、更新予定)
