

佐布里池耐震補強工事

定期報告

令和2年7月

独立行政法人水資源機構
愛知用水総合管理所

①工事名：佐布里池堤体耐震補強工事

1) 工事場所：愛知県知多市佐布里字広茂地内外

2) 工期：自：平成30(2018)年12月28日 ～ 至：令和03(2021)年 3月25日(819日間)

3) 工事概要：(1)掘削工 1式 (2)基礎工 1式 (3)補強盛立工 1式
 (4)天端工 1式 (5)仮設工 1式

4) 受注金額：1,101,060,000円

5) 受注者：鹿島建設株式会社 中部支店

●工程表

(令和2年6月末現在)

工種・種別等	2018年	2019年												2020年												2021年				
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
準備工事		準備工(仮囲い他)																								片付工				
工事用道路 (軟弱地盤対策含む)					工事用道路(仮締切堤)造成																							工事用道路撤去		
ストックヤード					ストックヤード造成				埋戻し材搬出				砕石搬入				梅まつり													
掘削工 基礎工					堤体基礎掘削(35,500m ³)他				サンドドレーン																					
補強盛立工					堤体盛立												梅まつり				リップラップ工									
天端工																										堤頂部整備				

凡例


- 工事計画
- 変更計画
- 工事実績

佐布里池堤体耐震補強工事 平面図

令和2年6月29日時点撮影



補強盛立工（盛立状況）

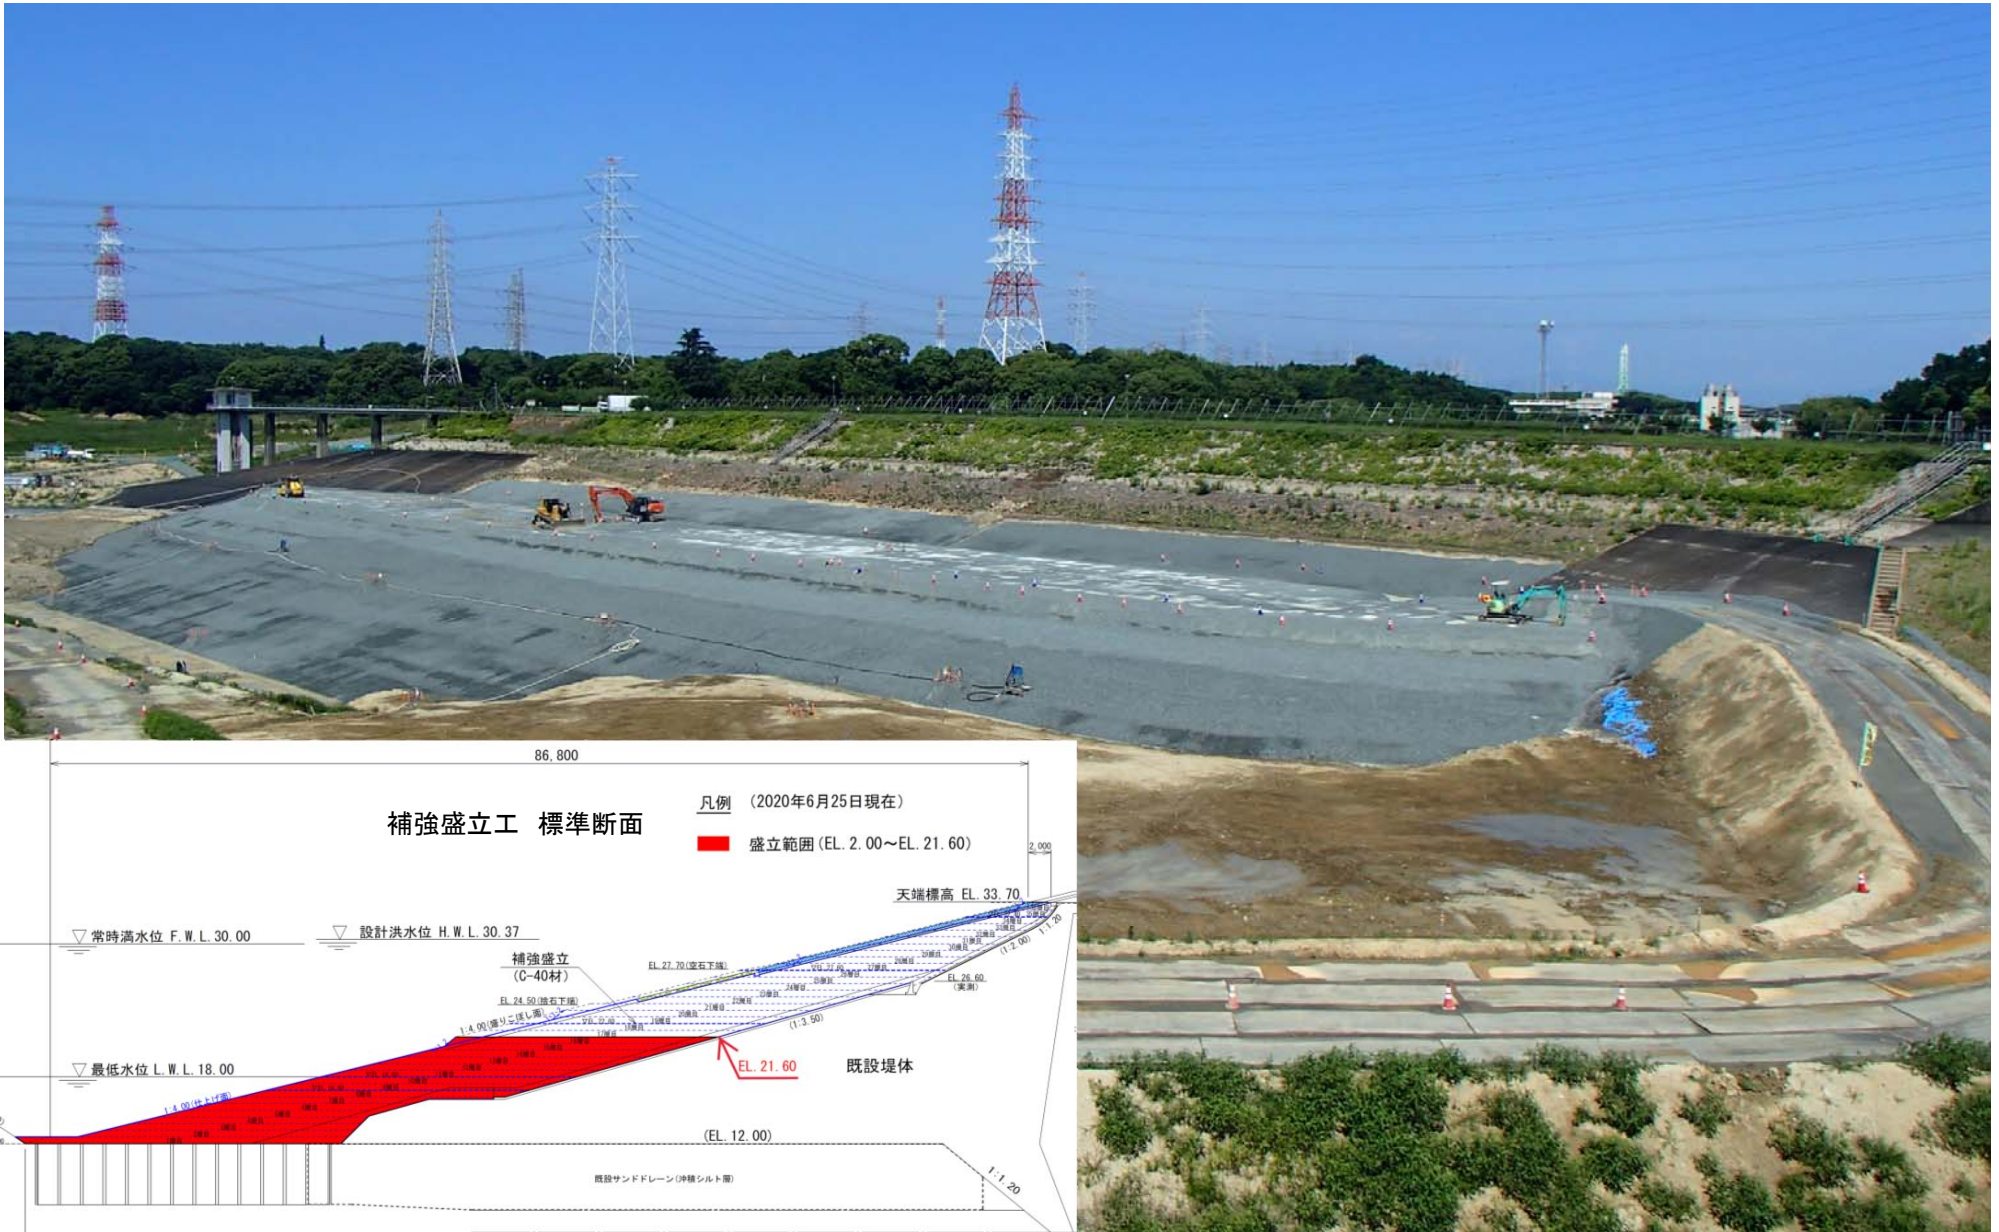



知多浄水場

取水塔

堤体

佐布里分水工

愛知用水幹線水路

流水方向

令和2年6月20日 撮影
(2ヶ月に1回、更新予定)
