
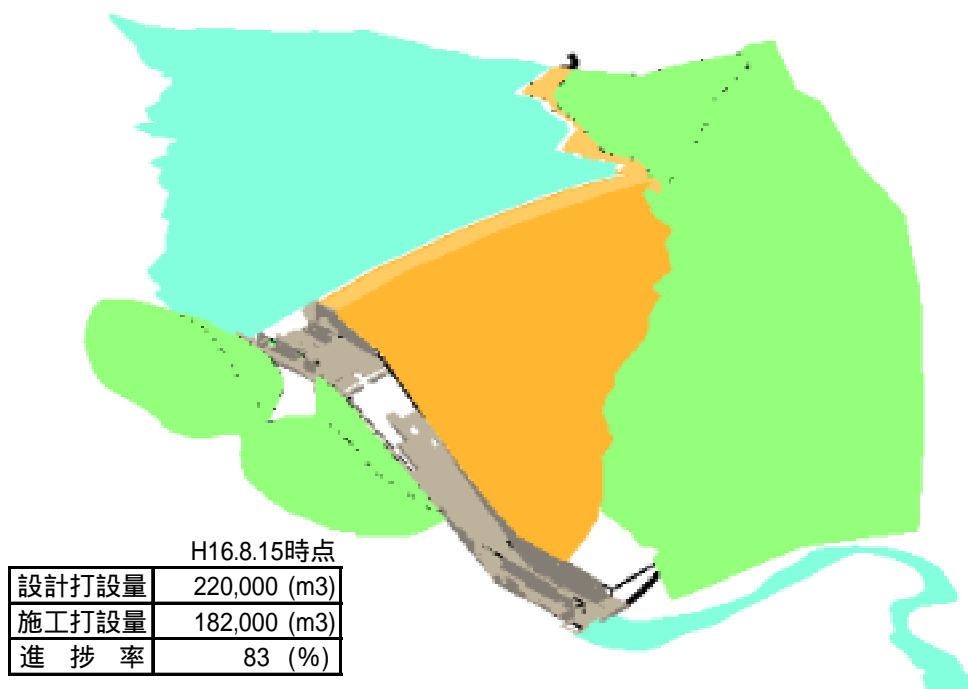


事業の進捗状況と今後の事業工程

徳山ダム建設事業においては、転流工及び基礎掘削は平成14年3月までに終了し、平成16年8月15日現在、堤体盛立量約835万m³（進捗率約61%）、洪水吐きコンクリート打設量約18万m³（進捗率約83%）に達している。

堤体盛立、洪水吐きコンクリート打設、付替国道・県道工事の進捗状況を図 - 1 ~ 3 に示す。

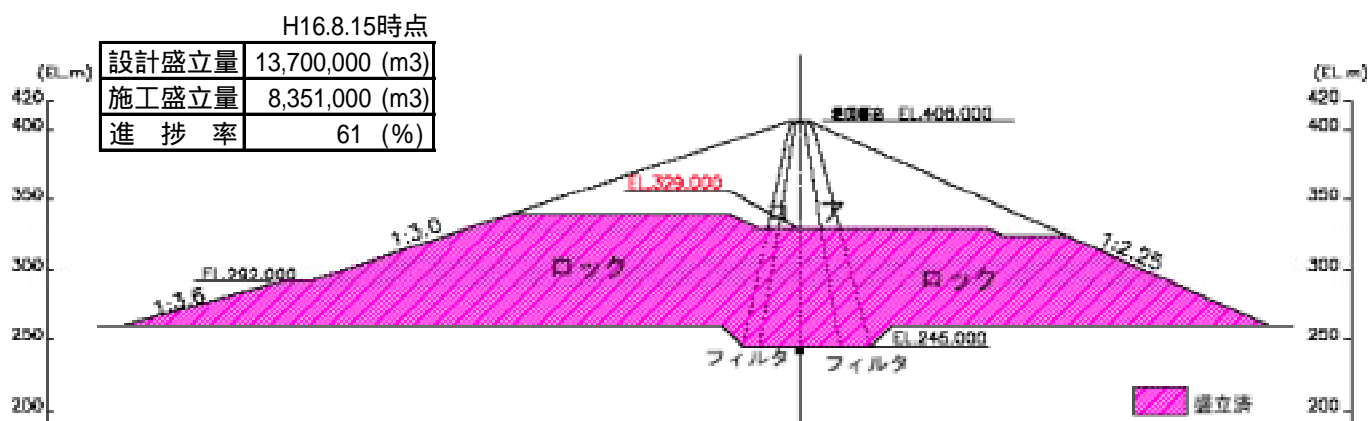

付替国道・県道進捗状況

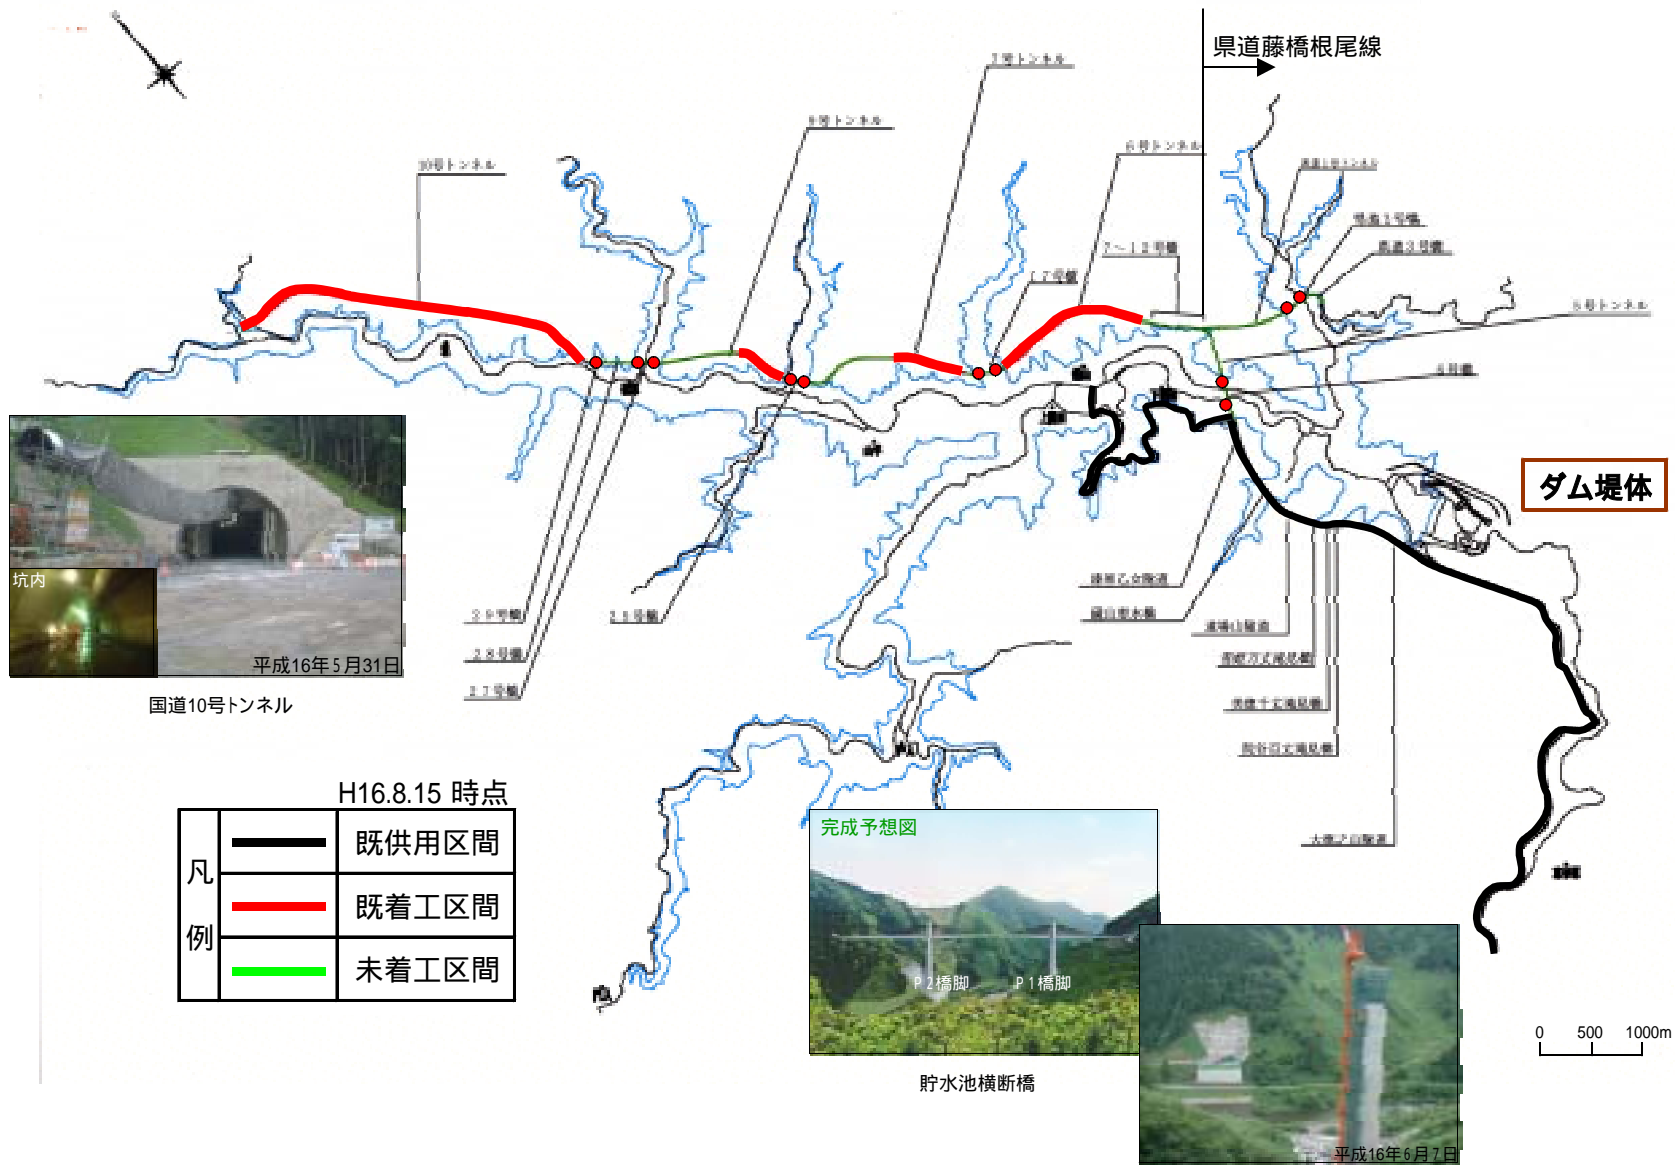


図 - 3 付替国道・県道工事進捗状況

平成16年度以降に実施する主な工事の工程は、表 - 1 に示すとおりである。

表 - 1 主要工事工程表

工事種別		平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度			平成20年度																					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
堤体工事	基礎処理		■			■			■																										
	盛立	コア・フィルタ	■			■			■																										
		ロック	■			■			■																										
	堤頂設備											■																							
洪水吐き工事	コンクリート打設		■			■			■																										
	常用洪水吐き・非常用洪水吐きゲート設備		■			■			■																										
	管理用橋梁・ゲート操作室											■																							
放流設備	選択取水設備		■			■			■																										
	利水放流設備		■			■			■																										
	水位低下用放流設備		■			■			■																										
管理設備					■			■			■																								
国道・県道付替工事		■			■			■			■																								
試験湛水											■			■			■			■			■			■			■			■			
管理移行																													■			■			
