

平成16年度  
中部地方整備局事業評価監視委員会  
現地視察資料（徳山ダム）

平成16年8月6日

国土交通省 中部地方整備局  
独立行政法人水資源機構 中部支社

# 目 次

( 1 ) 事業の概要	.....	1
( 2 ) ダム建設工事の概要	.....	3
( 3 ) 工事の進捗状況	.....	9

## ( 1 ) 事業の概要

### 目的

#### 洪水調節

ダム地点の計画高水流量 $1,920\text{m}^3/\text{s}$ の全量をダムで調節し、ダム下流域の洪水被害を軽減する。

#### 流水の正常な機能の維持

河川に流れる水の量が豊富な時にダムに貯留し、必要な流量が不足している時に河川に補給することによって、揖斐川の既得用水が安定して取水できるように、また河川環境の維持のために常に水が流れているようにする。

また、渇水に強い木曾川水系とするため、異常渇水時に緊急水を補給できるようにする。

#### 新規利水

徳山ダムの貯留水を利用して新たに、岐阜県・愛知県・名古屋市の水道用水として最大 $4.5\text{m}^3/\text{s}$ 、岐阜県・名古屋市の工業用水として最大 $2.1\text{m}^3/\text{s}$ を取水できるようにする。

#### 発電

電源開発(株)が建設する徳山発電所において、最大出力15万3千kWの発電を行う。

徳山ダム位置図



## 諸元

### ダ ム

位 置 岐阜県揖斐郡藤橋村  
 河 川 木曾川水系揖斐川  
 形 式 中央遮水壁型ロックフィルダム  
 堤 高 161.0m  
 堤頂長 427.1m  
 堤体積 約1,370万m<sup>3</sup>


### 貯水池

集水面積 約254.5km<sup>2</sup>  
 湛水面積 約13km<sup>2</sup>  
 総貯水容量 6億6,000万m<sup>3</sup>  
 有効貯水容量 3億8,040万m<sup>3</sup>

完成予想図




貯水池容量配分図（洪水期）

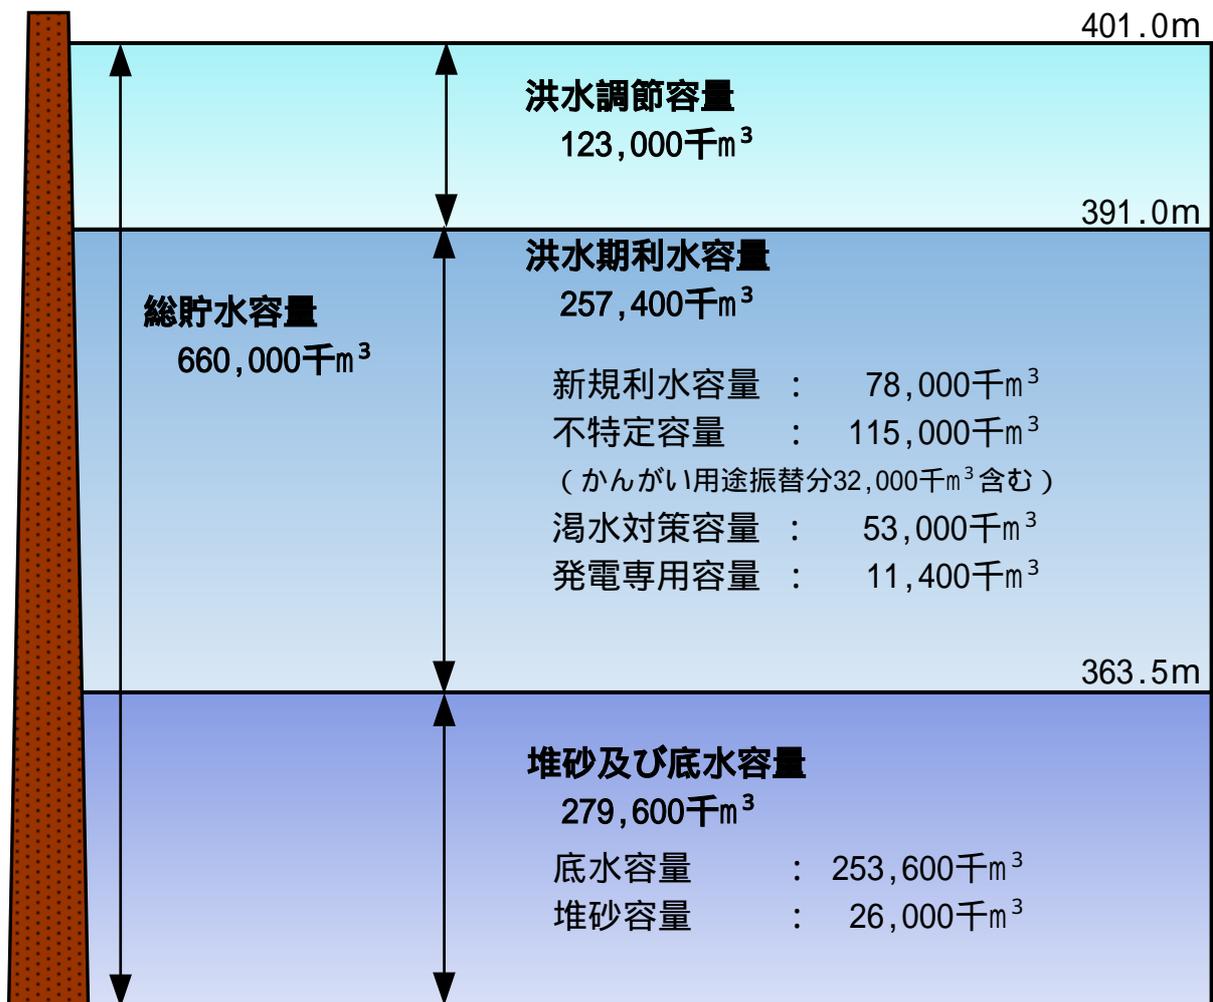


## (2) ダム建設工事の概要

### 工事の概略工程

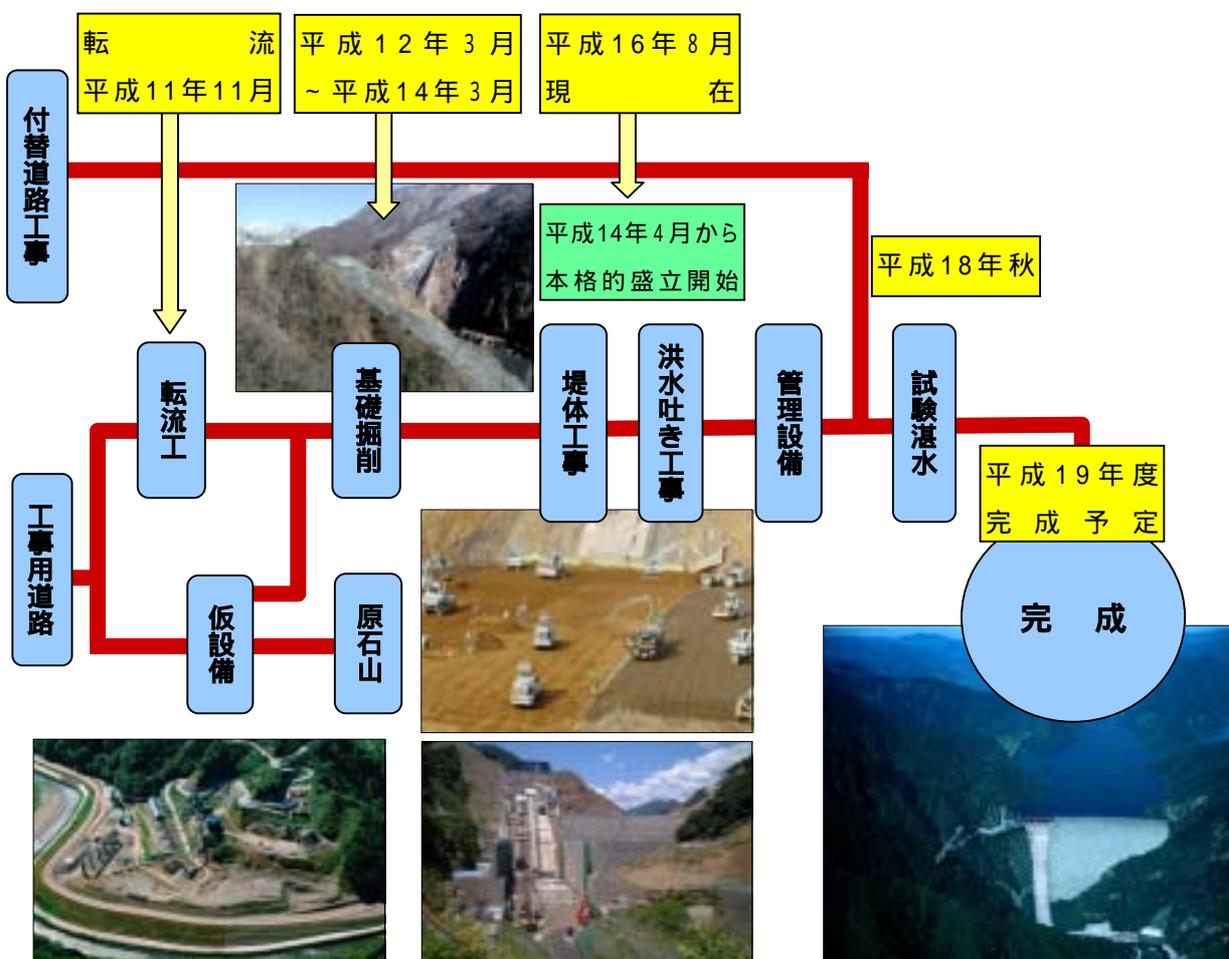


# ダム本体施工計画概要

## ダム本体施工計画概要

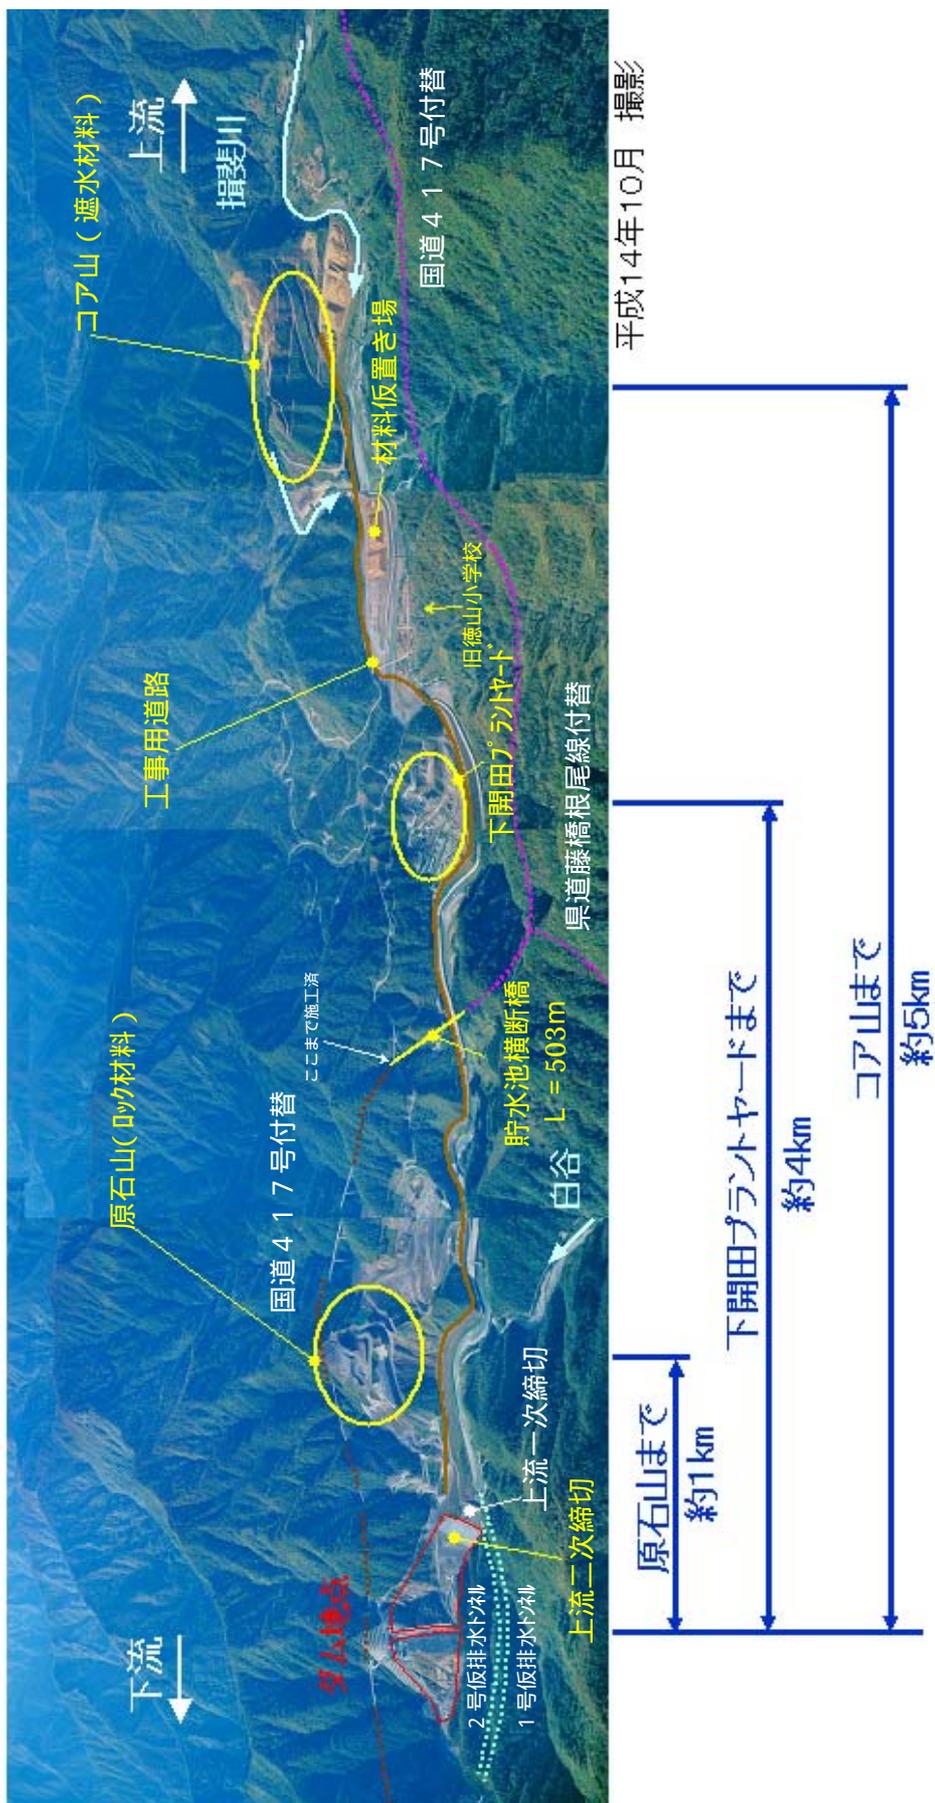


# ダム本体

## 堤体平面図

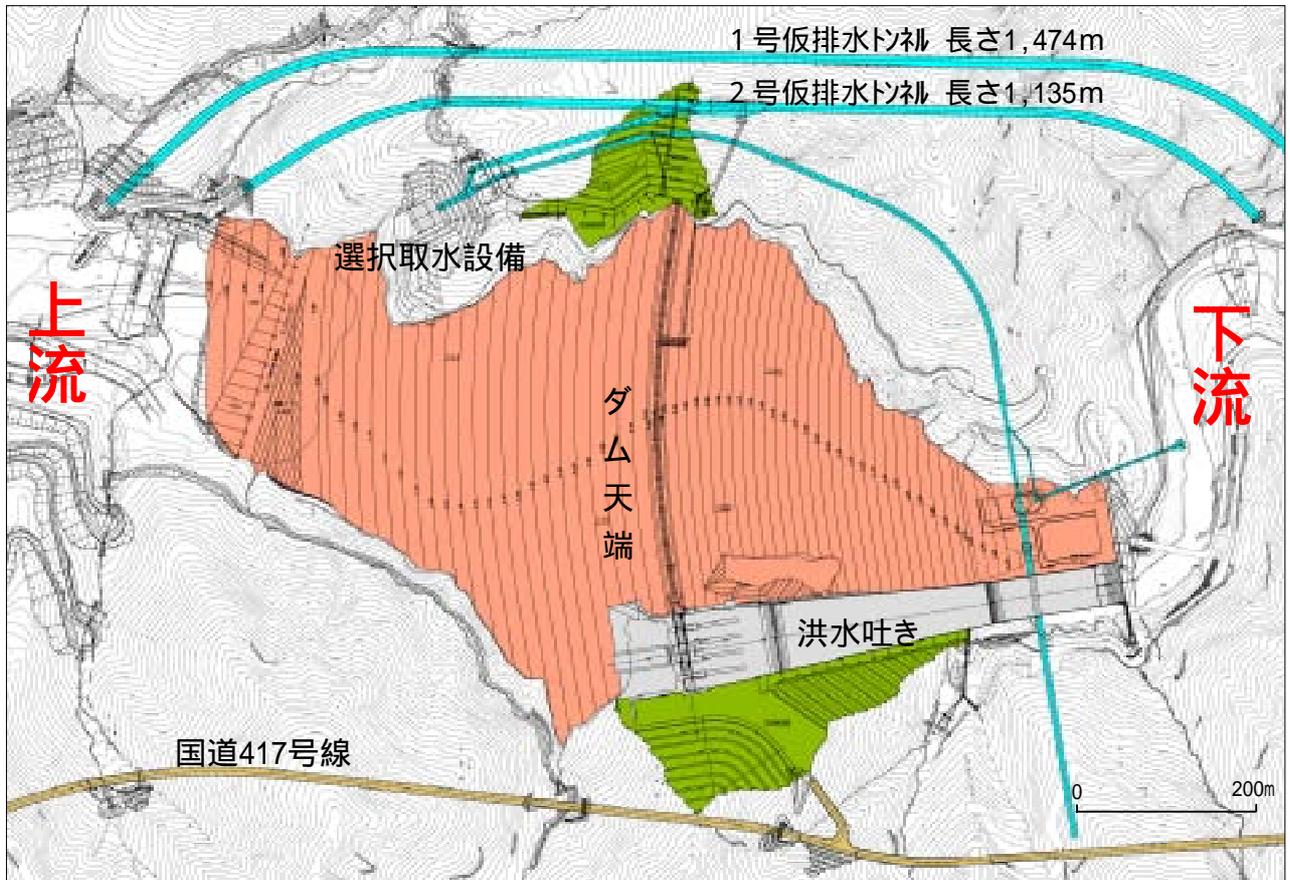

## 堤体標準断面図

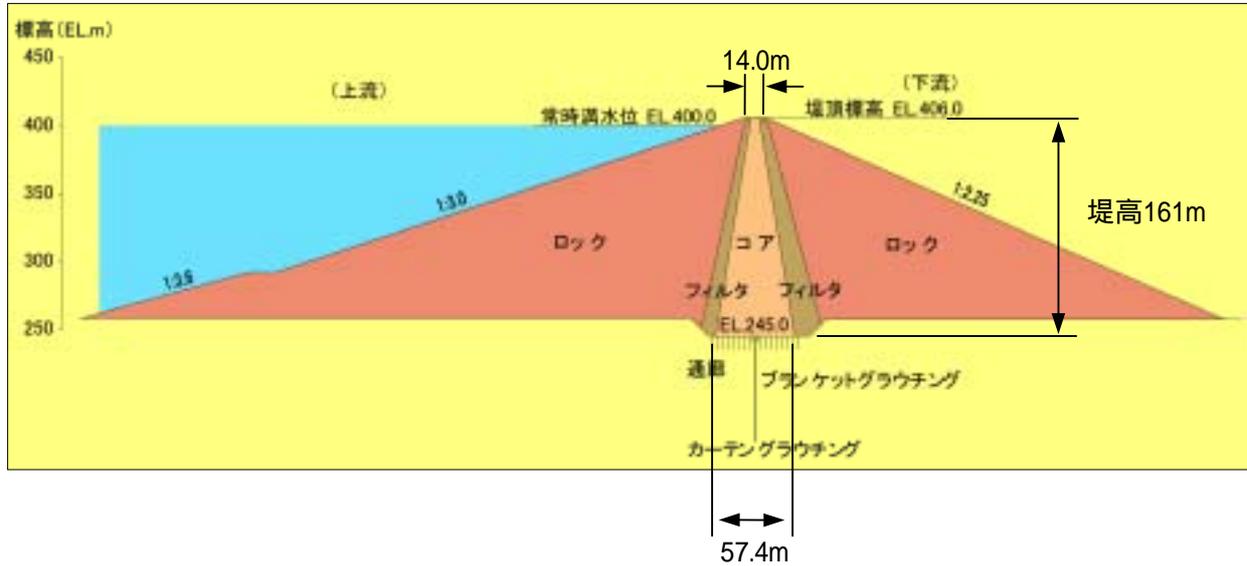

## 堤体ダム軸縦断面図 (上流から下流を望む)



原石山（左岸天端進入路から望む）



平成16年 8月 2日 撮影

コア山（本郷進入路から望む）



平成16年 8月 2日 撮影

骨材・フィルタ材製造プラント、コンクリート製造プラント

下開田プラントヤード（上空から望む）



平成14年10月 撮影

( 3 ) 工事の進捗状況  
ダム本体関連工事

ダム堤体 ( 左岸から望む )



平成 12 年 7 月 撮影



平成 14 年 5 月 28 日 撮影




平成 16 年 8 月 2 日 撮影

ダム堤体（上流からダム建設地点を望む）



平成 13 年 9 月 4 日 撮影




平成 16 年 8 月 2 日 撮影

ダム堤体・洪水吐き（下流からダム建設地点を望む）




平成 13 年 9 月 4 日 撮影



平成 16 年 8 月 2 日 撮影

## 堤体盛立状況（平成 16 年 7 月 31 日現在）

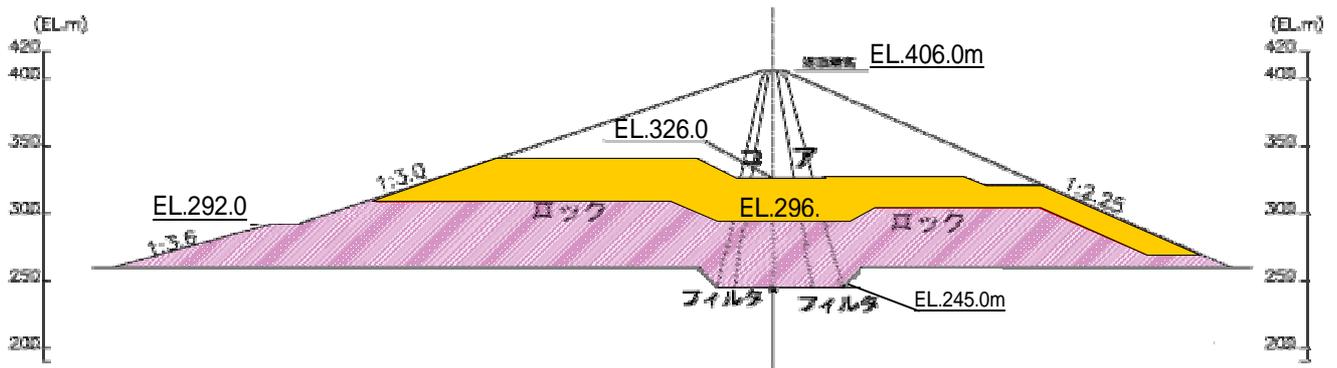


盛立済(~平成16年3月)

平成16年7月31日 現在

盛立済(平成16年4月～7月31日)

設計数量	施工数量	進捗率
13,700,000m <sup>3</sup>	8,004,000m <sup>3</sup>	58%

## 洪水吐きコンクリート打設状況（平成16年7月31日現在）

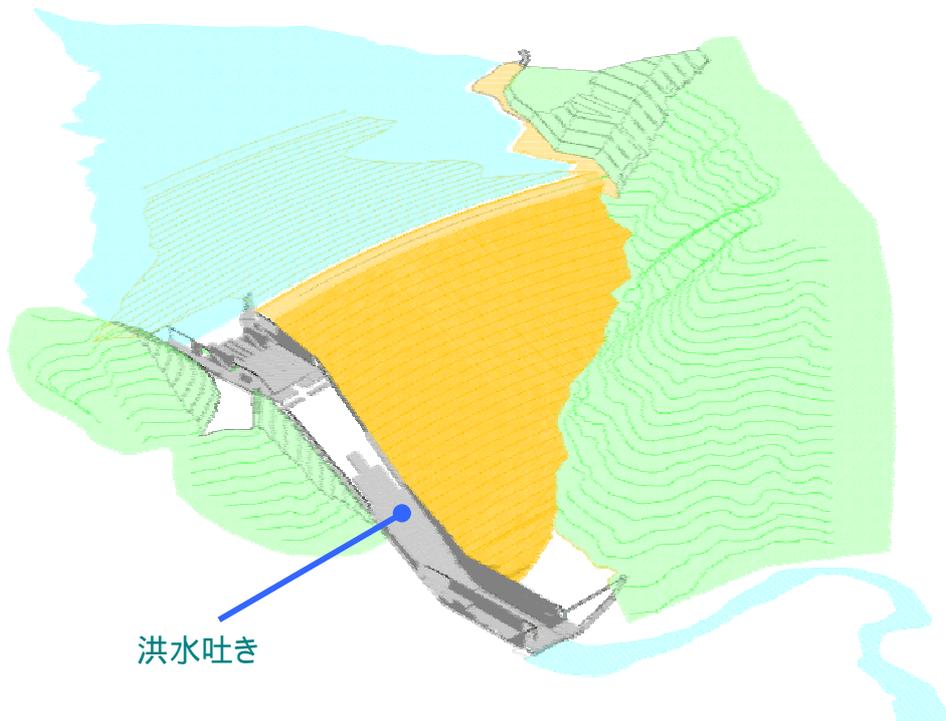


コンクリート打設済箇所

平成16年7月31日 現在

設計打設数量	打設済数量	進捗率
220,000m <sup>3</sup>	180,000m <sup>3</sup>	82%

# 付替国道417号・県道藤橋根尾線工事

## 付替国道・県道進捗状況

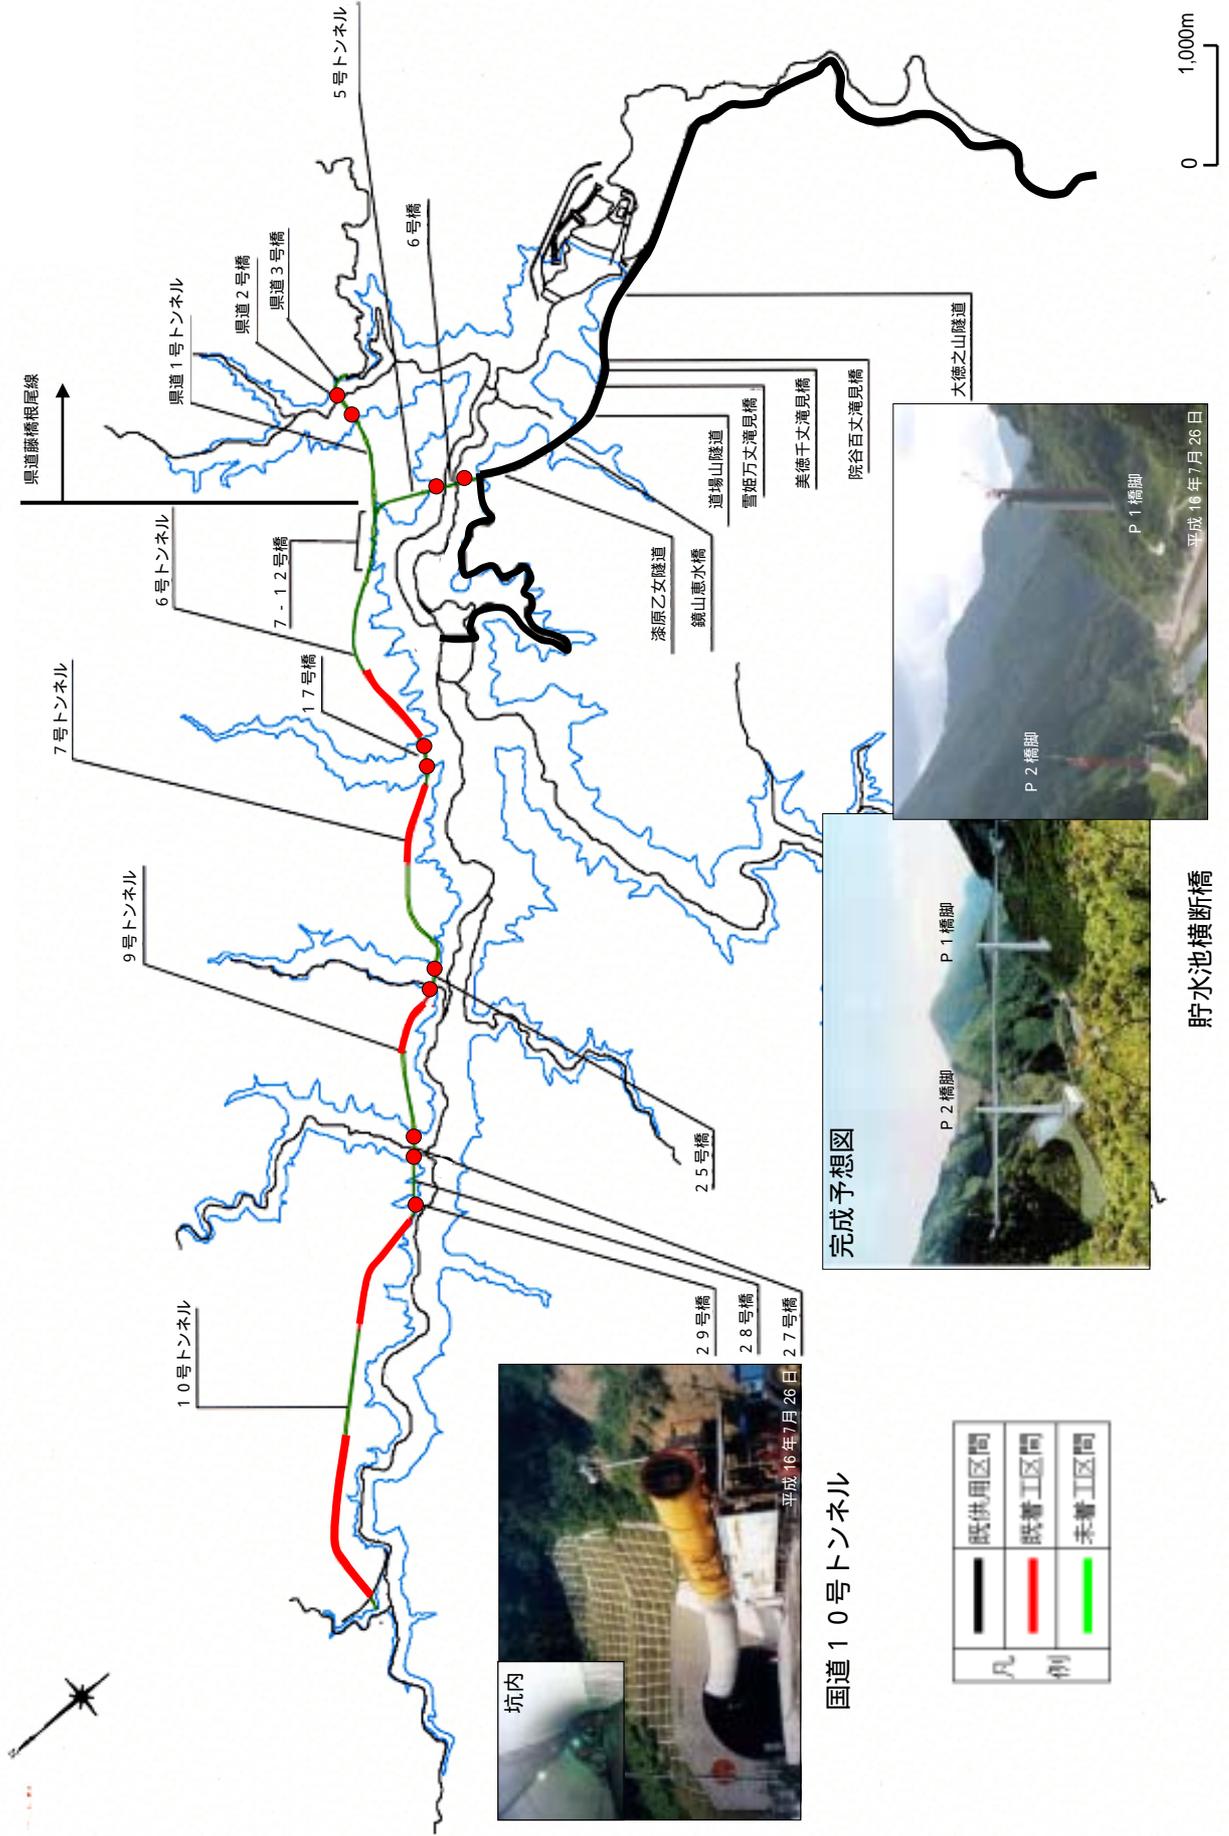

国道10号トンネル


凡	既供用区間
例	既着工区間
	未着工区間

完成予想図

貯水池横断橋

# 付替国道6号橋（貯水池横断橋）

## 付替国道6号橋（貯水池横断橋）側面図

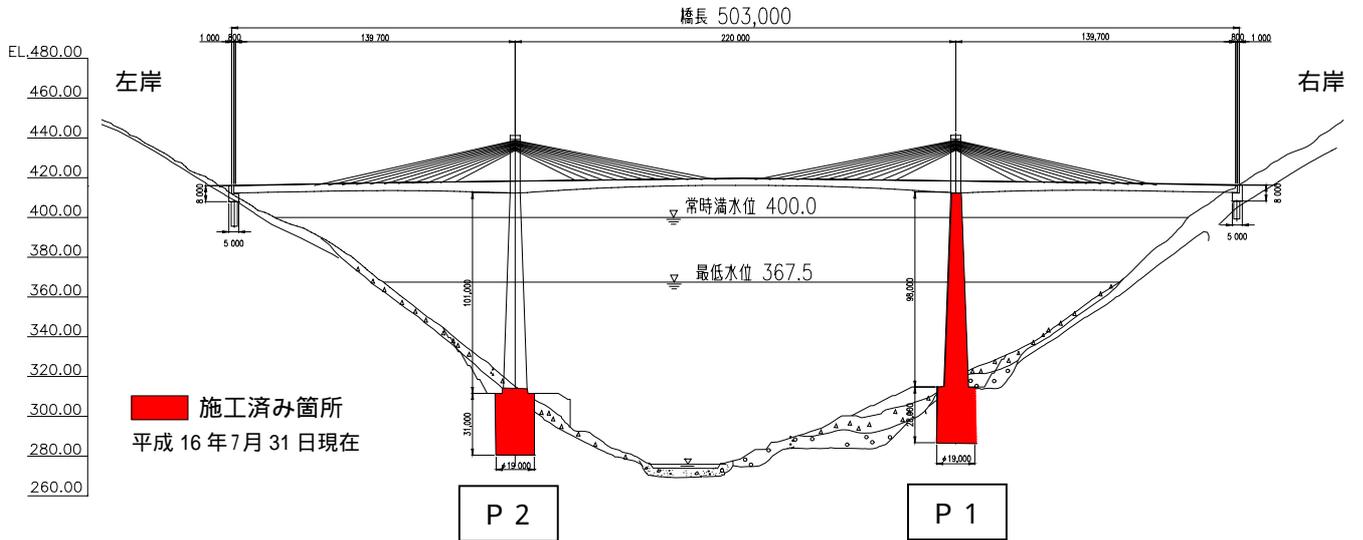

## 付替国道6号トンネル



平成16年8月2日 撮影
