

第9回徳山ダム事業費管理検討会

配付資料一覧

1. 第9回徳山ダム事業費管理検討会議事次第
2. 徳山ダム事業費管理検討会 名簿
3. 議事

①山林公有地化について

資料-1

②事業費管理について
・全体事業費の執行状況

資料-2

③試験湛水について

資料-3

④今後のスケジュール（案）

資料-4

資料－1

①山林公有地化について

徳山ダム上流域の山林の取得について

1 取得計画

年度区分	取得面積	取得割合
平成17年度	184ha	1%
平成18年度	7,781ha	44%
平成19年度	9,735ha	55%
合計	17,700ha	100%

2 平成17年度取得分

筆数	土地全体の面積 (A)	持分割合換算面積 (B)	取得割合 (C)	取得金額
完全取得した山林	184ha	(A) × 各筆の持分割合	(B) ÷ 17,700 × 100	204百万円
持分取得した山林		184ha	1.04%	
計	184ha	184ha	1.04%	204百万円

3 平成18年度取得分

筆数	土地全体の面積 (A)	持分割合換算面積 (B)	取得割合 (C)	取得金額
完全取得した山林	2,782ha	(A) × 各筆の持分割合	(B) ÷ 17,700 × 100	3,134百万円
持分取得した山林	9,221ha	2,782ha	15.71%	5,536百万円
計	12,002ha	4,937ha	27.89%	8,670百万円
		7,719ha	43.61%	

4 平成18年度取得分までの合計

筆数	土地全体の面積 (A)	持分割合換算面積 (B)	取得割合 (C)	取得金額
完全取得した山林	2,966ha	(A) × 各筆の持分割合	(B) ÷ 17,700 × 100	3,338百万円
持分取得した山林	9,221ha	2,966ha	16.75%	5,536百万円
計	12,186ha	4,937ha	27.89%	8,874百万円
		7,903ha	44.65%	

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。


- ②事業費管理について
- ・全体事業費の執行状況

○事業費管理について

資料-2

全体事業費の執行状況及び予定

(平成19年3月1日現在)

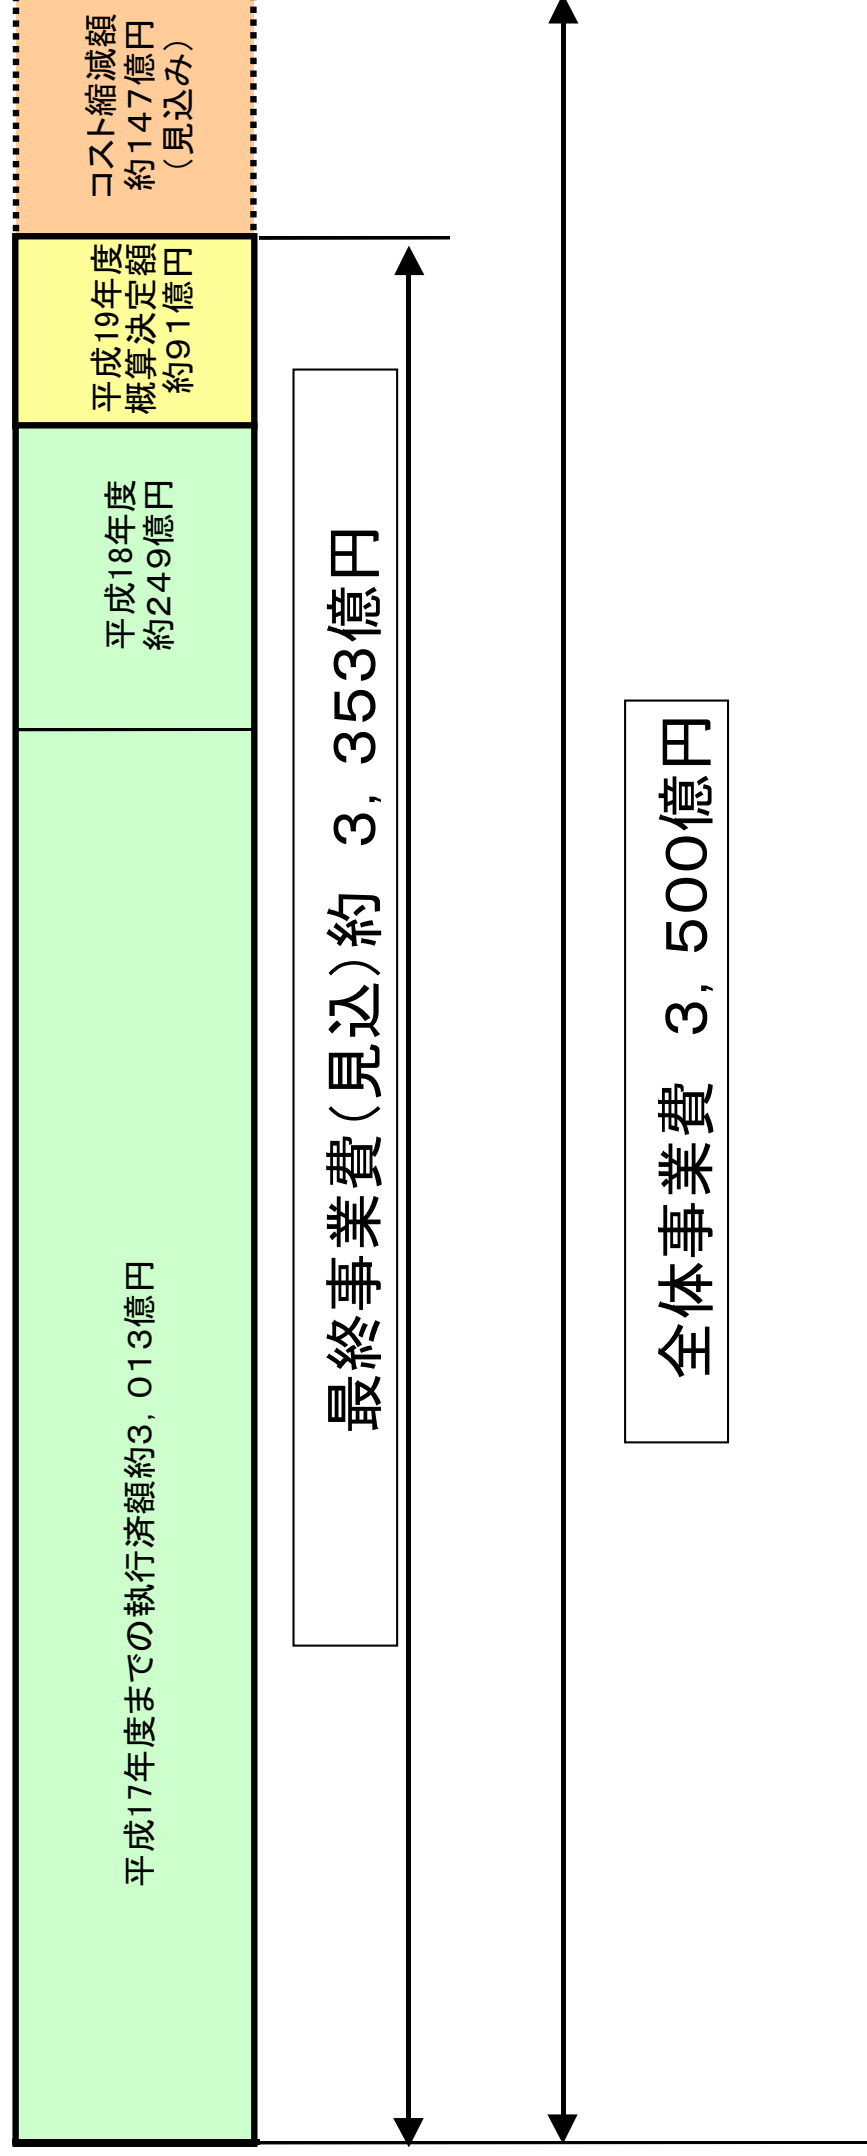


※平成17年度予算には特定事業先行調整費(約70億円)を含む。

※平成18年度予算には特定事業先行調整費(78億円)を含む。

資料－3

③試験湛水について

平成19年3月23日0時現在

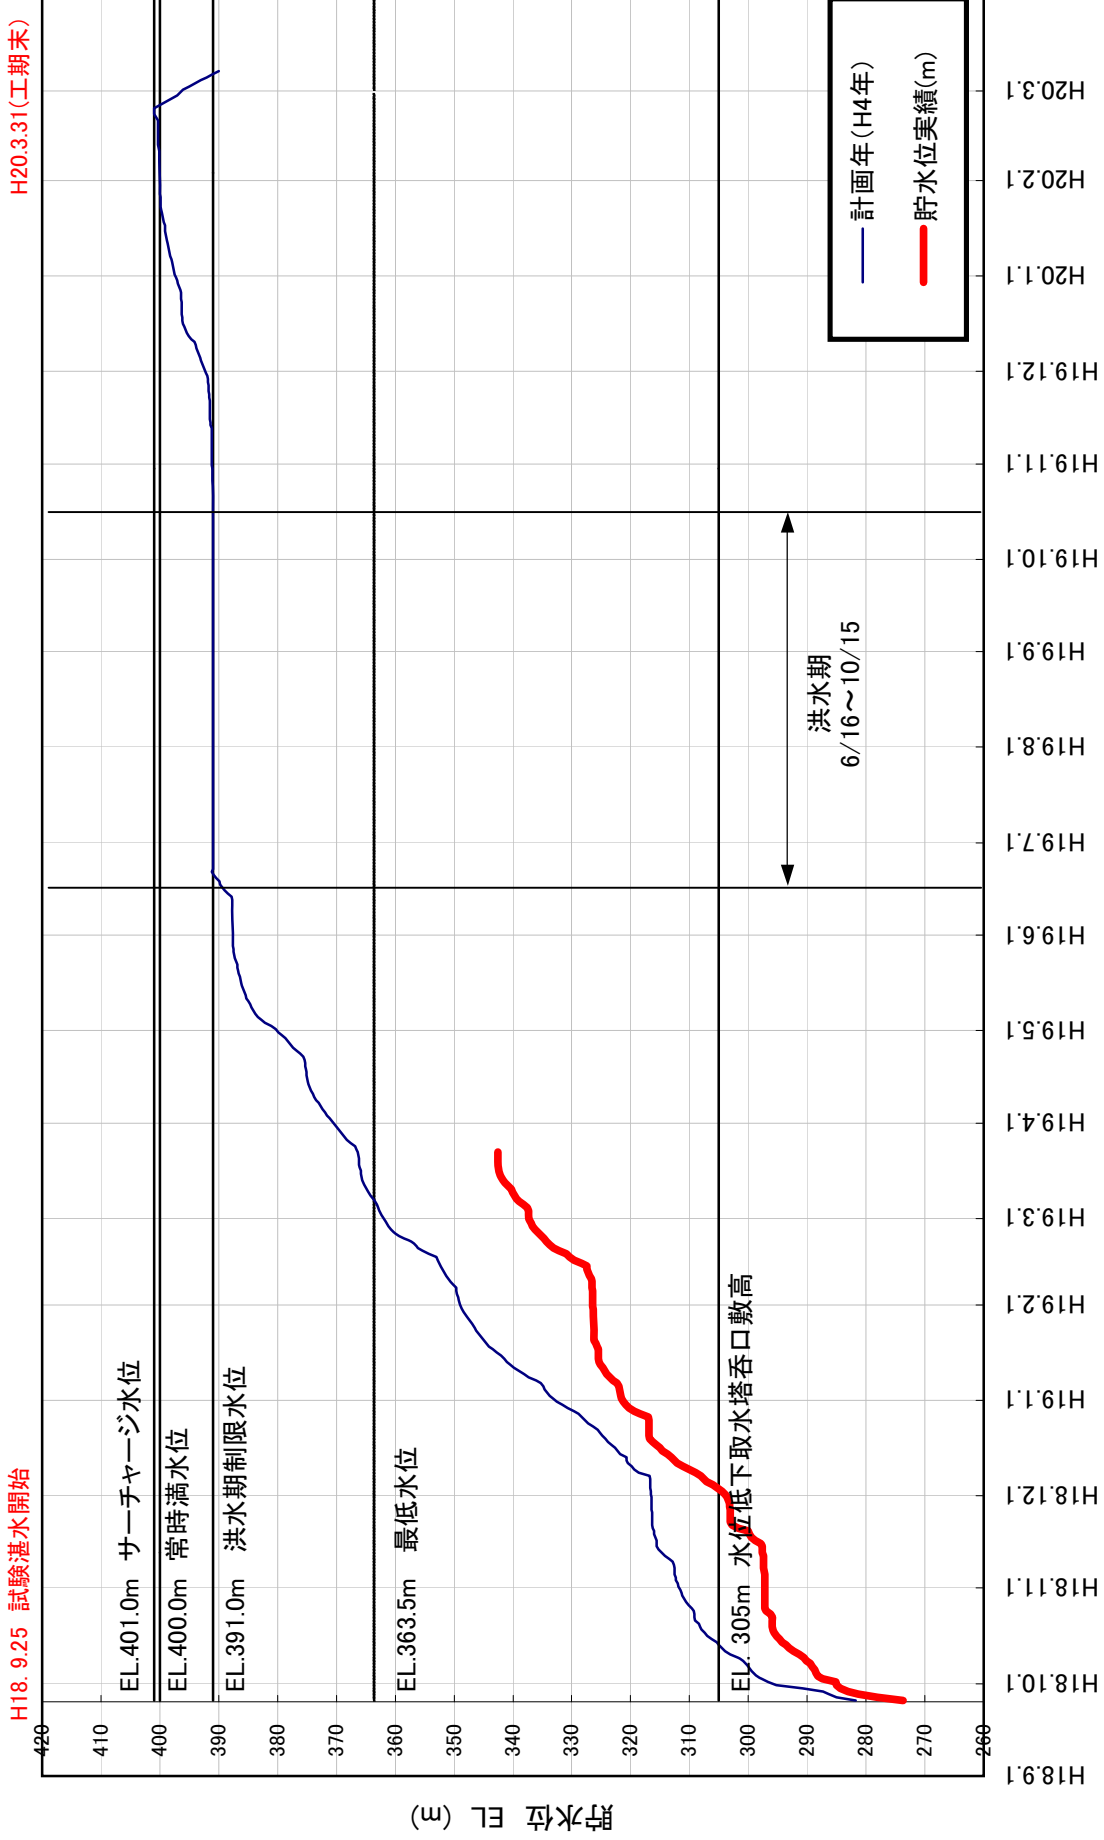

H18.9.25 試験湛水開始

H20.3.31(工期末)

徳山ダム試験湛水状況写真

堤体より上流を望む



撮影日：平成18年9月26日



撮影日：平成19年3月10日

徳山ダム試験湛水状況写真

徳山記念会館より上流を望む



撮影日：平成18年9月21日



撮影日：平成19年3月10日

資料－４

④今後のスケジュール（案）

今後のスケジュール(案)

資料-4

		平成18年度												平成19年度											
		上半期						下半期						上半期						下半期					
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
徳山ダム事業費 管理検討会	※検討会及び幹事会は、必要に応じて開催を行う予定 第16回、第17回、第18回幹事会 第7回検討会 第8回検討会																								
	幹事会 ○ 幹事会 ○ 検討会 ○ 検討会 ○																								
徳山ダム建設事業 コスト削減委員会	コスト削減策の実施状況のフォローアップ (フォローアップの過程においても継続してコスト削減の検討を行っていく) (コスト削減策の取りまとめ) (コスト削減策のフォローアップ方策)																								
	ワーキンググループ開催																								
山林公有地化 文殊関係 事業費管理	関係機関協議・地元説明・用地取得																								
	関係機関協議・地元説明・対策																								
事業費管理																									
