

# 淀川水系ダム事業費等監理委員会資料

## －大戸川ダム建設事業－

平成29年6月1日

近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所

# 1. 事業概要

## 1) 流域の概要

大戸川

流域面積：約190km<sup>2</sup>

流路延長：約38km


大戸川ダム

重力式コンクリートダム

ダム高：約67.5m

総貯水容量：約22,100千m<sup>3</sup>

集水面積：約152km<sup>2</sup>

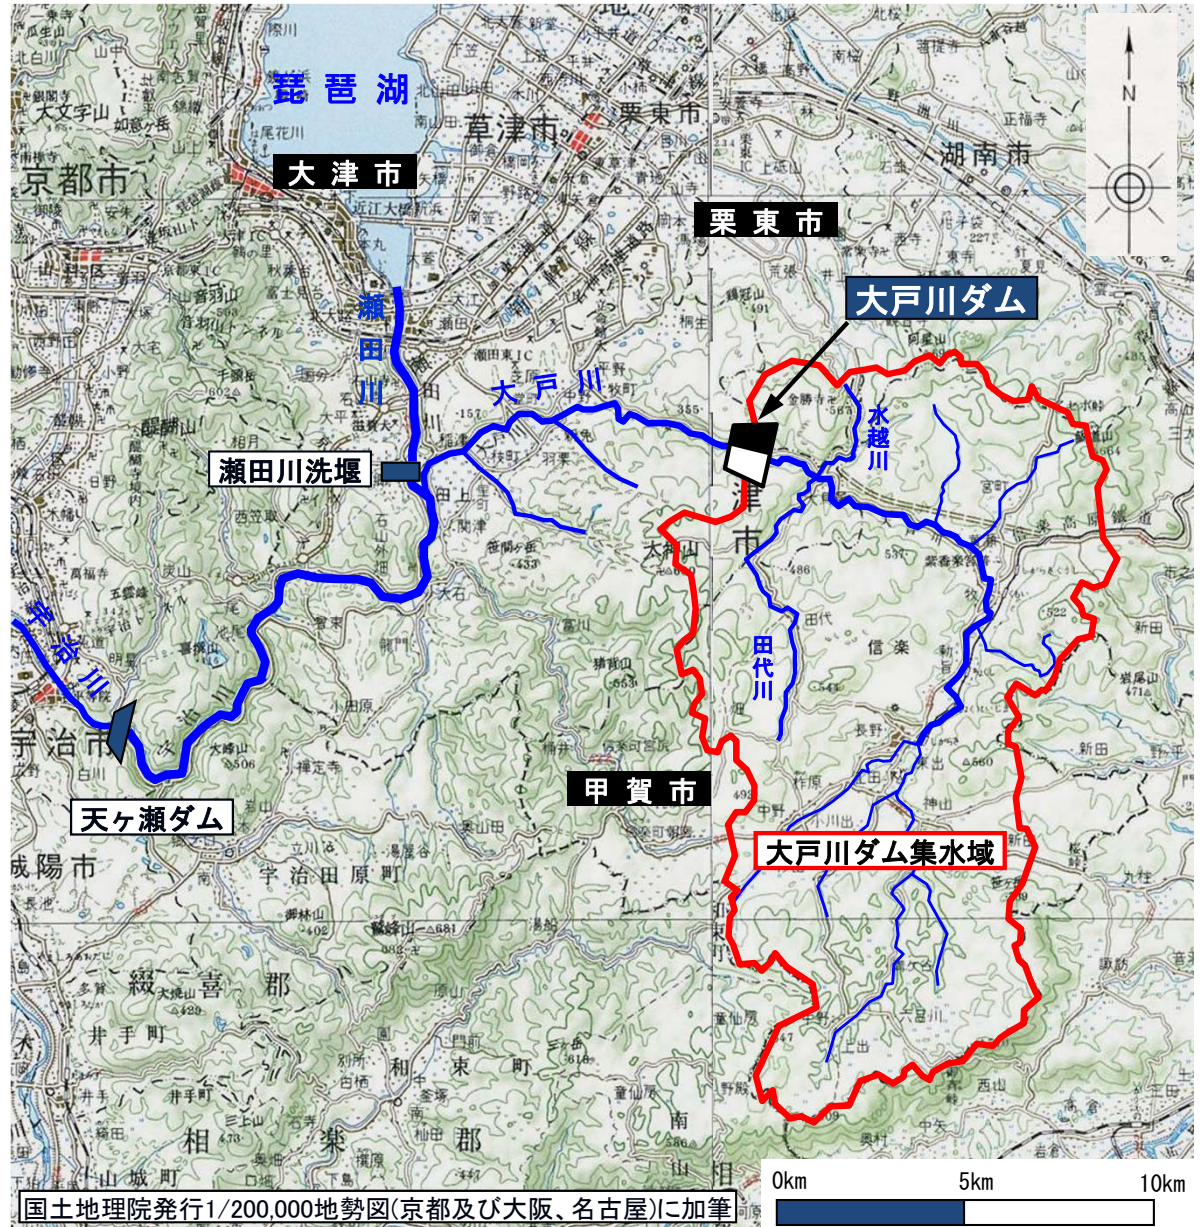


## 2) 事業の経緯



昭和43年	ダム予備調査着手
昭和53年 4月	ダム実施計画調査着手
平成元年 5月	ダム建設事業採択
平成 3年 3月	特定多目的ダム法に基づく基本計画告示
平成10年 3月	大鳥居地区 移転完了
平成11年 6月	付替県道大津信楽線 起工式
平成13年 2月	淀川水系流域委員会設置
平成13年 7月	水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画 決定
平成17年 7月	近畿地整より「淀川水系5ダムについての方針」公表
平成19年 8月	近畿地整より「淀川水系河川整備計画原案」公表
平成19年 8月	「淀川水系河川整備基本方針」策定
平成19年12月	近畿地整より淀川水系3ダム事業費変更公表
平成21年 3月	「淀川水系河川整備計画」策定
平成21年 7月	淀川水系ダム事業費等監理委員会 設立
平成21年12月	今後の治水のあり方に関する有識者会議における新たな評価基準により検証を行うダムとして位置付けられる
平成22年 9月	国土交通大臣よりダム事業の検証に関する検討の指示
平成23年 1月	大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第1回幹事会）
平成23年 3月	特定多目的ダム法に基づく基本計画廃止
平成27年10月	大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第2回幹事会）
平成28年 2月	大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第1回検討の場、第3回幹事会）
平成28年 7月	近畿地方整備局事業評価監視委員会
平成28年 8月	ダム事業の検証に係る対応方針（継続）の決定

## 2. 大戸川ダム検証に係る検討の流れ

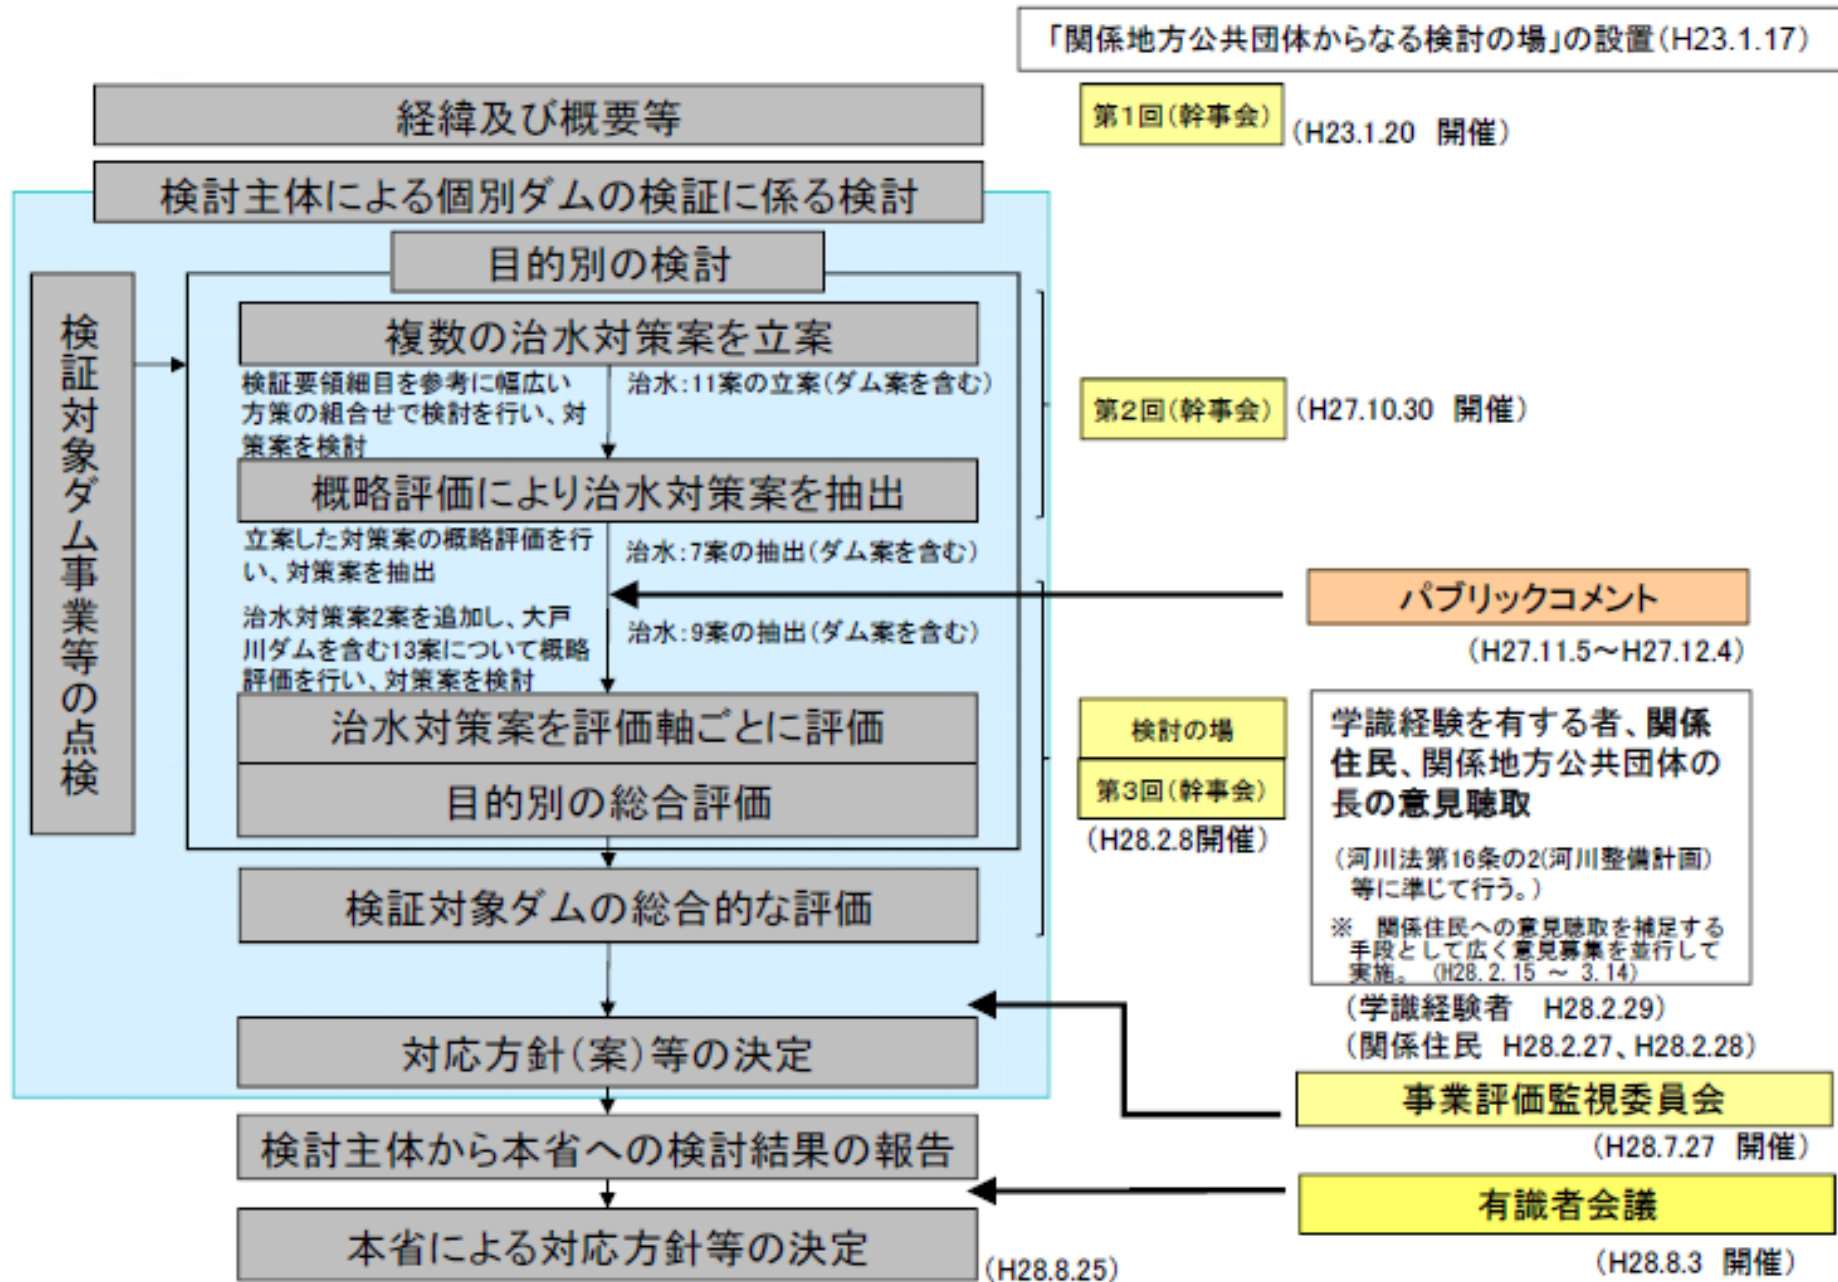

大戸川ダム建設事業は「継続」



### 3. 河川整備計画

#### 1) ダム及び付替県道大津信楽線の考え方

##### <大戸川ダム及び付替県道大津信楽線に関する考え方>

- ①大戸川ダムの**本体工事は当面実施しない。**
- ②将来、ダム本体工事に着手する場合は、改めて知事等の意見を聴き、河川整備計画を変更する。
- ③大戸川ダムの準備工事として**県道大津信楽線の付替工事はダム予算をもって継続する。**

##### <河川整備計画本文抜粋>

大戸川ダムについては、利水の撤退等に伴い、洪水調節目的専用の流水型ダムとするが、**ダム本体工事については、中上流部の河川改修の進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討することとし、これまで進捗してきた準備工事である県道大津信楽線の付替工事については、交通機能を確保できる必要最小限のルートとなるよう見直しを行うなど徹底的にコストを縮減した上で継続して実施する。**


# 4. 付替県道大津信楽線の見直し計画

## 1) 主要地方道 大津信楽線の概要

大津市と甲賀市信楽町を結び、地域間の交流と連携を強め、防災・震災対策による安全な暮らしのための道路として位置付けられています。

現道は、交通量が多く（約5,000台/日）幅員も狭隘なため交通混雑が発生しています。また、過去には落石による死亡事故が発生しており、安全な通行を確保するため、早期の完成を図る必要があります。


全長：19.70km  
交通量：約5,000台/日（H22調査）

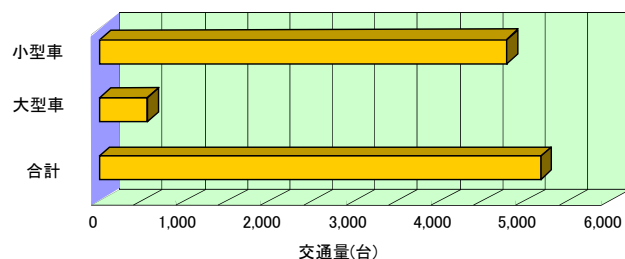

「平成22年度道路交通センサス」より



H25台風18号による現道への落石

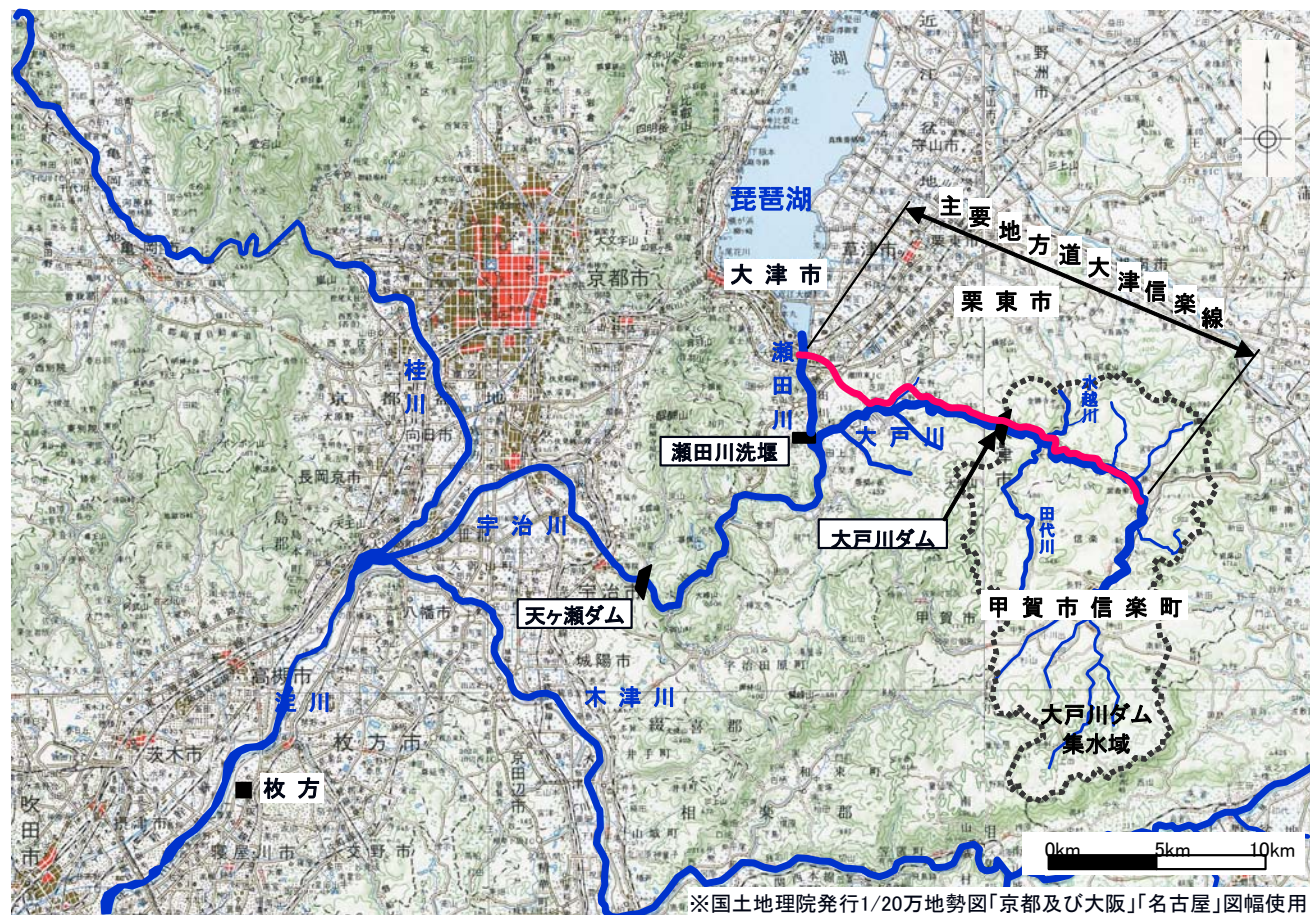






### 3) 見直し計画における付替道路の概要


ダムサイトが上流へ約900m移動したことにより、既着手区間から降下させながら比較的緩やかな地形の大戸川左岸に渡河し、整備済の工事用道路に接続させ、更には道路管理者の既着手区間に接続させる、より経済的なルートに見直しました。道路構造令改正により、道路規格を3種3級に見直し、歩道事業をとりやめ、一般部総幅員7.5mとする計画にしました。

#### 見直し計画

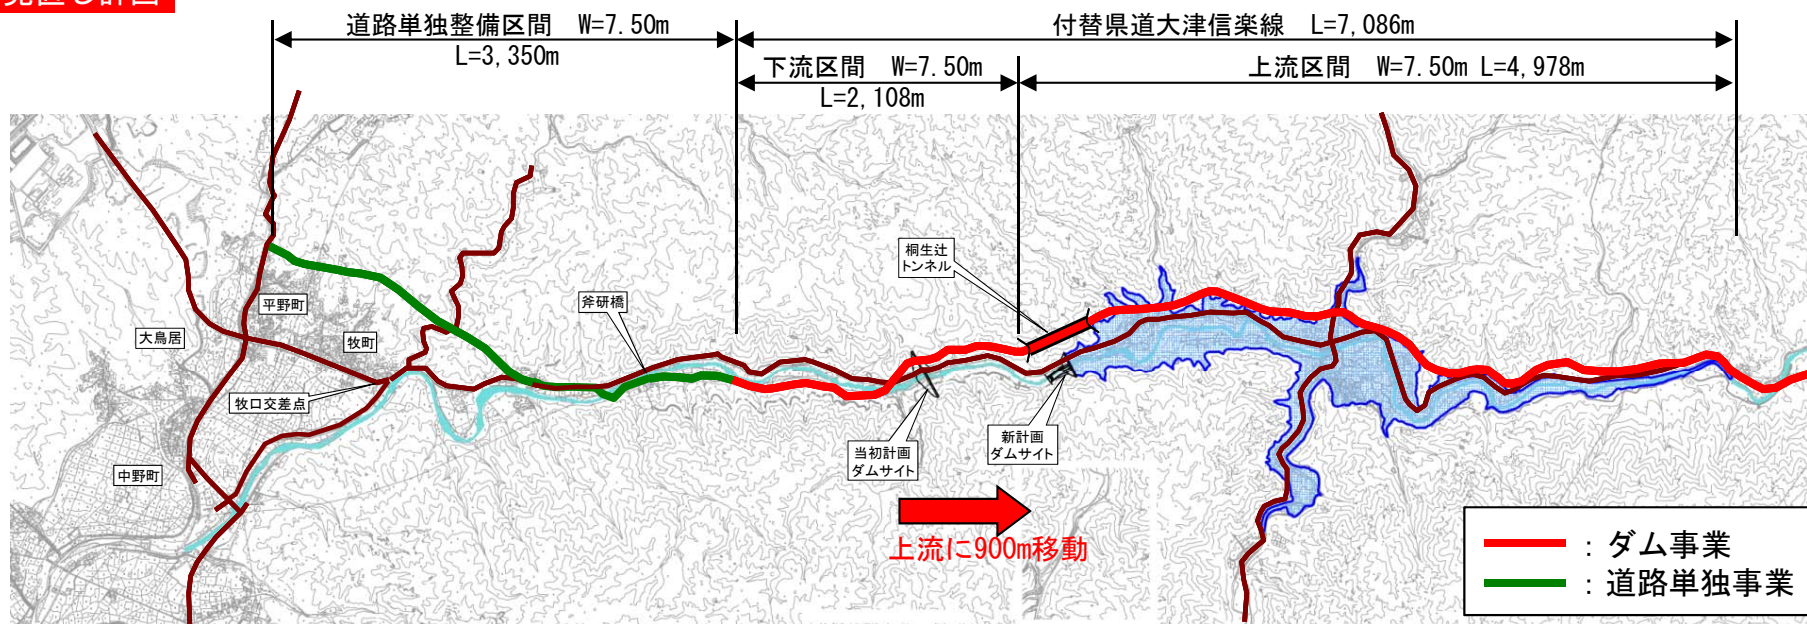


道路規格	3種3級
設計速度	50km/h
縦断勾配	最大6%


#### ○ 一般部



# 4) ダム事業と道路単独事業の施工区分

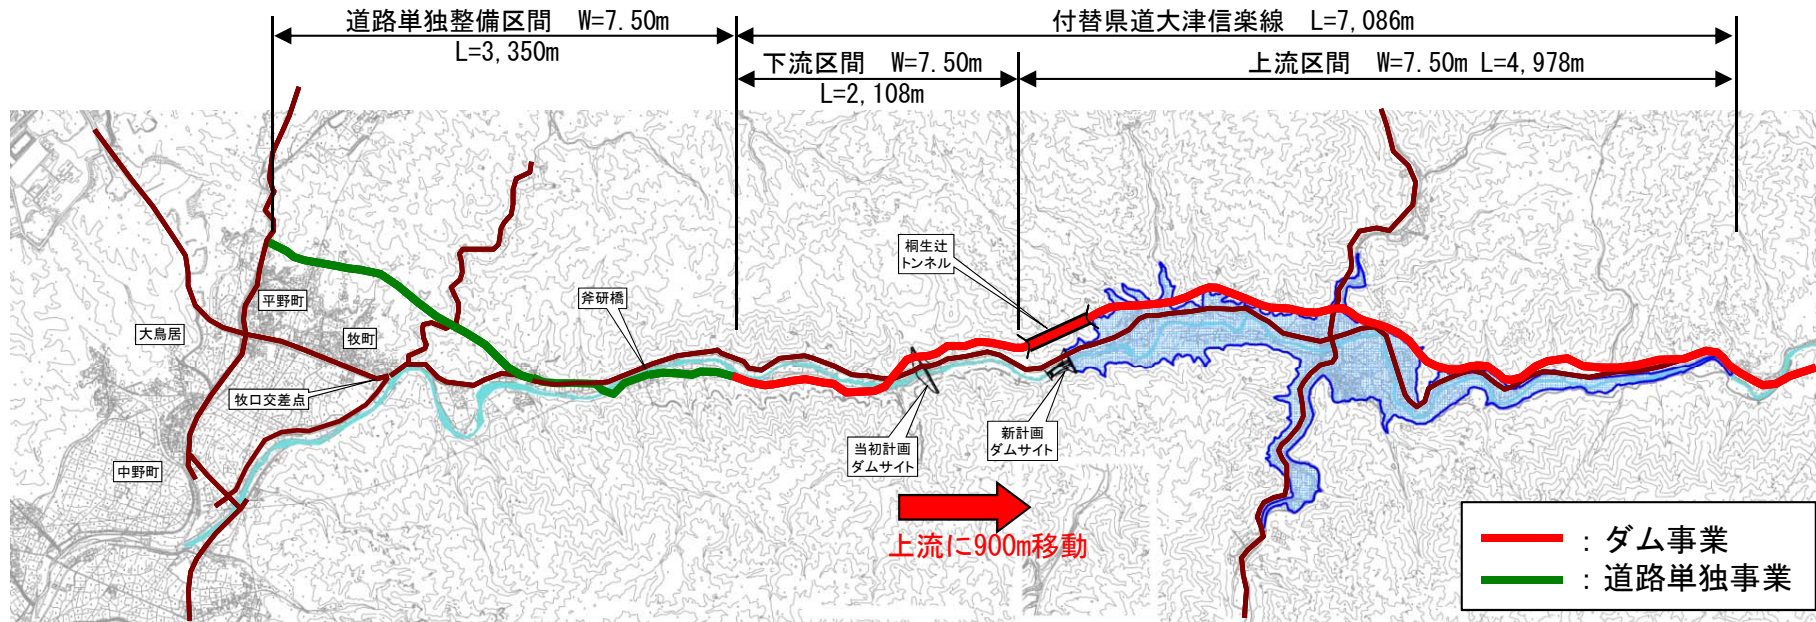


ダム事業として実施する施工区間は、ダムにより水没の影響を受ける上流端付近から下流区間で、現地盤にすり付く地点までとし、現地盤からの施工については道路単独事業(滋賀県)としています。

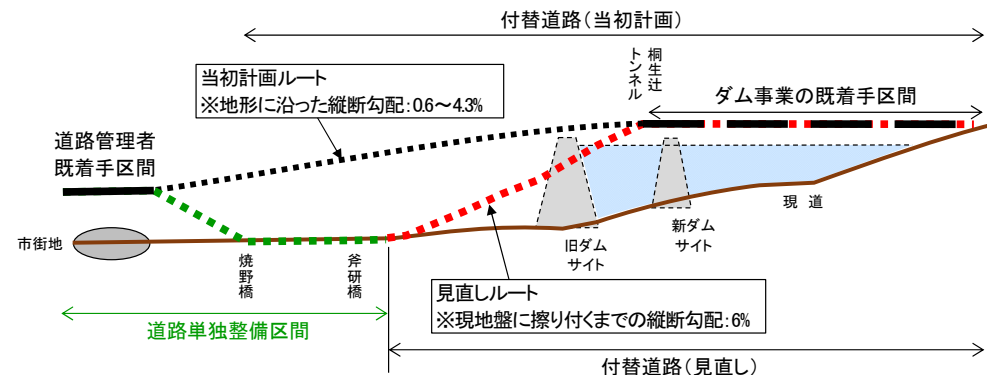

# 5. 事業進捗状況

## 1) 事業進捗率

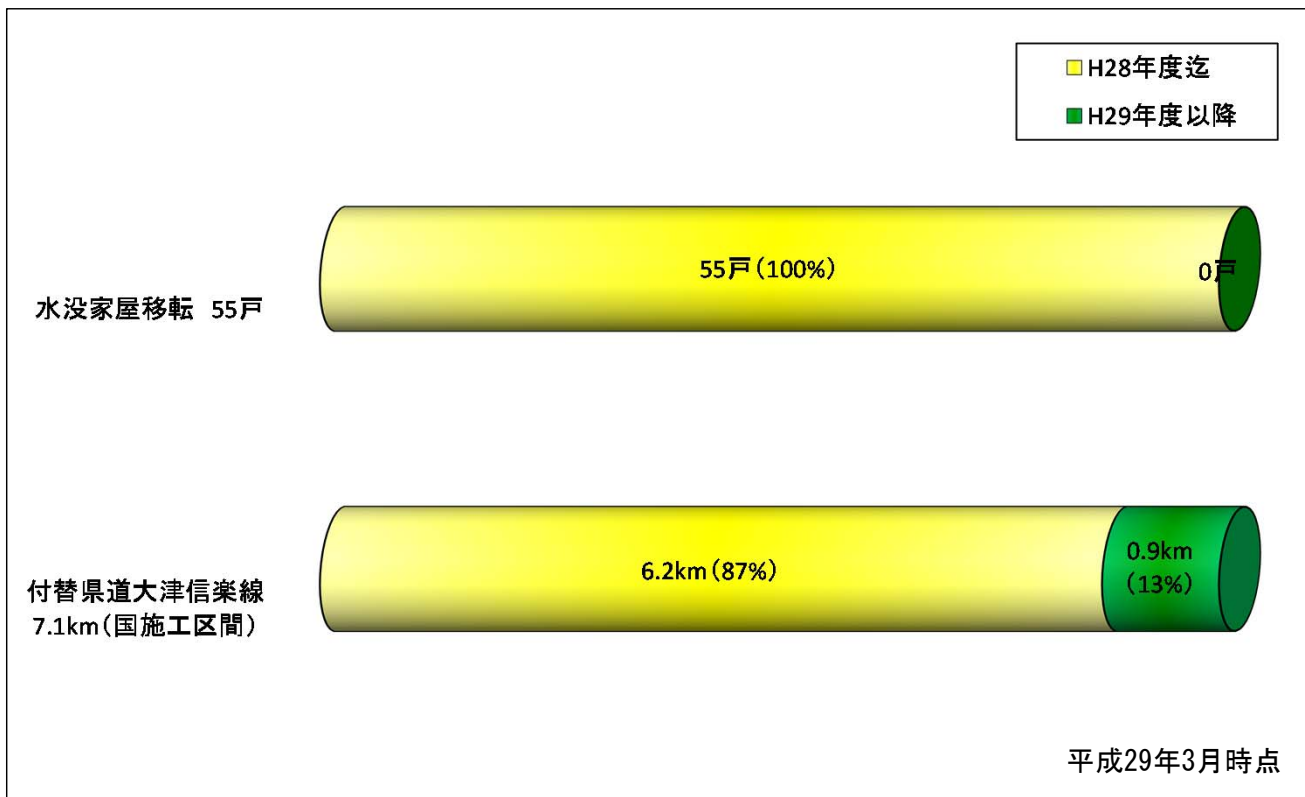

付替県道大津信楽線 新8号橋



付替県道大津信楽線 24号橋



### < 集団移転 >


平成10年3月  
大鳥居地区の移転完了



# 6. 事業費

## 1) 当面実施する内容の事業


淀川水系河川整備計画（H21.3策定）に定められた大戸川ダム建設事業において当面実施する内容の事業は付替県道になります。

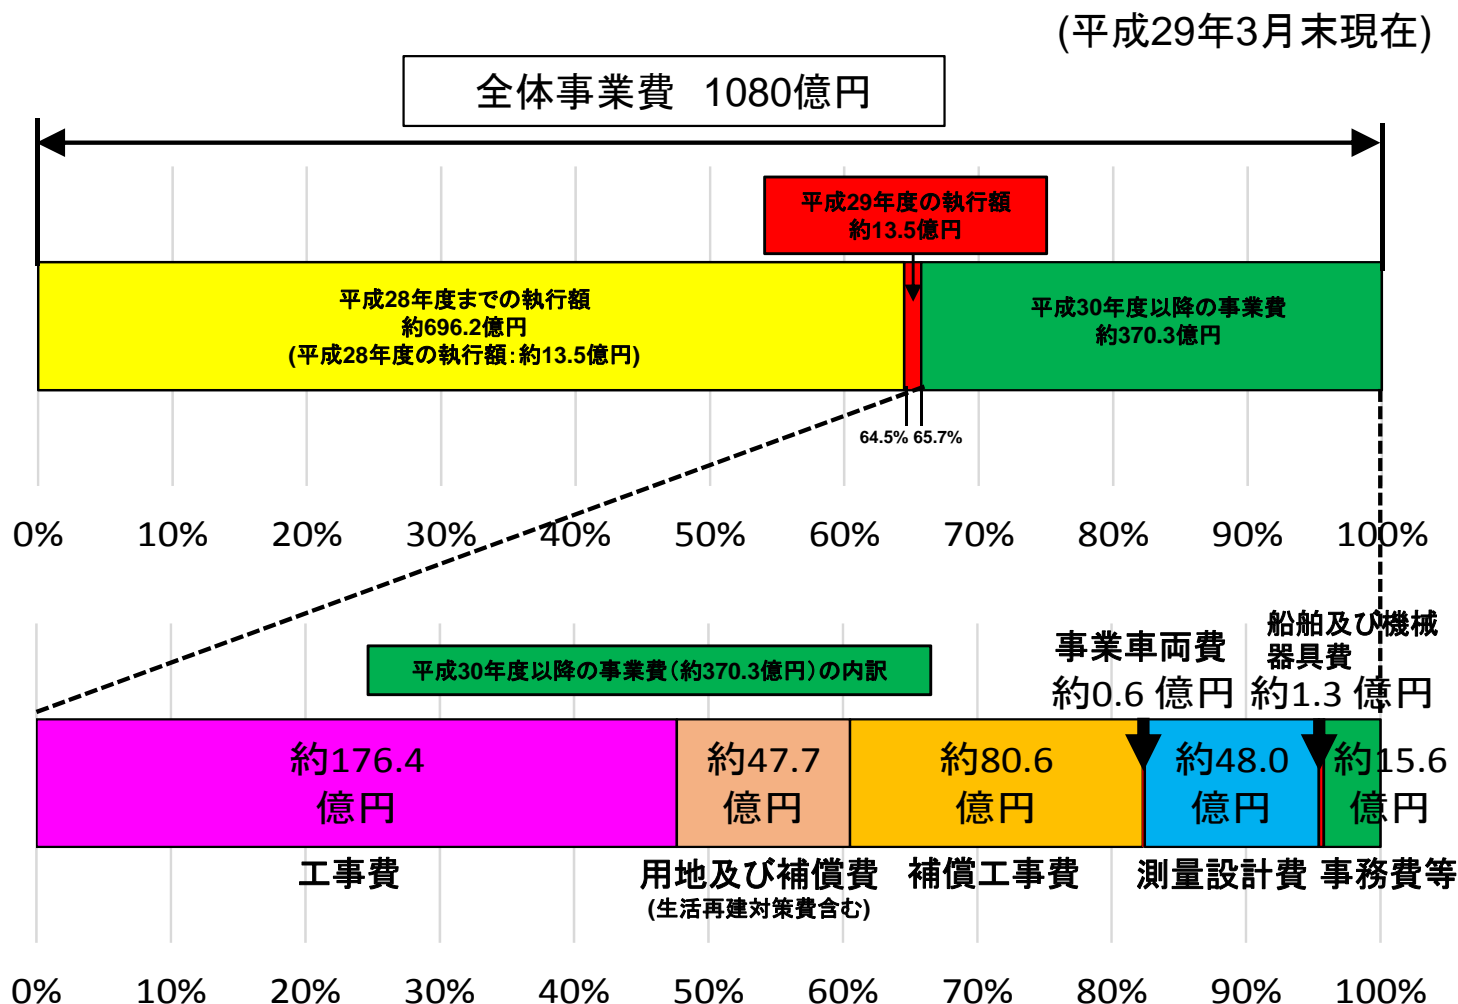

参考：大戸川ダム建設事業全体は約1,080億円（平成29年3月末までの執行済み額は約696億円）

# 7. 平成28年度工事実施概要

## ○実施箇所



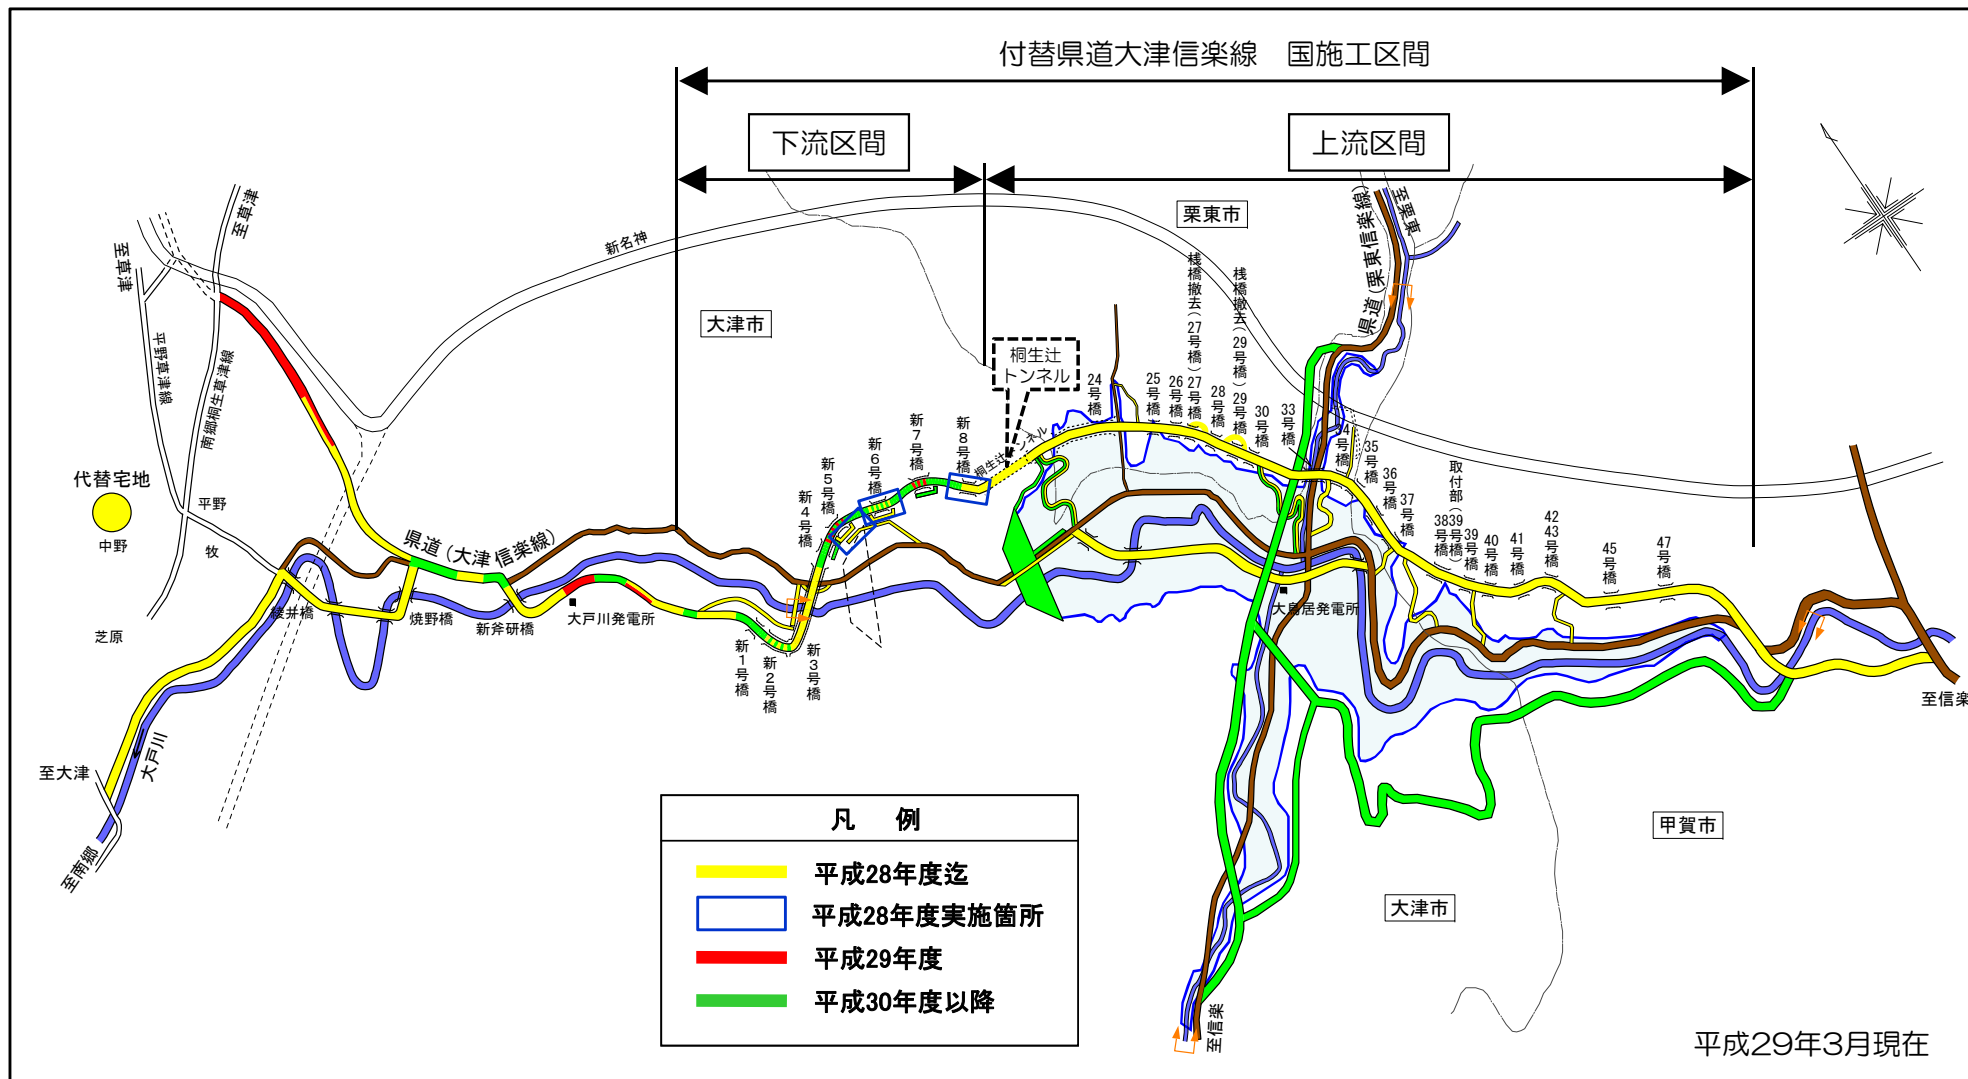


①. 大津信楽線新8号橋上部工工事

③. 大津信楽線新6号橋下部その他工事

②. 大津信楽線桐生地区工事用仮橋設置工事

# ①. 大津信楽線新8号橋上部工工事

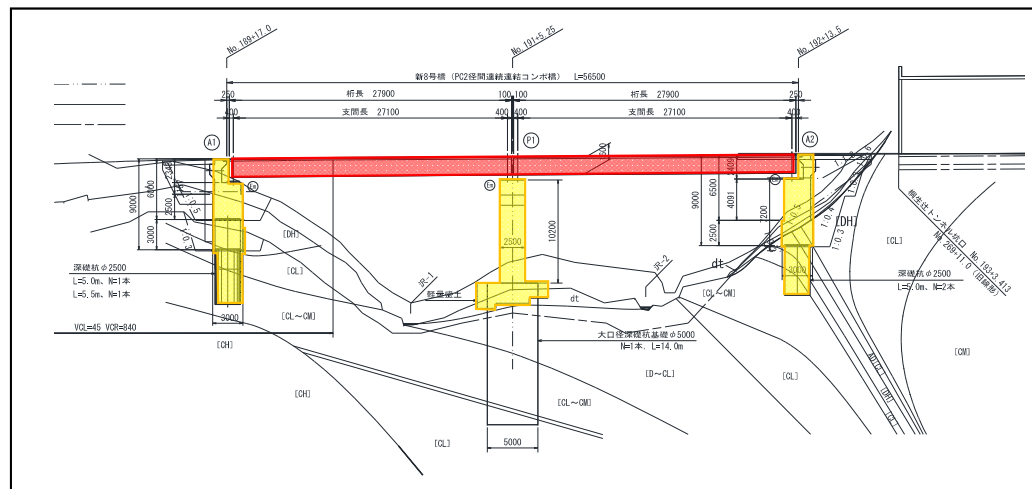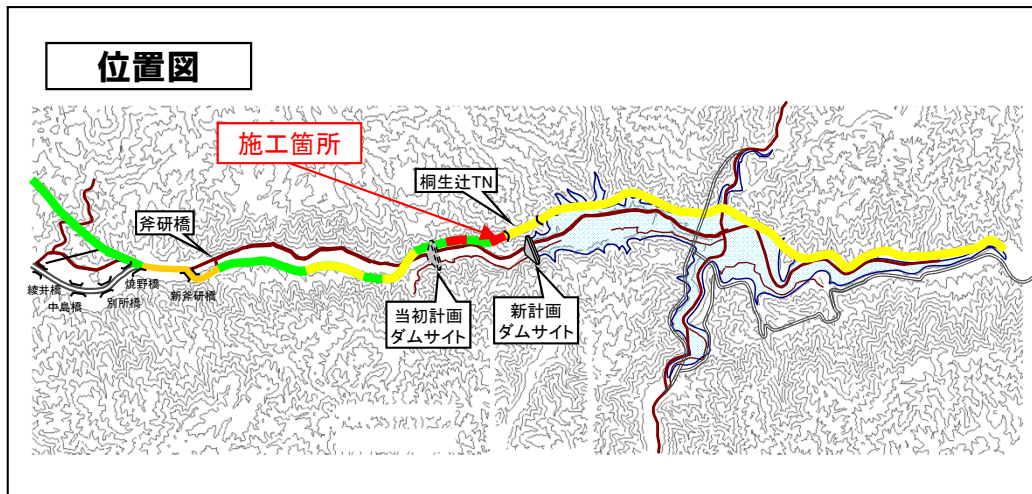

## 【工事概要】




工期 H28.7~H29.3

発注方式 一般競争入札（標準型）

## 【工事概要】

PC2径間連結コンポ橋 1橋（L=約57m）

## ②. 大津信楽線桐生地区工事用仮橋設置工事

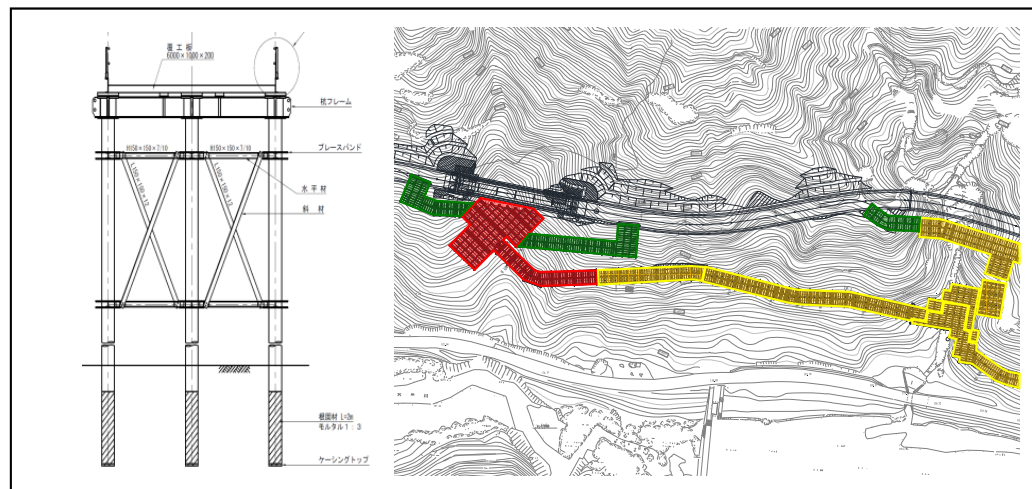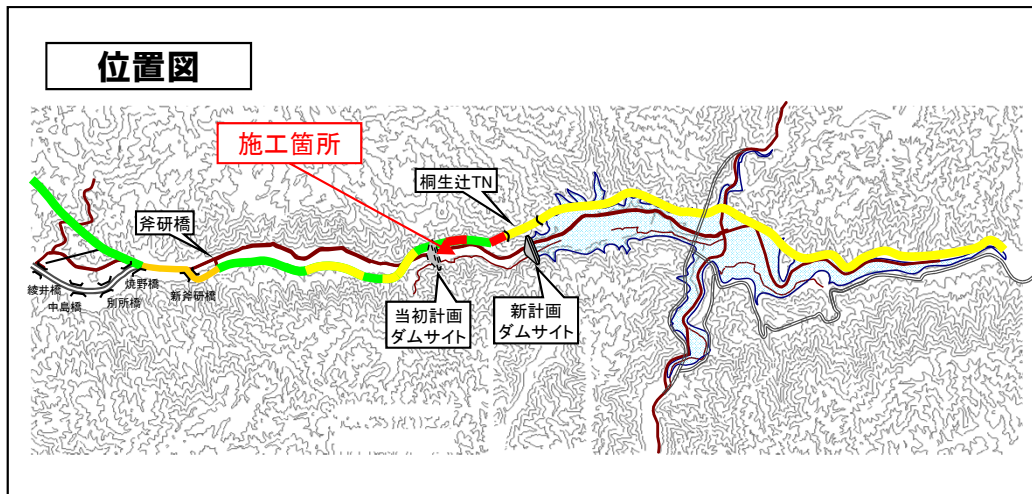

**【工事概要】**

工期 H28. 8～H29. 3

発注方式 一般競争入札（総合評価型）





**【工事概要】**

工事用仮橋 L=約60m

回転場 1箇所




# ③. 大津信楽線新6号橋下部その他工事

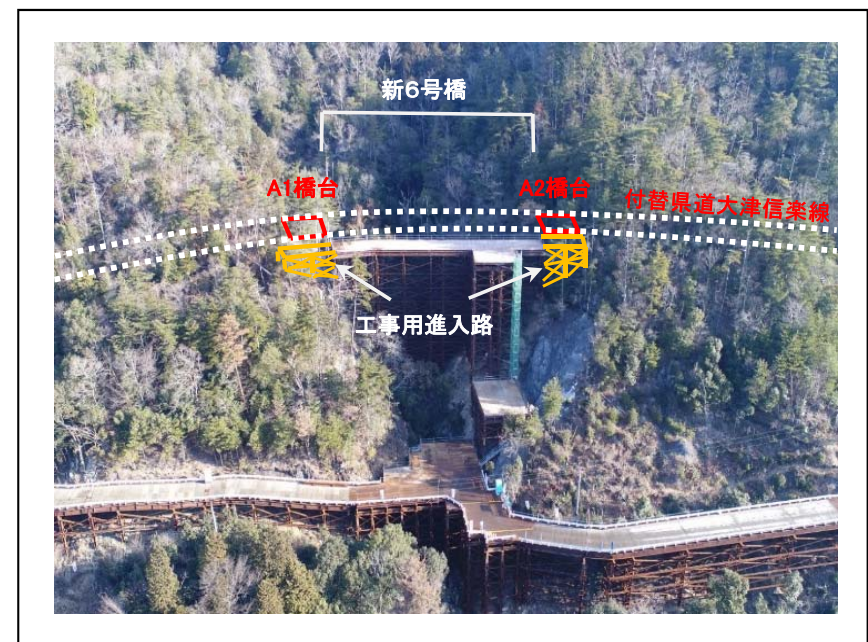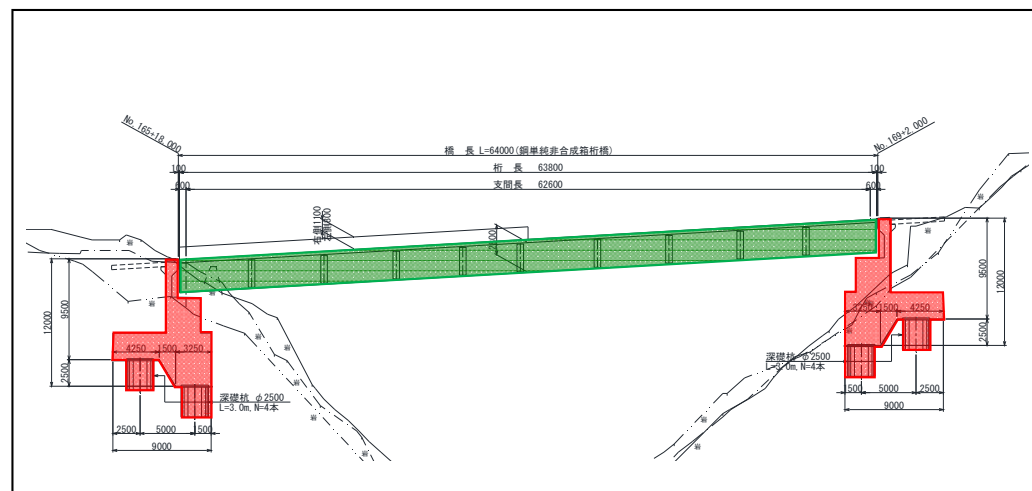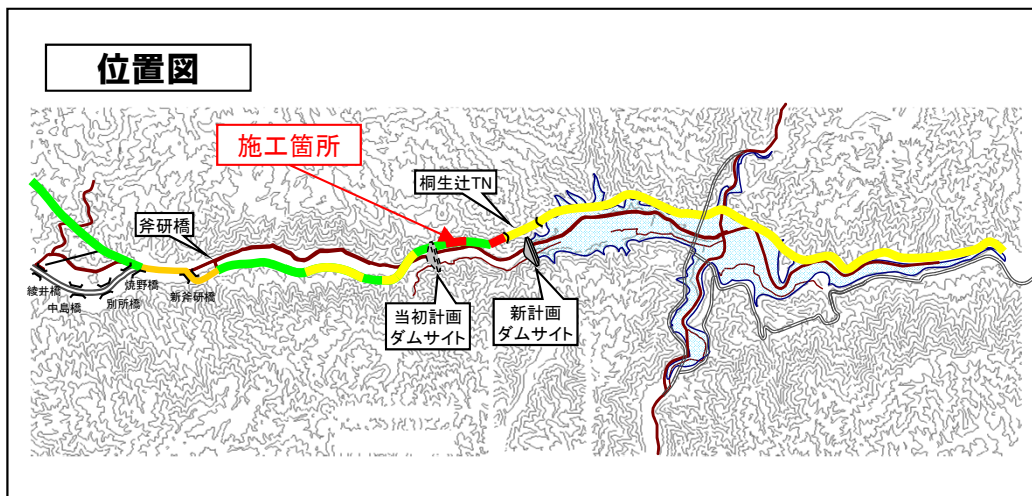

**【工事概要】**  
 工期 H29.1～H30.3  
 発注方式 一般競争入札（総合評価型）  
**【工事概要】**  
 橋台 2基  
 工事用仮栈橋 L=約50m




# 8. 平成29年度工事実施予定

## ○実施予定箇所

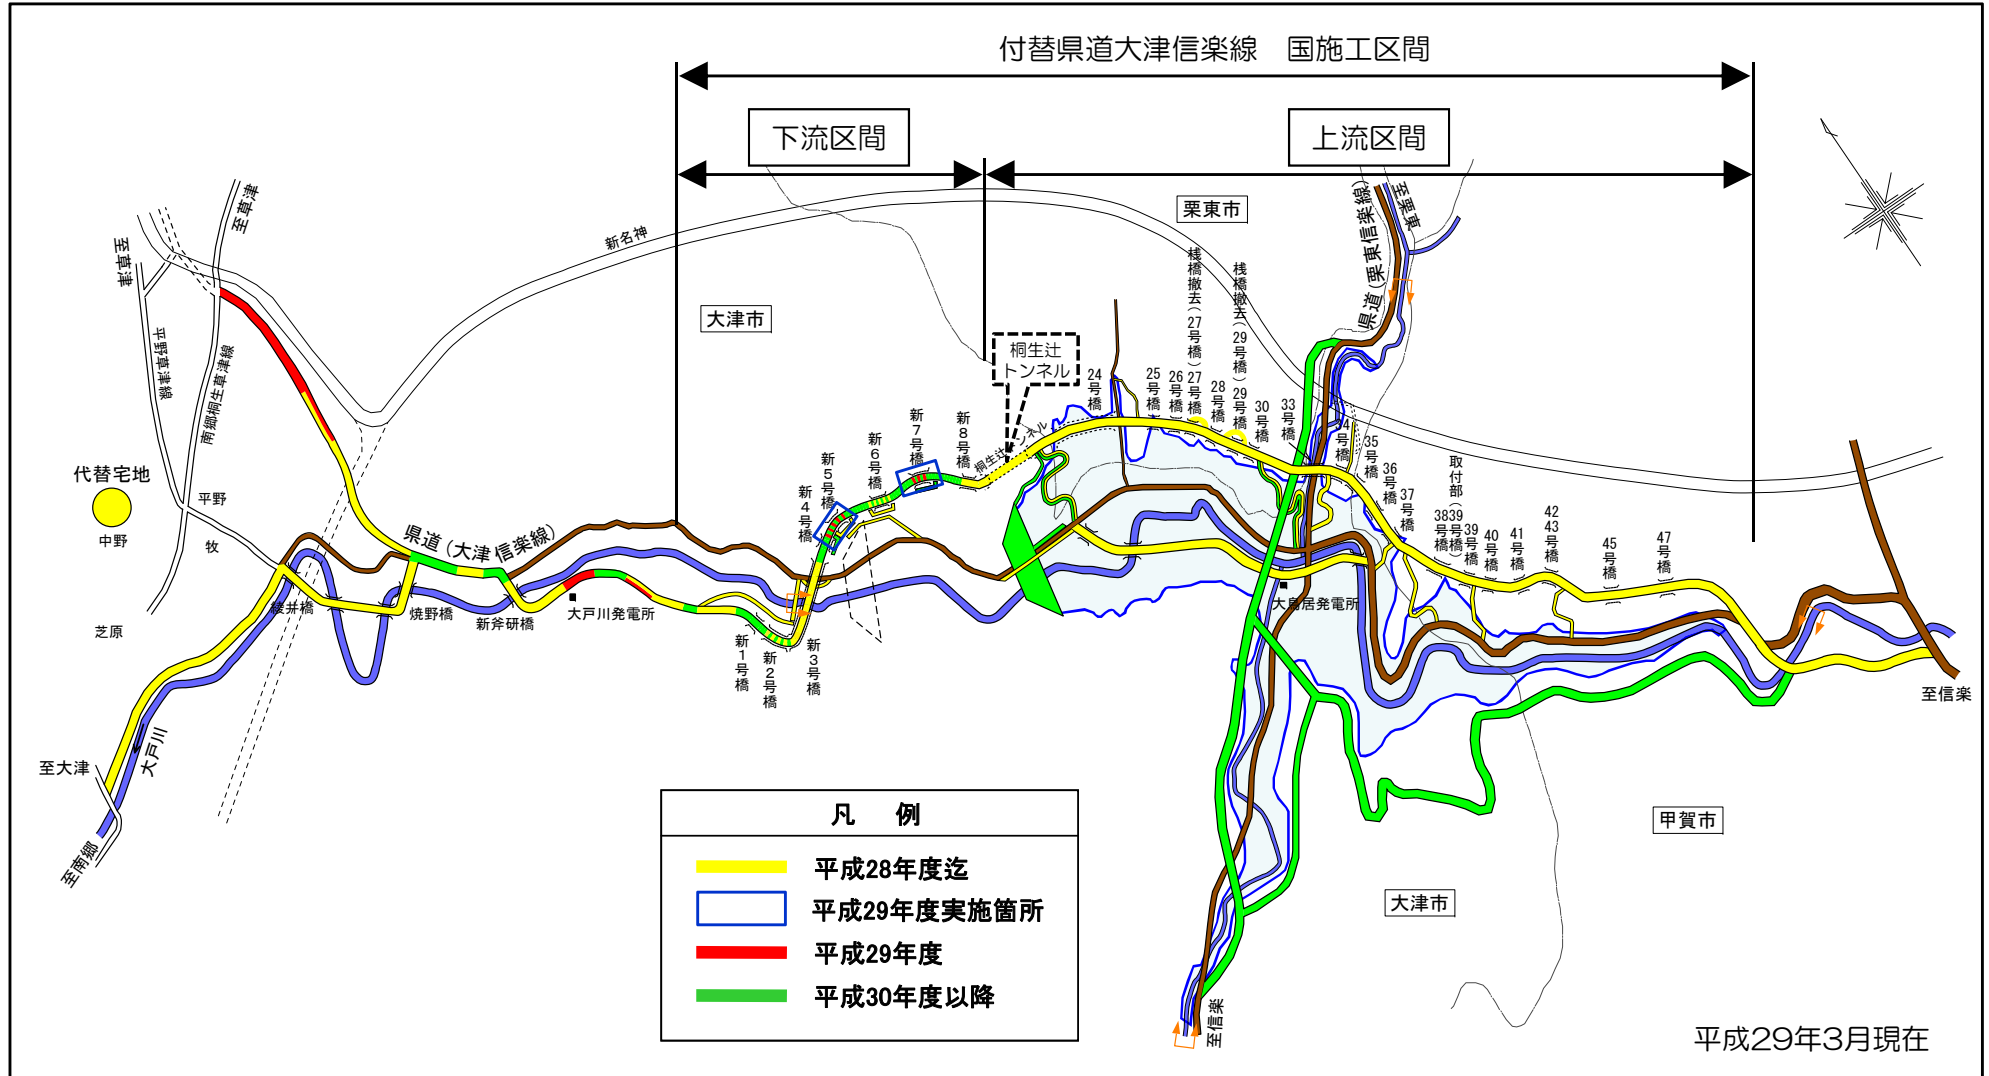



- ①. 大津信楽線新7号橋下部工工事
- ②. 大津信楽線新5号橋下部その他工事

# ①. 大津信楽線新7号橋下部工工事

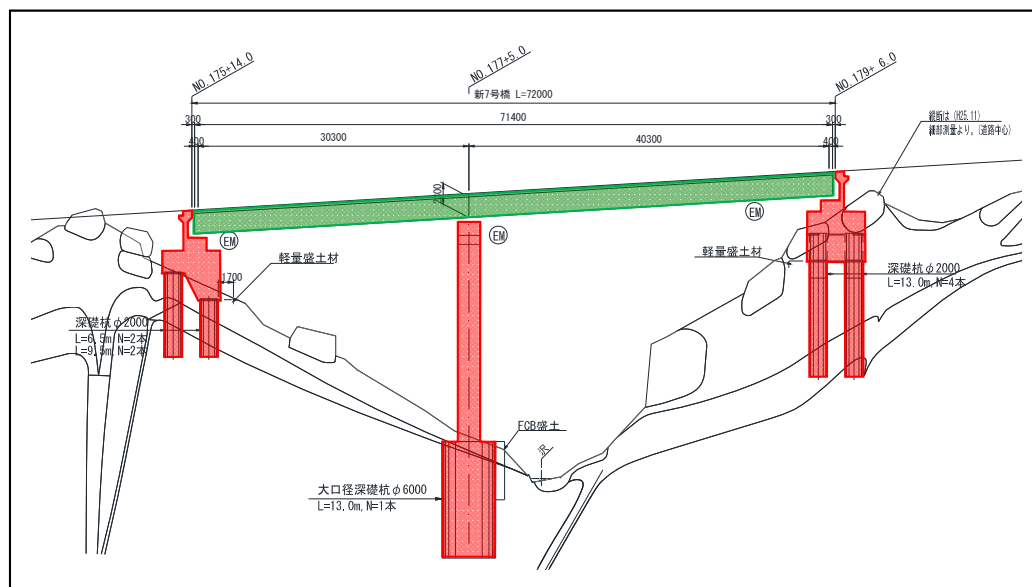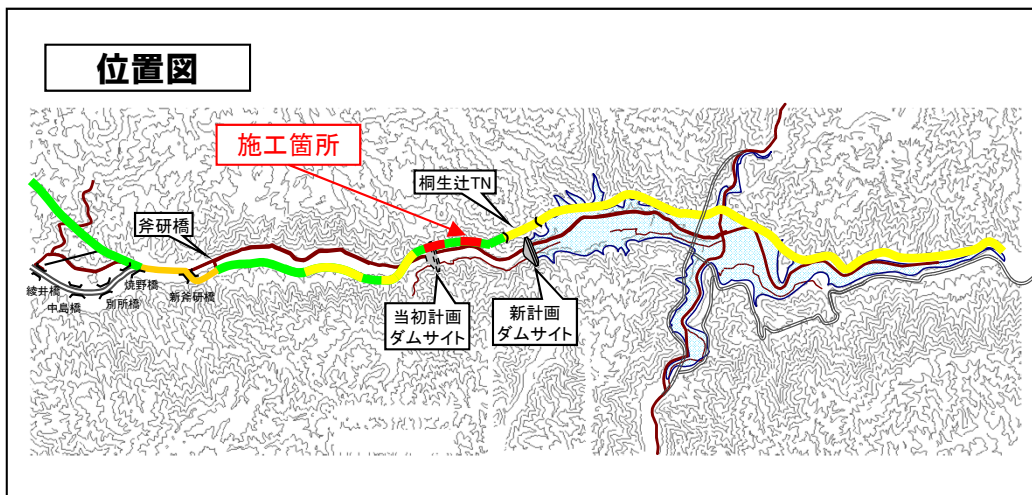

【工事概要】 (参考数量)  
 工期 H29.7~H30.3 (予定)  
 発注方式 一般競争入札 (標準型)  
 【工事概要】  
 橋台 2基  
 橋脚 1基

## ②. 大津信楽線新5号橋下部その他工事

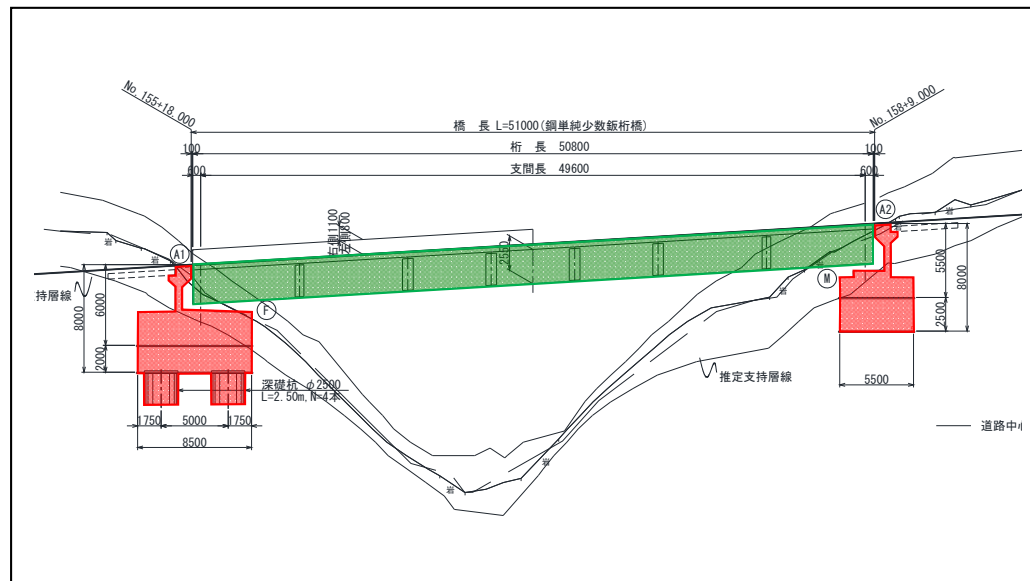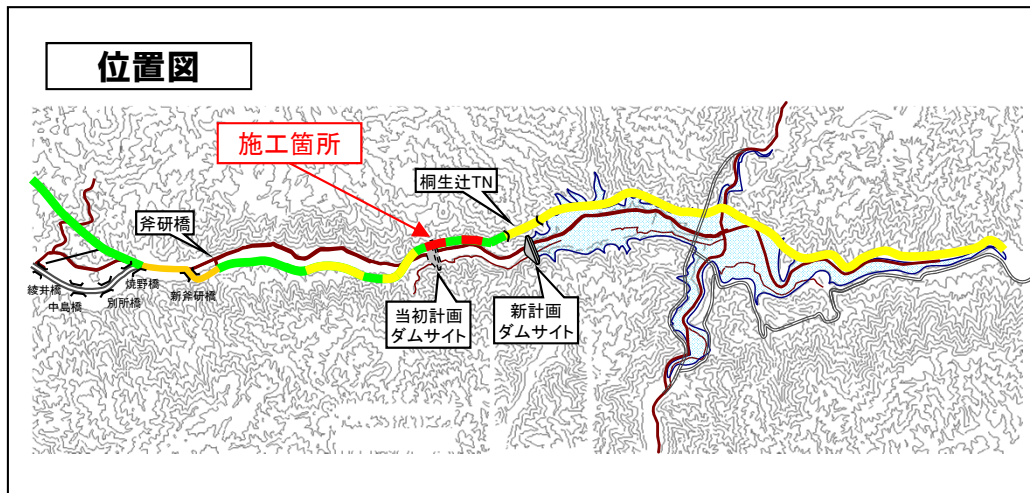

**【工事概要】 (参考数量)**  
**工期** H29.7~H30.3 (予定)  
**発注方式** 一般競争入札 (標準型)  
**【工事概要】**  
**橋台** 2基

施工済
  平成29年度施工
  平成30年度以降実施



# 9. コスト増加要素

## 1) 道路橋示方書改定(H24.3)に伴うコスト増加


橋梁詳細設計において地震による橋台前面地盤の流出や、一部の部材破壊による崩壊などの致命的な状態を回避するため、一部の部材破壊があっても応力再配分等で機能が補われる組杭深礎基礎の橋台へ変更する必要が生じコスト増加となる。

【コスト増加結果】 橋梁全体(全7橋)

	当初計画	変更計画
概算費用	約331百万円	約484百万円
コスト増加額	—	約153百万円

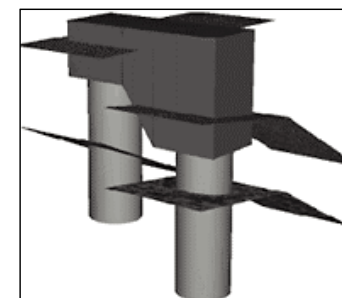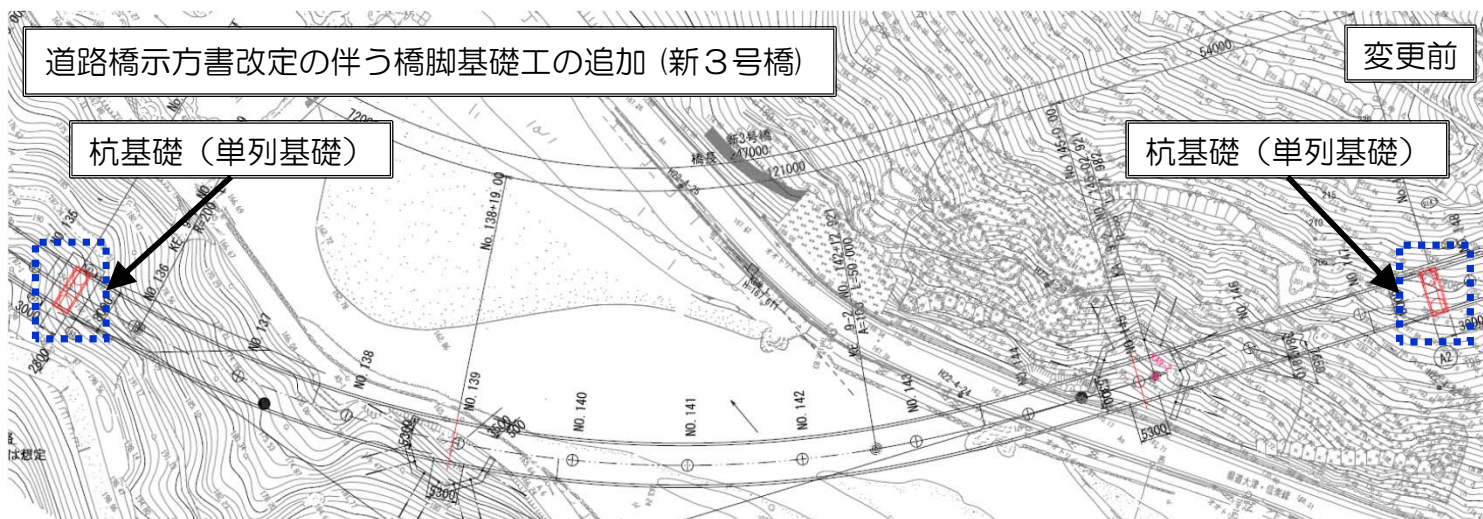


単列杭のイメージ図

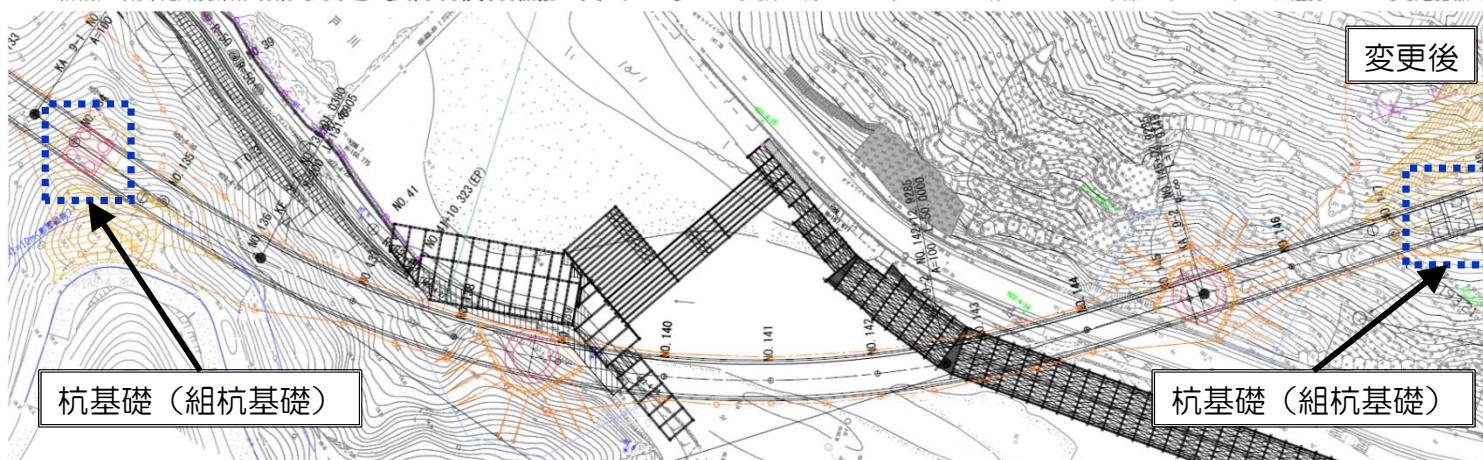

組杭のイメージ図

## 2) 落石・転石対策によるコスト増加

施工中の橋梁下部工，工事用進入路（仮栈橋）工事において、現地調査や斜面掘削時に転石が確認され、施工の障害となったため、施工方法の見直し（転石の除去等）や施工中の安全対策の必要が生じ、コスト増加となる。

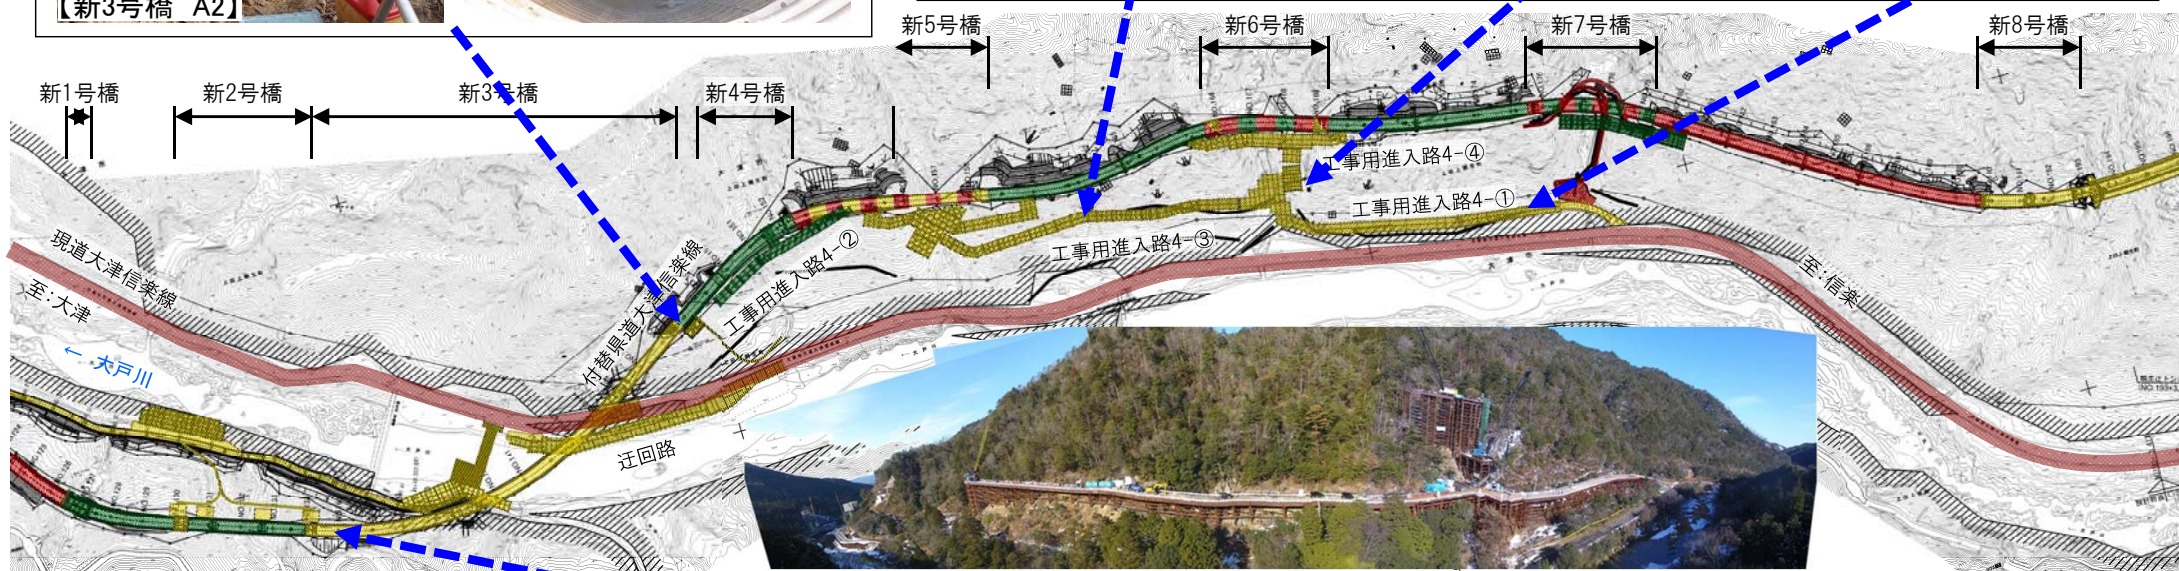

【コスト増加結果】 追加落石・転石対策

	当初計画	変更計画
概算費用	－百万円	約89百万円
コスト増加額	－	約89百万円

# 10. コスト縮減実施内容

## 1) 橋脚形状の変更、中空化に伴うコスト縮減

大津信楽線新3号橋において、橋脚形状の変更及び充実断面を中空化することにより約2,100万円のコスト縮減となる。

- ・ 橋脚形状 矩形 ⇒ 円形

深礎基礎面積が縮小されコストが縮減した。


- ・ 橋脚の中空化 充実断面 ⇒ 中空断面

コンクリート等の部材量が減少しコストが縮減した。


【コスト縮減結果】 橋梁全体

	当初計画	変更計画 (コスト縮減案)
概算費用	約1,096百万円	約1,075百万円
コスト縮減額	—	約21百万円

橋脚形状の形状を円形にすると深礎基礎工の掘削径が縮小する(鋭角部の余裕幅)ため、掘削量土留め部材が減少しコスト縮減となる。

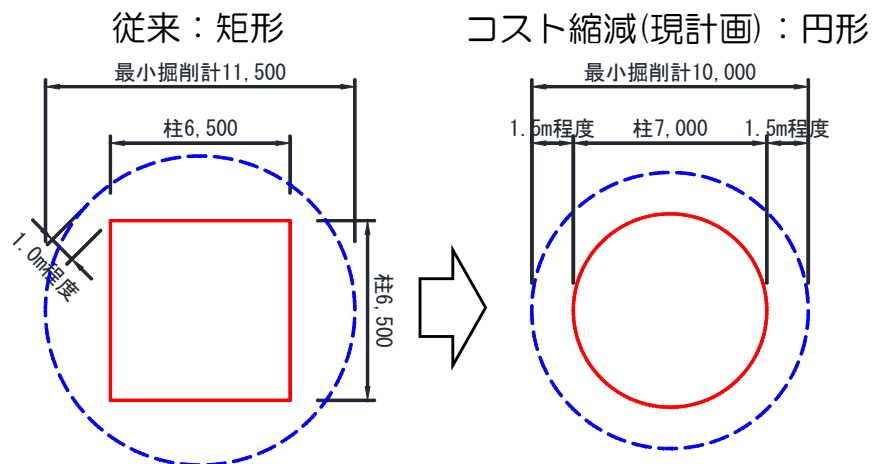

橋脚断面を中空化することにより自重が軽減する。それに伴い橋脚に働く慣性力が減少した結果、断面が縮小し部材量の減となりコスト縮減となる。

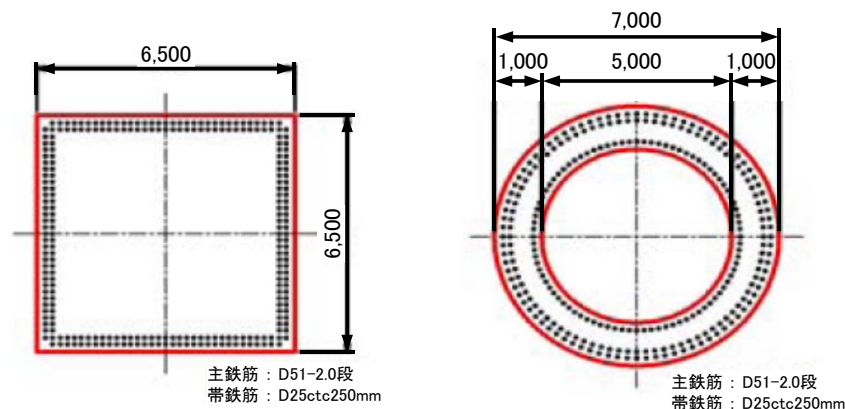

## 2) 支承型式の変更によるコスト縮減

大津信楽線新8号橋の橋台において、支承型式を見直すことにより約800万円のコスト縮減となる。

・ 支承型式 反力分散支承 ⇒ 免震支承


当初計画されている支承に比べ地震時の減衰効果が高いため、支承の移動量が少なく橋台の鉄筋量を減少する事ができコストが縮減する。

また、桁遊間を狭くできるため伸縮装置も縮減できる。


【コスト縮減結果】 下部工(基礎工含む)

	当初計画	変更計画 (コスト縮減案)
概算費用	約79百万円	約71百万円
コスト縮減額	—	約8百万円

【当初設計】 反力分散支承

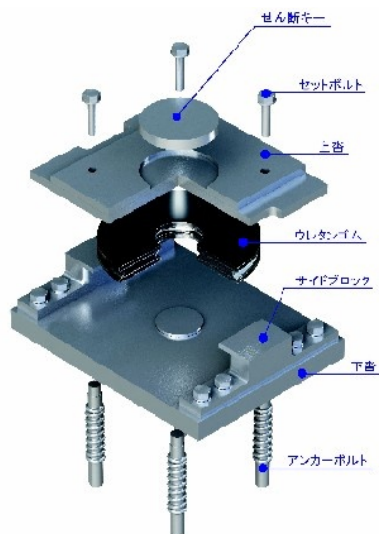

【変更設計】 免震支承

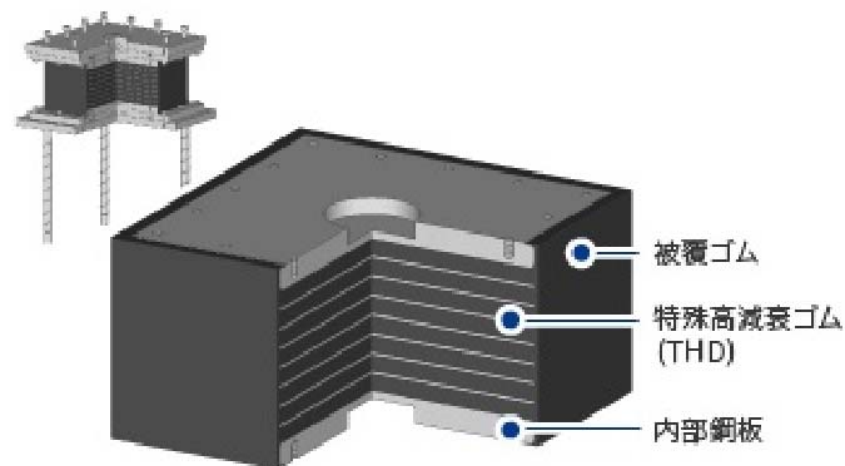




# 3) 新技術を活用したコスト縮減

大津信楽線付替工事において適用可能な新技術を活用し、コスト縮減を図る。

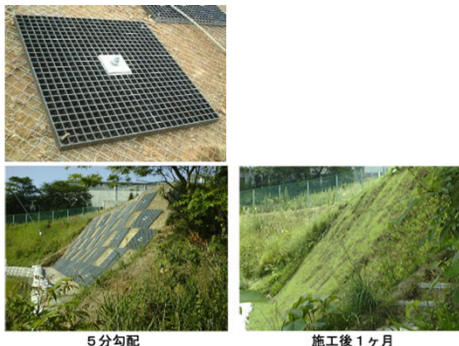


出典: NETIS

	工種 新技術名 NETIS番号	概要	施工単価		概要
			新技術	従来工法	
①	法面工 グリーンパネル工法 CG-010007-VE	 <p>鉄筋挿入工の受圧板がFRP製格子状パネルを補強材頭部で固定する。パネルの格子状のマスが客土、種子の流出を防止するため確実に緑化できる。 従来工法では出来なかった全面緑化が可能である。</p> <p>5分勾配      施工後1ヶ月</p>	概算工事費 約4,500万円  単位数量あたり 11.0千円/m <sup>2</sup>  <b>縮減額</b> 約300万円	概算工事費 約4,800万円  単位数量あたり 11.9千円/m <sup>2</sup>  従来工法 吹付法枠	・道路改良工事 【対象範囲】 下流区間道路改良全体
②	仮設工 超大型モルレル KK-100080-VR	 <p>架設に伴う大規模伐採、地形改変、コンクリ基礎が不要で施工性、作業効率の向上が期待できる。</p>	概算工事費 約118,000万円  単位数量あたり 178.4千円/m  <b>縮減額</b> 約2,800万円	概算工事費 約146,000万円  単位数量あたり 220.2千円/m  従来工法 ケーブルクレーン	・新2号橋下部工事 ・新3号橋橋台設置工事 ・新8号橋他工事 【対象範囲】 新2号橋下部工, 新3号橋下部工, 新7号橋下部工
③	仮設工 YTロック工法 KK-080017-V	 <p>単管足場の連結部をユニット化することで、より強固に固定が可能とし、従来、建設機械の足場として仮設構台を設置して箇所について代替が可能。設置・撤去に関する省力化、設置用クレーン等が不要なためコスト縮減となる。</p>	概算工事費 約1,600万円  単位数量あたり 6.3千円/m <sup>2</sup>  <b>縮減額</b> 約300万円	概算工事費 約1,900万円  単位数量あたり 7.6千円/m <sup>2</sup>  従来工法 仮橋・仮栈橋工	・新2号橋下部工事 ・新3号橋橋台設置工事 ・新8号橋他工事 【対象範囲】 新2号橋下部工, 新3号橋下部工, 新7号橋下部工

### 3) 新技術を活用したコスト縮減

大津信楽線付替工事において適用可能な新技術を活用し、コスト縮減を図る。

出典: NETIS

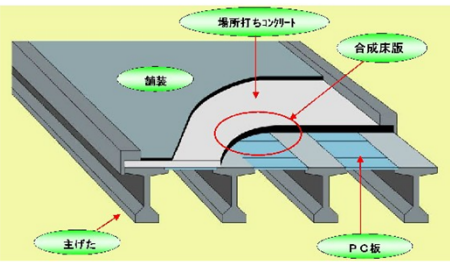	工種 新技術名 NETIS番号	概要	施工単価		摘要
			新技術	従来工法	
④	防護柵工 パイルロックフェンス工法 CB-100011-VE	 <p>落石防護柵の支柱を三重鋼管合成杭構造にすることにより直接地盤へに根入れさせることが可能となり、従来工法で必要としていたコンクリート基礎が不要となり施工性の向上、軽量化が可能となった。</p>	概算工事費 約500万円  単位数量あたり 149.0千円/m  <b>縮減額</b> 約200万円	概算工事費 約700万円  単位数量あたり 205.2千円/m  従来工法 引張型・圧縮型各種 アンカー工法	・落石対策工事
⑤	落石防護柵工 イーゼーネット工法 HR-050024-VE	 <p>支柱設置のため、アンカーを削孔する。基礎を不要とするため、掘削は発生しない。また軽量のポリエチレン製ネットを用いるため、施工が容易である。</p>	概算工事費 約6,700万円  単位数量あたり 97.6千円/m  <b>縮減額</b> 約9,700万円	概算工事費 約164,000万円  単位数量あたり 239.1千円/m  従来工法 落石防護壁	・落石対策工事
⑥	橋梁上部工 PCコンボ橋 SK-980027-V	 <p>主げたをプレキャストセグメント工法で製作し、床版はプレキャストPC板と場所打ち床版のPC合成床版とした合げた橋で、従来は、ポストテンション方式単純Tげた橋で対応していた。本技術の活用により、現場作業の省力化、主げたの少数化が期待できる。</p>	概算工事費 約2,000万円  単位数量あたり 129.7千円/m <sup>2</sup>  <b>縮減額</b> 約100万円	概算工事費 約2,100万円  単位数量あたり 137.1千円/m <sup>2</sup>  従来工法 ポストテンション方式 単純Tげた橋	・新8号橋上部工工事 【対象範囲】 新8号橋上部工

# 11. 落石・転石による工程への影響概要

付替県道大津信楽線の工事用進入路(仮栈橋)工事の当初調査では危険度が低く対策不要としていた箇所において、樹木伐採や表土除去を行った結果、現道へ影響を及ぼす危険度の高い落石・転石の存在が確認された。落石・転石対策工事の追加が必要となったため、付替県道大津信楽線については滋賀県施工区間(平成30年度)に間に合わない見込み。安全管理を最優先としつつ、施工方法等について引き続き検討し工期短縮に努める。

