水がささえる豊かな社会　独立行政法人 水資源機構

平成２６年　７月１４日
独立行政法人水資源機構
長良川河口堰管理所

お　知　ら　せ

長良川河口堰でゲート全開操作を終了しました

１．**概要**　長良川河口堰では、洪水を安全に流下させるためゲートを全開にしていましたが、長良川の堰地点の流量が全開操作実施の基準流量毎秒８００立方メートルを下回ったことから、塩水遡上を防止するため１１日１８時２２分に全開操作を終了し、アンダーフロー操作に切り換えました。

２．**状況**　流域平均累計雨量　：１２２mm（７月９日１４時から１１日３時まで）
堰最大流入量　：毎秒約２，１００立方メートル（７月１１日３時）
全開操作開始時刻　：１０日１６時４９分
全開操作終了時刻　：１１日１８時２２分
全開操作継続時間　：２５時間３３分

なお、今回の全開操作は、平成７年７月の河口堰運用開始以降１２５回目（今年度１回目）となります。また、運用開始以降最大の出水は、平成１６年１０月台風２３号による洪水であり忠節地点毎秒７,６６７立方メートルの流量を観測しています(国土交通省水文水質データベースより)。

３．**配布先**　中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ、三重県第二県政記者クラブ、桑名記者クラブに同時配布します。

４．**問合せ先**　独立行政法人水資源機構　長良川河口堰管理所
管理課長　花田（はなだ）　電話０５９４－４２－５０１２（代）

長良川河口堰のホームページで、ゲート操作等管理状況がご覧になれます。

http://www.water.go.jp/chubu/nagara/index.html

（参考資料）

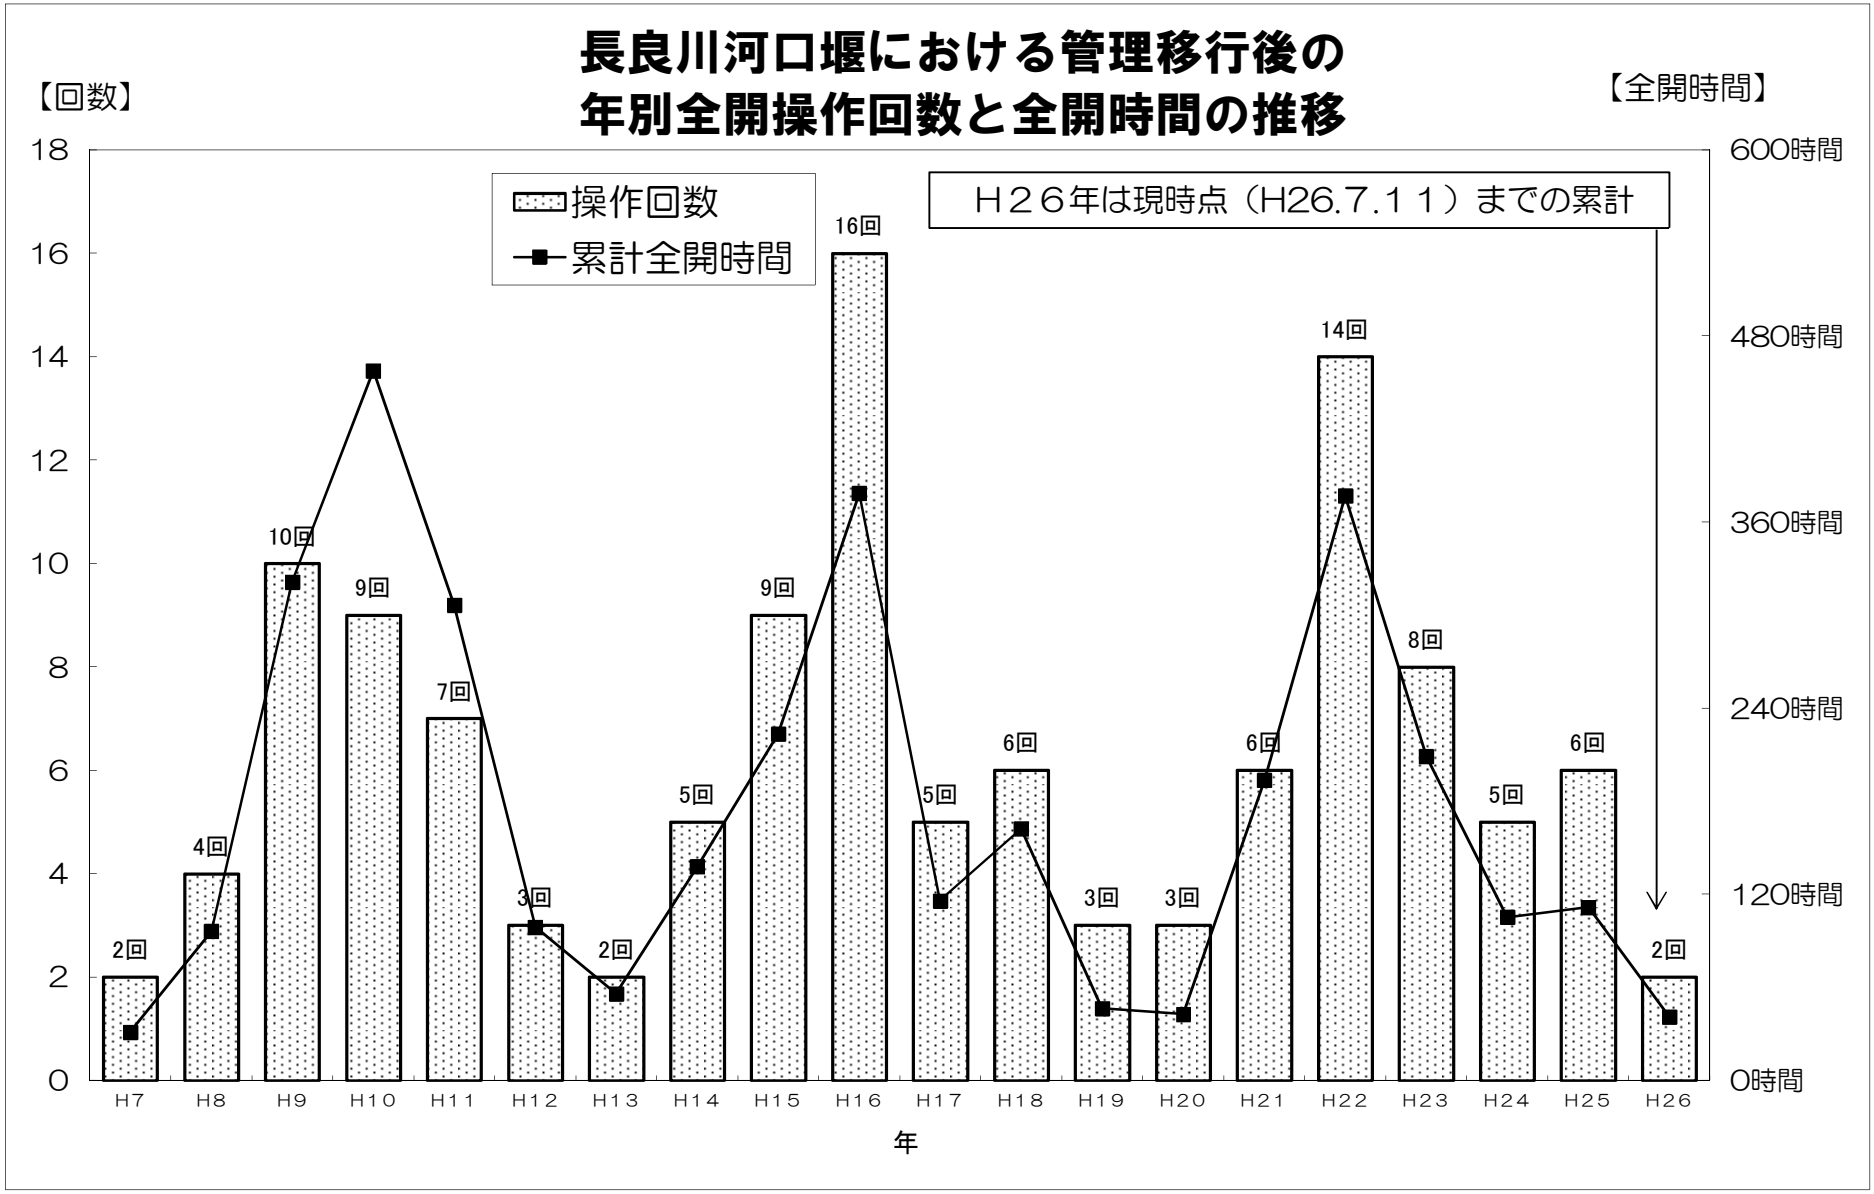

※現時点（H26.7.11）までの操作回数：125回

※累計全開時間：3510時間 28分

ゲート全開操作の長良川河口堰（堰上流側）

7月10日17時撮影

ゲート全開操作の長良川河口堰（堰下流側）

7月10日17時撮影

ゲート全開操作の長良川河口堰（堤防より高い位置にゲートを引き上げ）

7月10日17時撮影

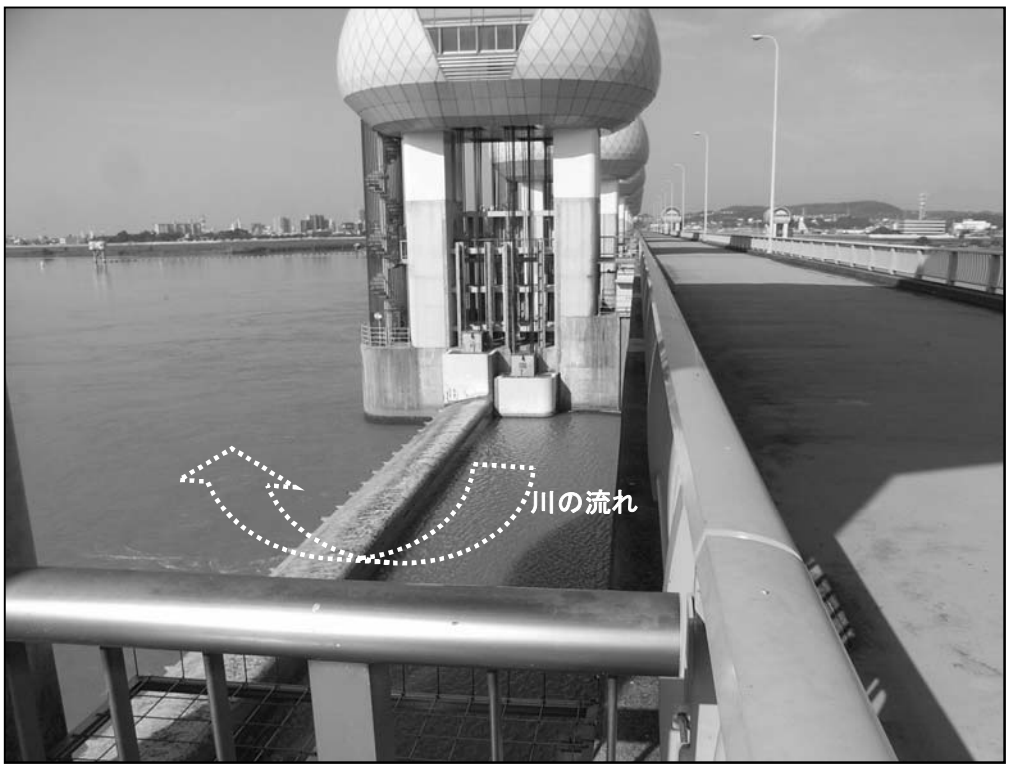

ゲート全開操作終了後の長良川河口堰
（アンダーフロー操作に切り換え：ゲートの下を水が流れています）

7月12日8時撮影
