記者発表資料

水資源機構

令和８年７月３日
独立行政法人水資源機構
筑後川下流総合管理所

筑後大堰（ちくごおおぜき）では洪水時の操作（ゲート全開）を実施しました

筑後大堰では、前線に伴う降雨の影響により、堰地点の河川流量が増加したことから、洪水を安全に流下させるため、令和８年７月２日（木）１時５０分よりゲート全開操作を実施しました。

その後、堰地点の河川流量が減少したことから、堰上流水位を一定に保ちつつ塩水遡上を防止し、水道用水等の安定取水を確保するため、７月２日（木）１９時５０分にゲート全開操作を終了しました。

なお、今回のゲート全開操作は昭和６０年４月の運用開始より、１５１回目（今年度は２回目）となります。

【雨量状況】※速報値
堰地点累計雨量：１４３㎜
（６月３０日（火）２３時～７月２日（木）３時までの累計）

【河川水位状況】※速報値
ゲート全開操作実施中における堰地点での最高水位
Ｔ．Ｐ．＋４．６２ｍ（７月２日（木）１１時００分）

【操作状況】
全開操作開始：７月２日（木）　１時５０分
全開操作終了：７月２日（木）１９時５０分

※速報値については、今後変更となる場合があります。
※Ｔ．Ｐ．とは全国の標高の基準となる海水面の高さである東京湾平均海面（Tokyo Peil）を表します。

発表記者クラブ：久留米市政記者クラブ、佐賀県政記者クラブ

お問合わせ先：筑後川下流総合管理所 総務課長　梅田（うめだ）
電 話：０９４２（２６）４５５１（代表）
E-mail：jwa_chikugo_karyu@water.go.jp

［参考］ゲート全開操作中と終了後の筑後大堰

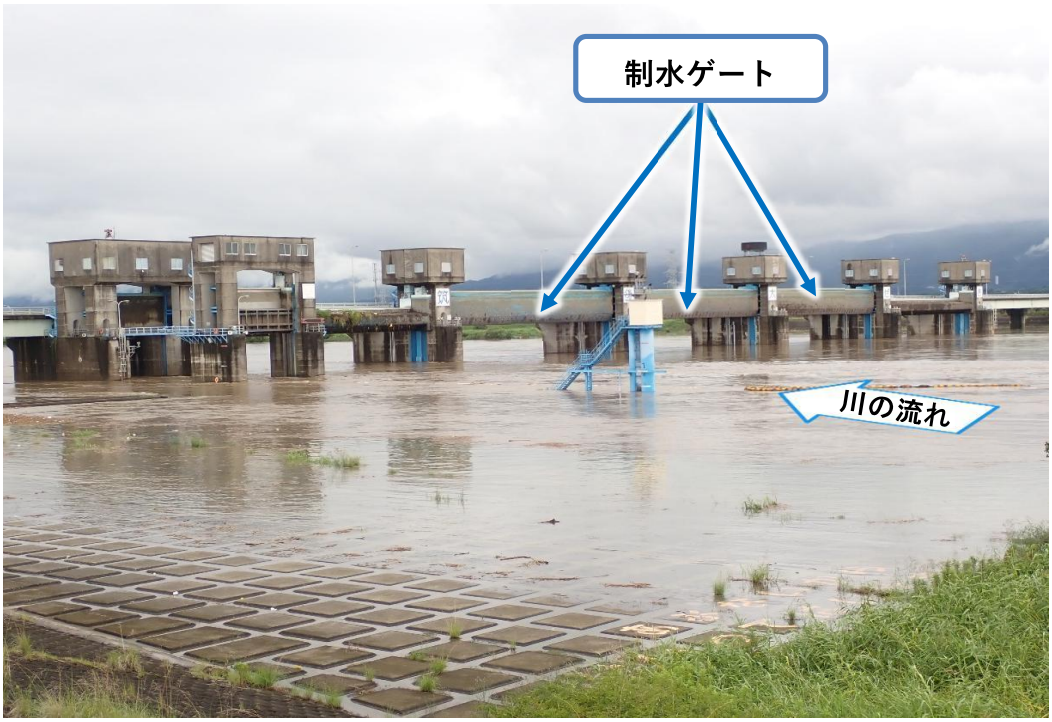

ゲート全開操作開始後の筑後大堰
（左岸上流側から筑後大堰を望む）

7月2日9時撮影

ゲート全開操作終了後の筑後大堰
（左岸上流側から筑後大堰を望む）

7月3日9時撮影

ゲート全開操作開始後の筑後大堰　　7月2日9時撮影
（１号制水ゲートを左岸から右岸方向に望む）

ゲート全開操作終了後の筑後大堰　　7月3日9時撮影
（１号制水ゲートを左岸から右岸方向に望む）

※ゲートを着水させ、ゲートの下から放流(アンダーフロー)しています。

参考資料

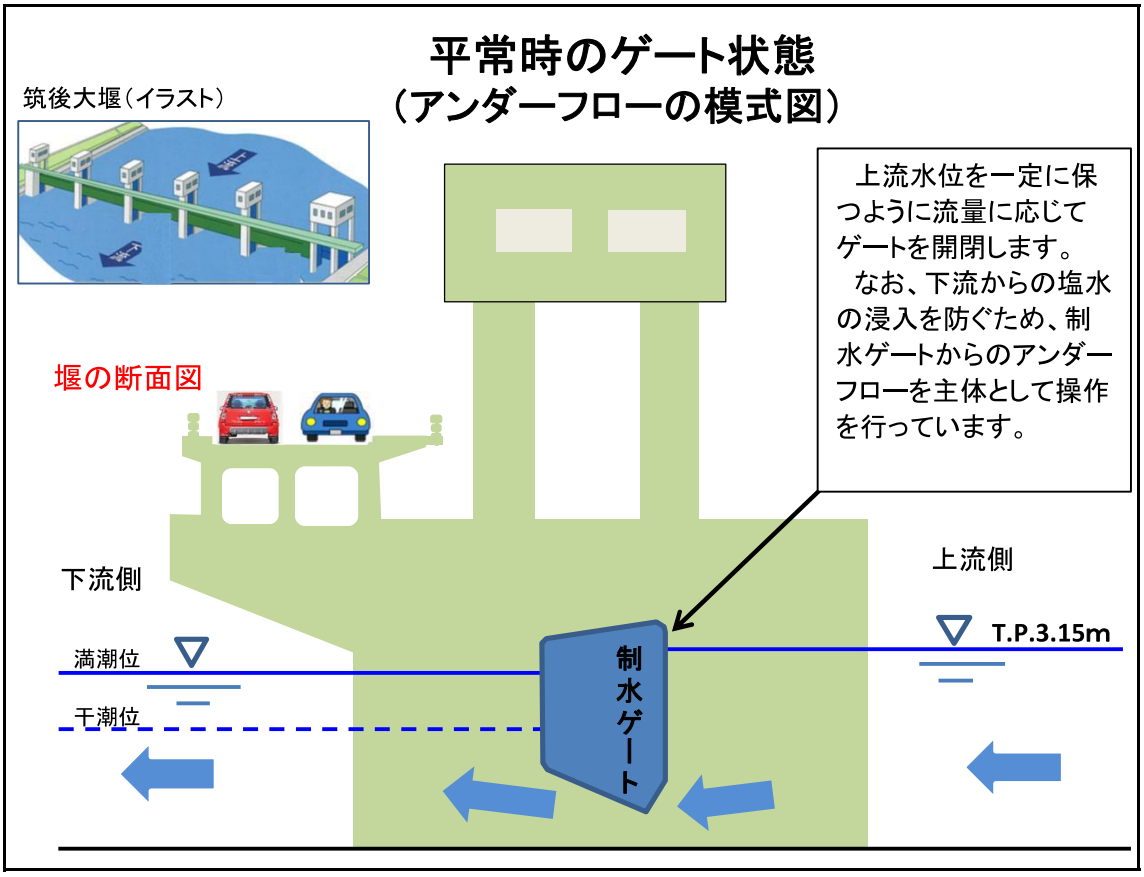

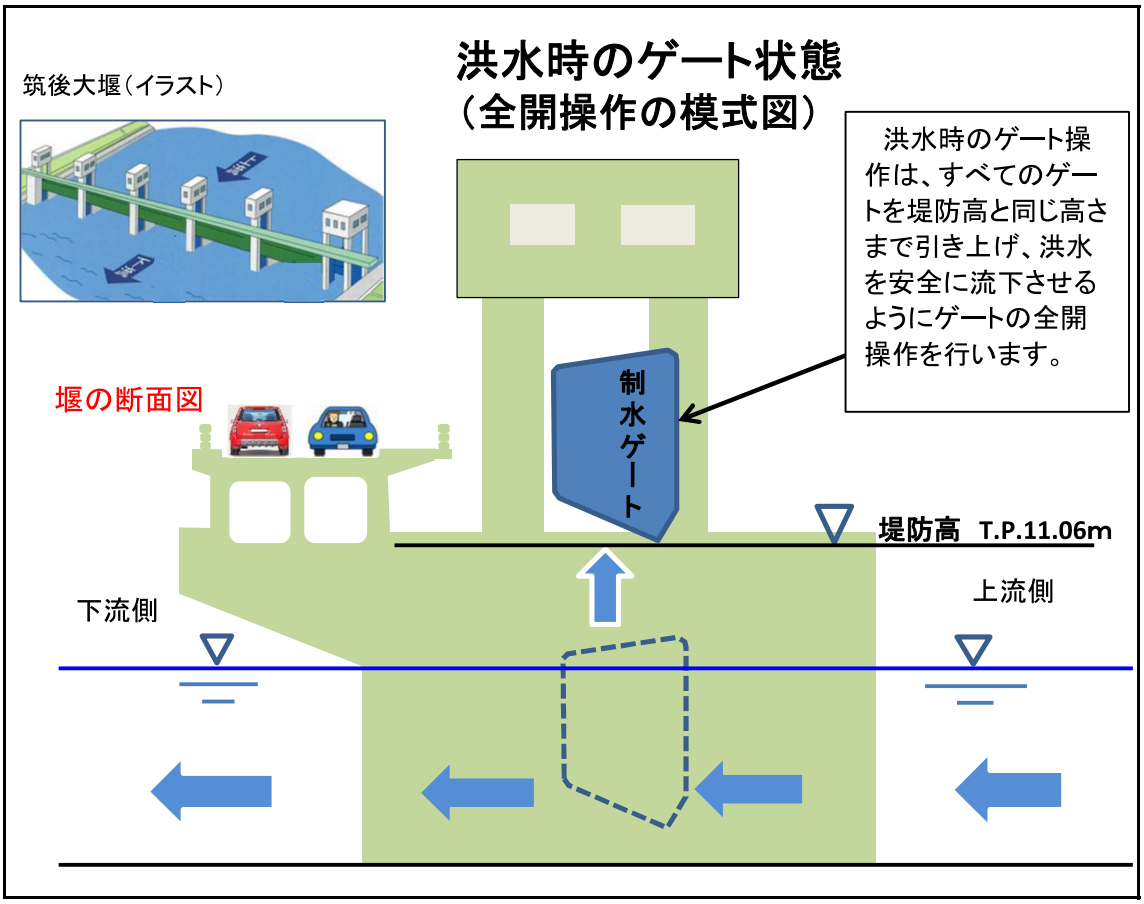

※ 堰の断面図は筑後大堰管理所側（左岸側）より見たものです。
