令和4年8月17日
独立行政法人水資源機構
沼 田 総 合 管 理 所

令和４年７月２７日前線に伴う降雨の影響により奈良俣(ならまた)ダムは、防災操作(ぼうさいそうさ)を行いました。

防災操作により奈良俣ダムに貯留量（約５万m^3）

奈良俣ダム流域では、７月２７日１２時頃から２７日２０時までに累計で、４０．０mmの降雨量を観測しました。

この降雨によりダムへの流入量が増加し、２７日１９時５０分に洪水量（毎秒８０m^3）に達したため、防災操作を実施しダムに約５万m^3を貯留しました。

今後も、奈良俣ダムでは適切に防災操作（洪水調節）を実施し、下流地域の洪水被害の防止・軽減に努めてまいります。

※防災操作（洪水調節）とは、降雨等によりダムに流れ込む水の一部を一時的に貯め込んで、ダムから下流に流れ出す量を減らし、下流の川の水位を低減させることです。

注）数値は速報値です。

参考資料1

■位置図

大水上山
下津川岳
平ガ岳
みなかみ町
利根川
牛ヶ岳
矢木沢ダム流域
やぎさわ
奈良沢
奥利根湖
新　潟　県
楢俣川
尾瀬ヶ原
矢木沢ダム
奈良俣ダム流域
直接流域
至仏山
洞元湖
ならまた湖
朝日岳
奈良俣ダム
須田貝ダム
笠ヶ岳
湯ノ小屋沢
湯ノ小屋
取水堰
間接流域
谷川岳
どあい
万太郎山
藤原ダム
藤原湖
武尊山
ならまた
奈良俣ダム
ゆびそ
みなかみ町
玉原ダム
迦葉山
吾妻耶山
水上IC
かみもく
赤谷湖
奥利根流域
三峰山
相俣ダム
上毛高原
発知川
川場村
田代山
平川
栗原川
月夜野IC
沼田市
赤谷川
沼田IC
推坂峠
沼田総合
管理所
片品川
薗原ダム
ならまた湖

参考資料2
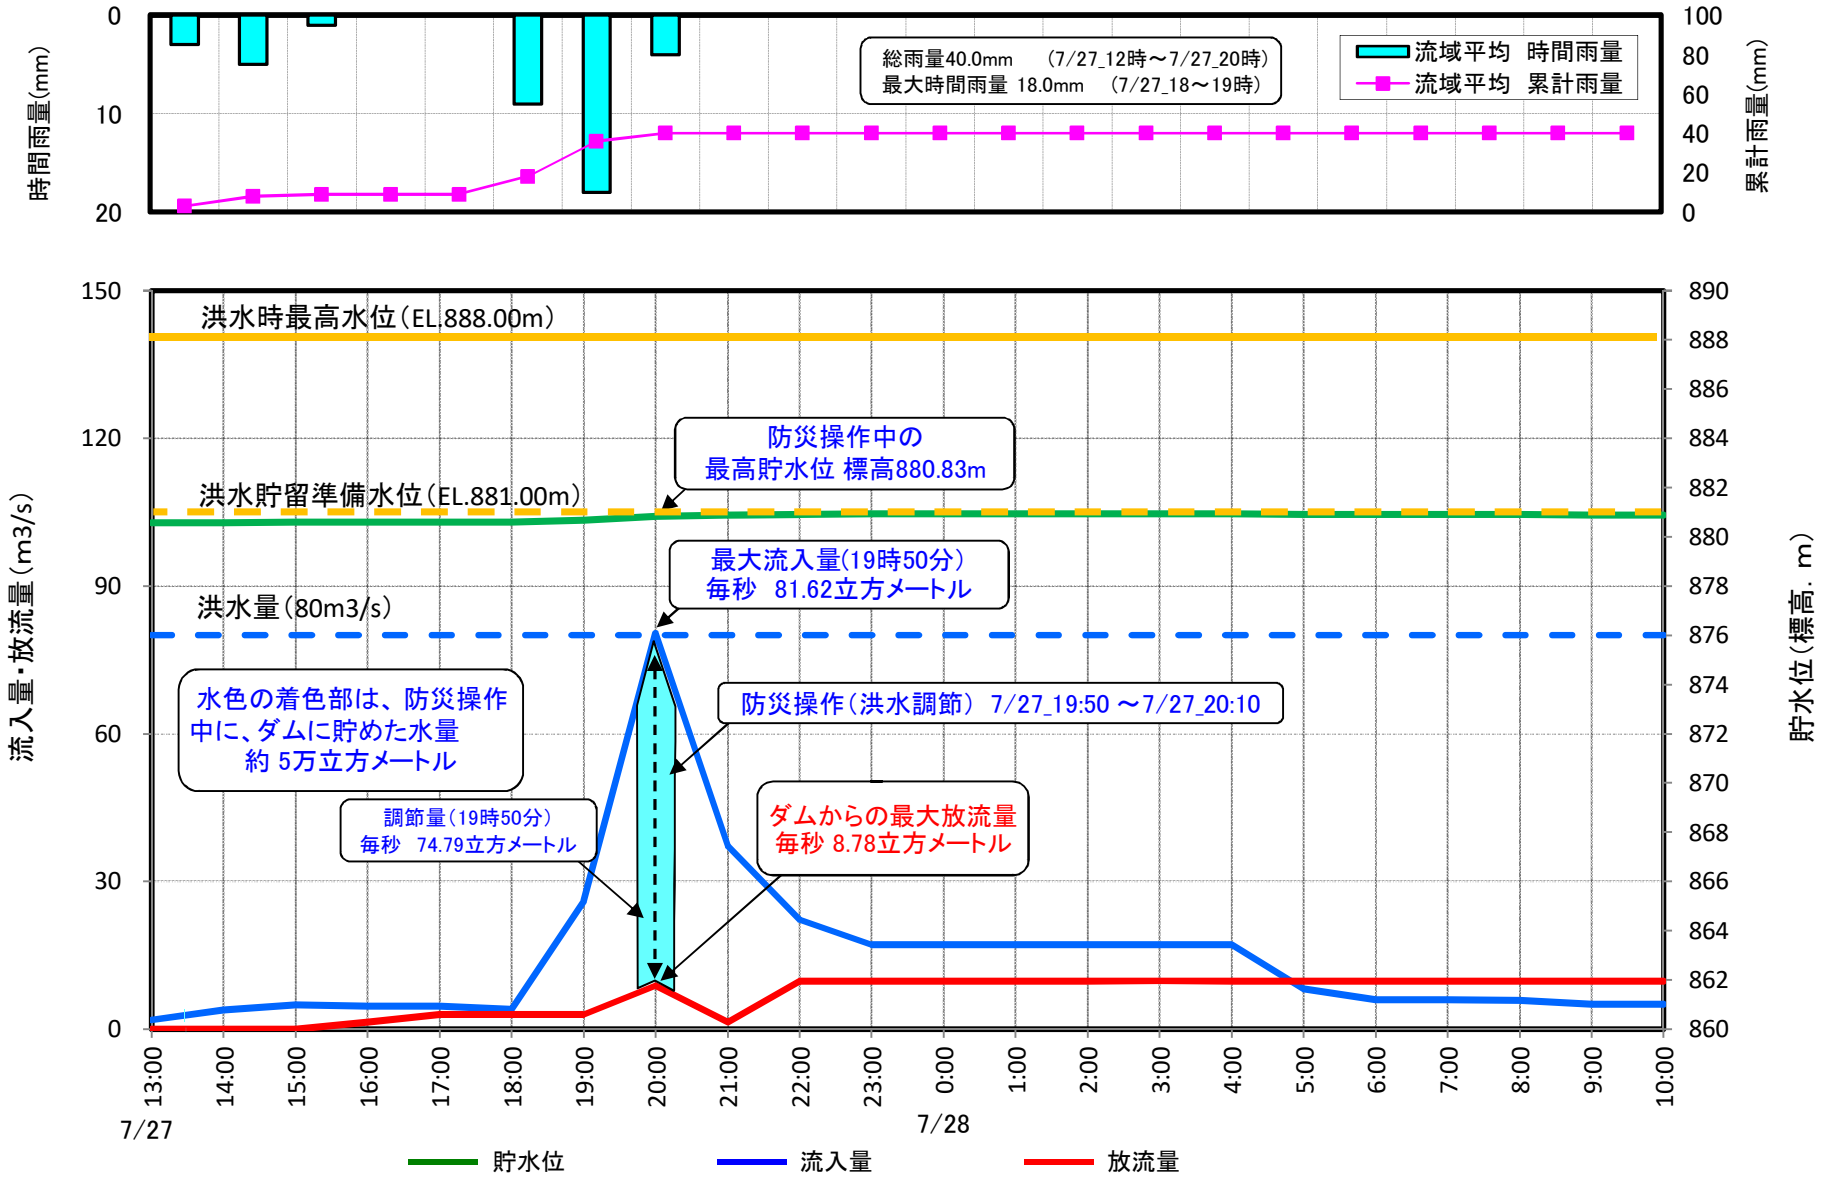
■奈良俣ダム防災操作（洪水調節）状況図
